

FASE 1

- FASE 1**
- a) Cantiere centrale
 - realizzazione sede nuova viabilità di cantiere.
 - esecuzione taglio vegetazione costituita da piovpi, lecci, canne e robinia
 - realizzazione recinzione cantiere e allestimento area con posa baraccamenti.
 - b) Cantiere cabina
 - taglio vegetazione per lo più arbustiva
 - realizzazione della sola recinzione di cantiere.




FASE:

- a) Cantiere centrale
 - esecuzione scavi con recupero materiale e formazione della tura di protezione lat. fiume Elsa per lavoro in asciutto.
- b) Cantiere cabina
 - lavori inerenti la costruzione della nuova cabina ENEL
 - realizzazione cavidotto per posa cavo di connessione ENEL in MT.



FASE:

- Fase 3**
- a) Cantiere centrale
 - realizzazione opere strutturali in cemento armato
 - montaggio carpenterie
 - realizzazione passaggio artificiale per pesci

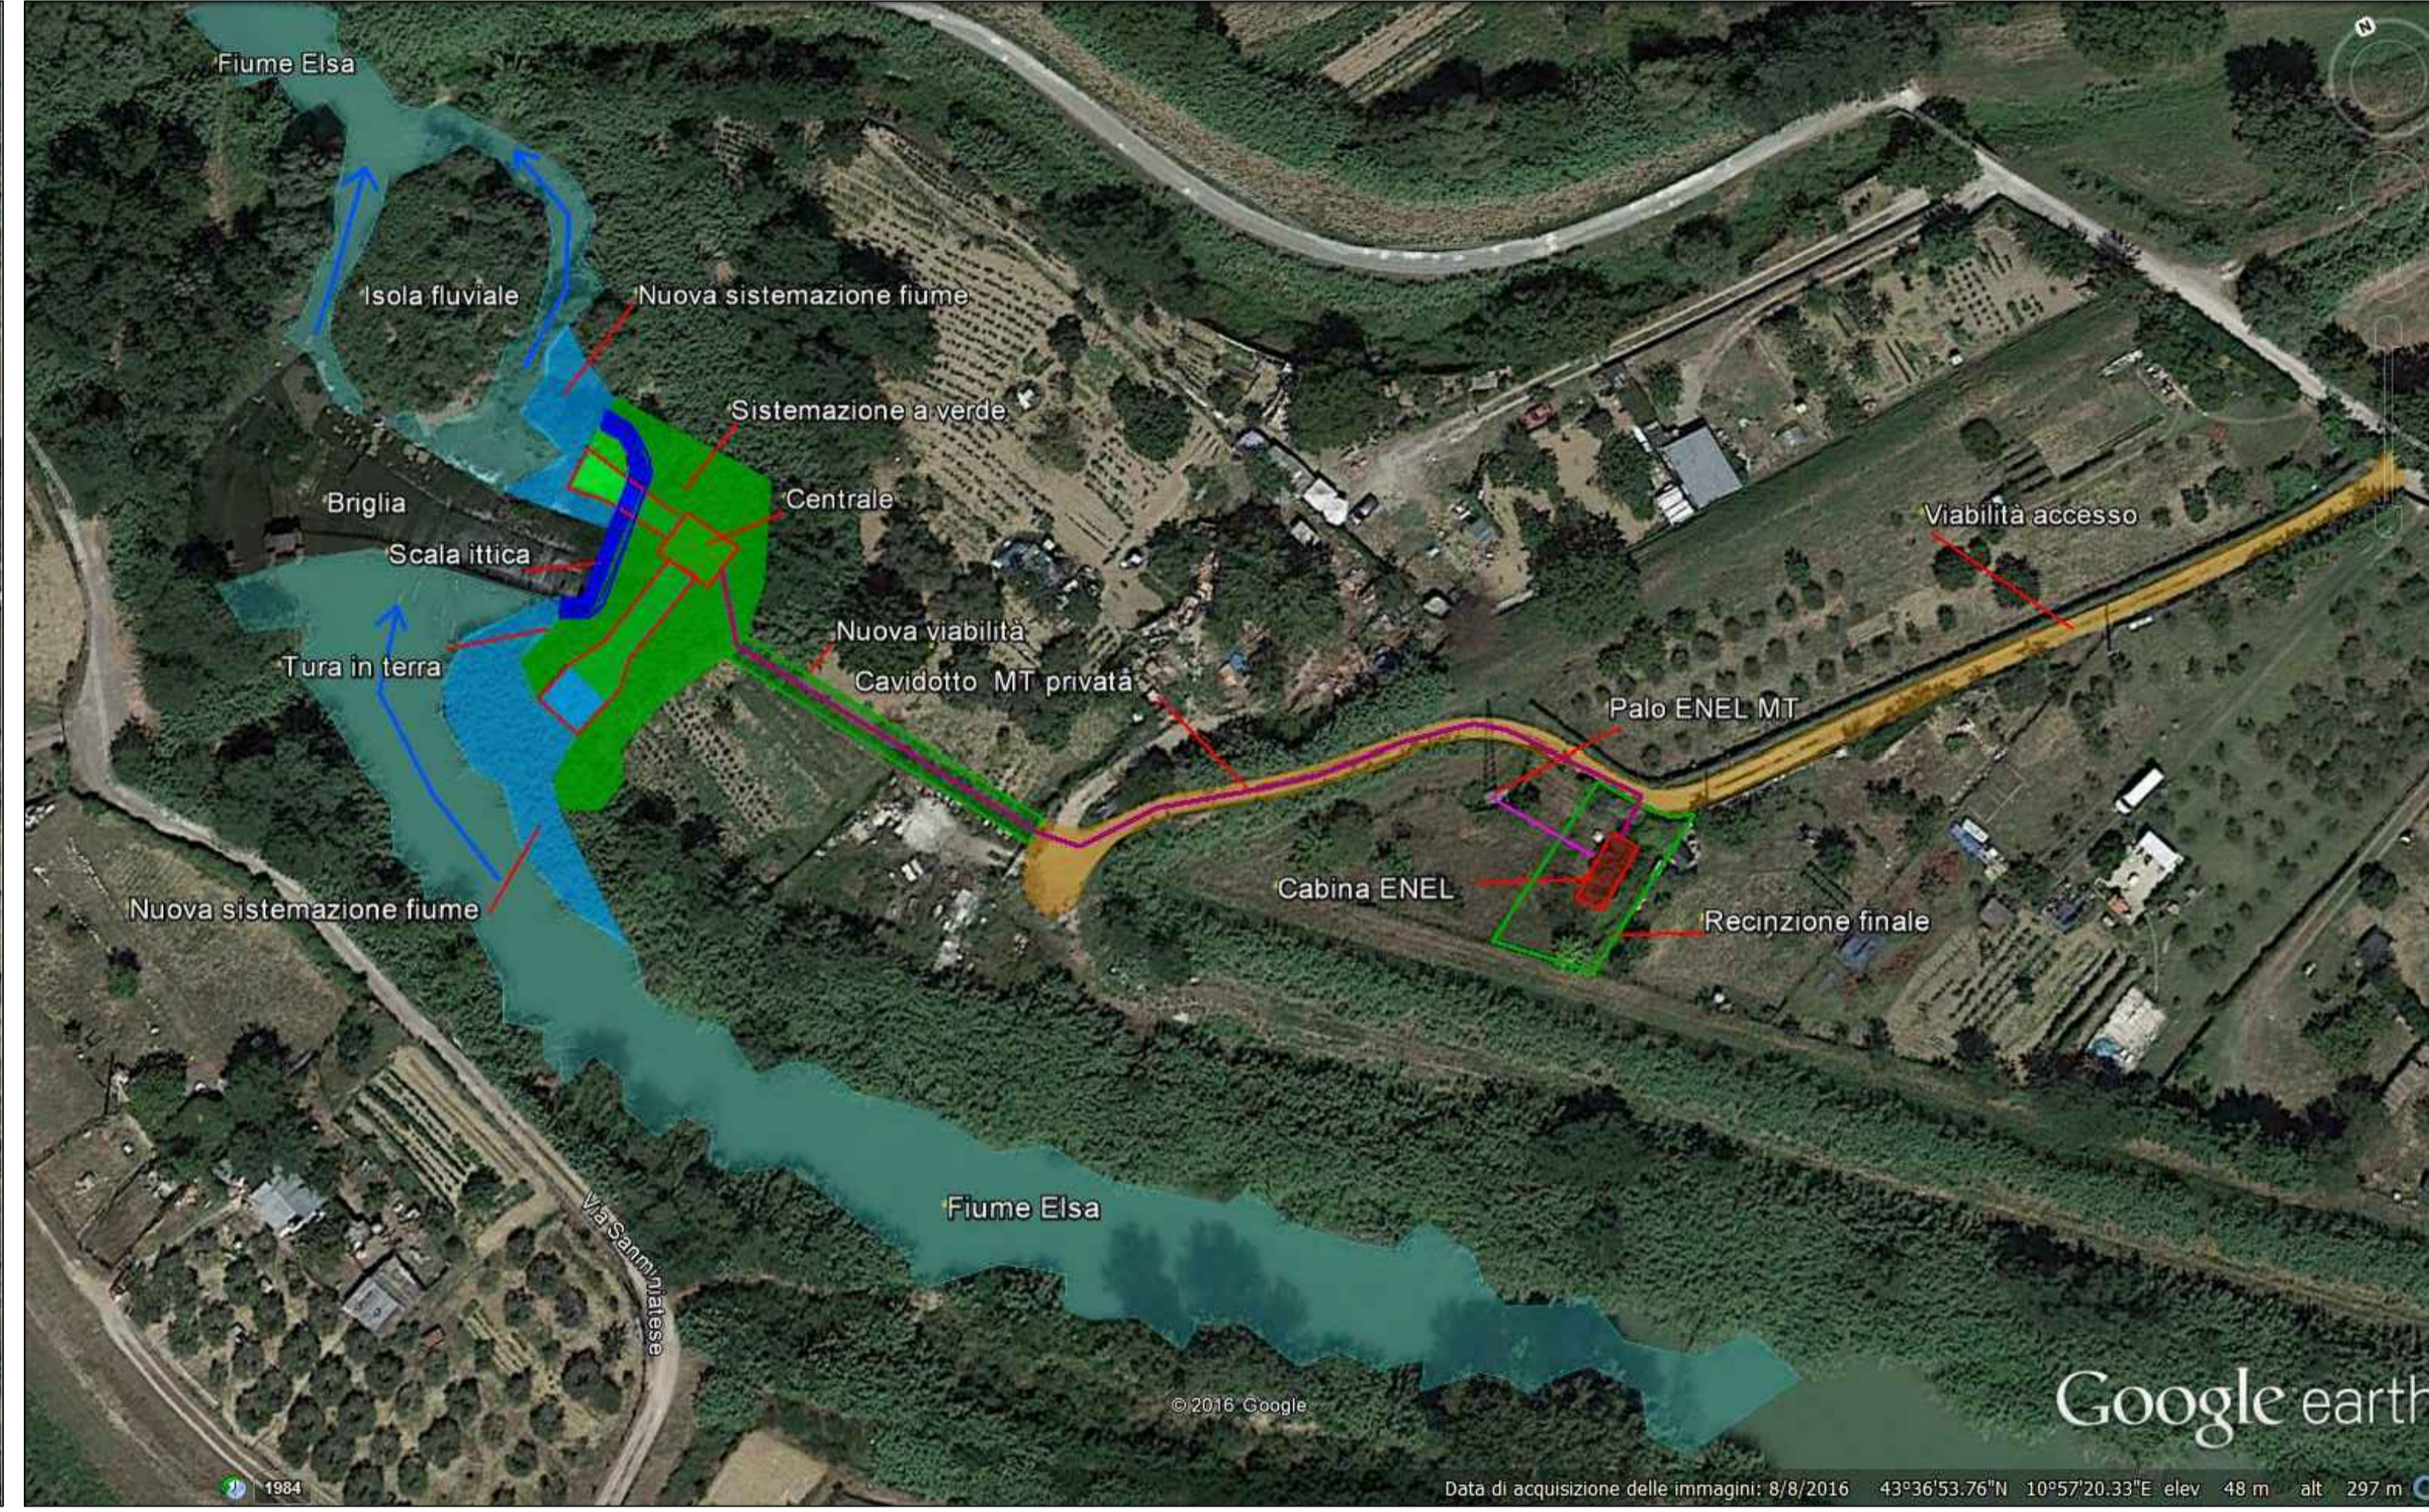

FASE 4

- a) Cantiere centrale
 - recupero materiale terroso delle ture e risagomatura sponde zona presa e rilascio con posa di blocchi in pietra.
 - Completamento passaggio artificiale per pesci.
 - Realizzazione caviddoto collegamento centrale-cabina.
 - Sistemazione ambientale con piantumazione essenze vegetali (lecci, pioppi, siepi e talee).
 - Smontaggio recinzione cantiere.
 - Sistemazione finale della strada di accesso.
