



**REGIONE TOSCANA**

**GIUNTA REGIONALE**

**6**

**IL PROGRAMMA STRAORDINARIO  
DEGLI INVESTIMENTI REGIONALI**

**STATO DI ATTUAZIONE**

**GIUNTA PROGRAMMATICA  
DEL 9 FEBBRAIO 2009**

## INDICE

1. Il quadro di sintesi	3
2. L'attuazione dei Programmi	5
2.1. Interventi sanitari strategici	5
2.2. Strutture innovative per il sociale	6
2.3. Impiantistica sportiva	8
2.4. Investimenti nei beni culturali	8
2.5. Edilizia scolastica	10
2.6. Edilizia abitativa per studenti universitari	11
2.7. Distretti industriali e sistemi produttivi locali	11
2.8. Imprese – Infrastrutture ecologiche per aree produttive	12
2.9. Rilancio dei poli espositivi	13
2.10. Rilancio dell'offerta termale	14
2.11. Infrastrutture turistiche	15
2.12. Offerta commerciale	15
2.13. Agricoltura – Pretrattamento carcasse animali	15
2.14. Agricoltura – Energia per le aree rurali	16
2.15. Agricoltura – Riconversione strutture agroindustriali	17
2.16. Invasi idrici multifunzionali	17
2.17. Rete di distribuzione dell'acqua di Montedoglio	18
2.18. Infrastrutture viarie	18
2.19. Mobilità – treni	20
2.20. Mobilità – Piani urbani della mobilità	21
2.21. Mobilità – porti	21
2.22. Miglioramento della qualità urbana della città di Firenze	22
2.23. Difesa dall'erosione della costa	22
2.24. Superamento delle situazioni di crisi idrica e tutela delle risorse idriche	23
2.25. Valorizzazione ambientale territorio toscano	25
2.26. e-Toscana	27
2.27. Portale della Toscana	30

## **TABELLE** **31**

Tabella 1 - Quadro finanziario previsionale	32
Tabella 2 - Programmazione finanziaria e impegni delle risorse sul Bilancio regionale; grafici relativi ai programmi 2003-2004	34
Tabella 3 - Risorse per i progetti definiti per soggetto finanziatore	38
Tabella 4 - Progetti definiti (numero e risorse) per ambito provinciale di localizzazione	40
Tabella 5 - Progetti definiti (numero e risorse) per tipo di soggetto attuatore e avanzamento della spesa dei soggetti attuatori	42
Tabella 6 - Avanzamento procedurale dei progetti	44

## 1. Il quadro di sintesi

Il Programma straordinario degli investimenti è stato avviato inizialmente con gli stanziamenti iniziali del DPEF e della Finanziaria regionale 2003 (961 milioni di euro di risorse regionali), il Programma è stato ulteriormente ampliato con la Finanziaria 2004 (106 milioni di euro); con tali risorse sono stati varati i primi 12 programmi di intervento.

La Finanziaria 2005 (279 milioni di euro) ha attivato nuovi programmi per il 2005-2007, ha rifinanziato alcuni dei programmi precedenti, e ha previsto il finanziamento straordinario di alcune azioni del Nuovo Patto per lo sviluppo e l'occupazione del marzo 2004.

La Finanziaria 2006 ha stanziato ulteriori 120 milioni di euro per nuovi programmi 2006-2008 e per nuovi filoni di programmi precedenti.

L'insieme di questi programmi ha promosso l'attivazione di risorse di altri soggetti pubblici (enti locali, Stato, enti regionali) e privati, che si sono definite progressivamente con l'approvazione dei Programmi e la messa a punto dei piani effettivi: il quadro finanziario complessivo <sup>1</sup> prevede ad oggi investimenti totali per 4,1 miliardi di euro, finanziati per quasi il 50% da risorse regionali <sup>2</sup>.

I **programmi attivati nel 2003-2004** sono in gran parte avviati verso la fase finale, con numerosi interventi conclusi o avviati alla conclusione. L'investimento complessivo previsto ammonta a oltre 3.170 milioni di euro. Per la realizzazione dei programmi sono stati impegnati sul bilancio regionale 1.291 milioni di euro (di cui 364 milioni nel 2008) <sup>3</sup>, pari a quasi l'80% dello stanziamento relativo ai programmi 2003-2004; sono stati effettuati pagamenti per 697 milioni di euro (di cui 135 milioni nel 2008). Sulle risorse a carico del bilancio regionale per i programmi attivati nel 2003-2004 <sup>4</sup> (845 milioni di euro escludendo la viabilità, per la quale gli impegni sono effettuati a conclusione delle progettazioni) restano ancora da impegnare 122 milioni di euro, concentrati in particolare nei programmi per la difesa della costa (per il quale peraltro è previsto l'appalto di 5 interventi per 32 milioni di euro entro la prima metà del 2009), per i poli espositivi (Firenze). I progetti definiti sono oltre 1.200, per un investimento di 3.140 milioni di euro (che rappresenta il 99% delle risorse complessivamente disponibili per i programmi). I soggetti attuatori hanno effettuato impegni per 1.200 milioni di euro (di cui 127 milioni nel 2008), con pagamenti per oltre 700 milioni (117 milioni nel 2008); oltre la metà dei progetti sono conclusi.

Per quanto riguarda i **programmi avviati nel 2005** è stato definito il quadro progettuale ed è stata avviata l'attuazione degli interventi. A fronte di 255 milioni di risorse regionali, l'investimento complessivo previsto è ad oggi di circa 690 milioni di euro: sono definiti o in corso di definizione progetti per 582 milioni di euro. Per l'insieme dei programmi la Regione ha impegnato 207 milioni di euro e pagato quasi 140 milioni.

Riguardo ai programmi disposti con la **legge finanziaria 2006**, quasi tutti i programmi sono stati avviati. L'insieme dei programmi 2006 prevede investimenti per oltre 250 milioni di euro (con un incremento di 90 milioni nel 2008) a fronte di un finanziamento regionale di circa 115 milioni, su cui sono stati effettuati impegni per quasi 60 milioni.

---

<sup>1</sup> Eventuali discordanze con i dati sul Programma straordinario degli investimenti presenti nel Rapporto di sintesi sono dovute alla diversa tempistica di aggiornamento dei due rapporti

<sup>2</sup> Considerando sia le risorse regionali straordinarie dedicate al sostegno del Programma straordinario degli investimenti, sia altre risorse gestite dalla Regione che confluiscono nello stesso

<sup>3</sup> Il rilevante incremento nelle risorse e negli impegni della Regione che si registra nel 2008 per i programmi 2003-2004 è dovuto in larga misura all'impegno da parte della Regione delle risorse trasferite dallo Stato destinate alla realizzazione dei Nuovi Ospedali (v. infra)

<sup>4</sup> Compresa le risorse integrative 2005 e 2006

Per il 2008 si segnalano i seguenti elementi:

- per i Nuovi ospedali, la Regione ha impegnato a favore delle ASL i finanziamenti trasferiti dallo Stato (169,1 milioni di euro); per gli interventi sul patrimonio sanitario, la Regione ha destinato nel 2008 ulteriori 10 milioni di euro per opere infrastrutturali connesse alla realizzazione dei Nuovi ospedali e al trasferimento dell'AOU di Pisa;
- relativamente agli interventi sulle infrastrutture sociali, a settembre 2008 è stato approvato il nuovo accordo di programma finanziato dalla Regione con 18,8 milioni di euro; sono previsti investimenti per 77,4 milioni;
- per le infrastrutture ecologiche per aree produttive, il finanziamento (4 milioni di euro) è stato fatto confluire nel programma sull'evoluzione competitiva e sostenibile del distretto integrato Toscana (ECeSDIT), che ha ottenuto finanziamenti statali nell'ambito del "bando distretti"; a dicembre la Regione ha emanato il bando per le Aree produttive ecologicamente attrezzate;
- per il programma di rilancio dell'offerta termale, nel settembre 2008 sono state stanziati ulteriori risorse ordinarie (1 milioni di euro), destinate alle terme pubbliche non partecipate dalla Regione;
- per il programma sull'energia per le aree rurali, i 20 progetti ammessi al finanziamento 2007 (4 milioni di euro) sono in fase di inizio lavori; a ottobre sono stati stanziati ulteriori 4 milioni di euro di risorse ordinarie, con cui sono stati finanziati altri 22 interventi; sono in corso di predisposizione i progetti esecutivi;
- per la viabilità regionale, si sono conclusi nel primo semestre 2008 alcuni interventi sulla SGC Fi-Pi-Li (investimento di 20 milioni di euro), e altri interventi sulla viabilità regionale ordinaria; nel 2008 la Regione ha effettuato impegni per 73 milioni di euro e pagamenti per 71 milioni;
- per le risorse idriche - filone relativo alla riduzione dell'inquinamento - è stato aggiornato l'accordo di programma per il comprensorio del cuoio e il padule di Fucecchio, con lo stanziamento da parte della Regione di ulteriori 8 milioni di euro; inoltre sono stati sbloccati, per alcuni interventi, i cofinanziamenti statali; per il programma 2006-2008, a novembre 2008 sono stati impegnati 3,4 milioni di euro, per interventi di miglioramento della qualità dell'acqua erogata e per la realizzazione di punti di approvvigionamento pubblici, a gennaio 2009 è stato approvato l'accordo di programma per l'utilizzazione dell'acqua della diga di Montedoglio (10 milioni di euro il finanziamento regionale);
- per la valorizzazione ambientale del territorio toscano, i progetti previsti dai Piani di azione comunale relativi alla qualità dell'aria e alla mobilità dolce sono in fase di avvio; per la raccolta differenziata è in fase di approvazione la graduatoria dei progetti individuati a seguito di bando;
- per la difesa dall'erosione della costa, è stato firmato l'accordo di programma per il ripristino della spiaggia di Bocca d'Ombrone, la regimazione delle acque interne e la riduzione della loro salinizzazione (investimento complessivo 5,6 milioni di euro); per l'intero programma sono stati impegnati in tutto, 49,1 milioni di euro, di cui 28,6 milioni nel 2008.

Lo stato di avanzamento dei programmi è riferito di norma al 31/12/2008, sulla base di dati di monitoraggio per i quali la procedura di aggiornamento è ancora in corso.

## 2. L'attuazione dei programmi

### 2.1 Interventi sanitari strategici (2003 e sgg.)

Il Piano, approvato nel dicembre 2002 (Delibera Consiglio regionale n. 202 del 23/12/2002: "Piano Sanitario Regionale 2002-2004: approvazione del programma pluriennale di interventi sanitari strategici"), si articola in due filoni di intervento: il completamento della rete dei nuovi ospedali regionali (Apuane, Lucca, Pistoia e Prato) e la riqualificazione di alcune strutture delle Aziende ospedaliere di Pisa e Siena.

#### Nuovi ospedali

Relativamente al filone "Nuovi ospedali" (1.700 i posti letto totale previsti, di cui 540 per Prato, 410 per Lucca, 360 per Massa-Carrara e 400 per Pistoia), dopo la risoluzione, nel maggio 2005, del contenzioso amministrativo sulle procedure di scelta del soggetto promotore del project financing, a novembre 2005 sono stati firmati gli accordi di programma che stabiliscono in modo specifico e dettagliato gli impegni dei sottoscrittori per la realizzazione degli interventi. A dicembre 2005 l'Assemblea del SIOR ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione dei nuovi ospedali, adeguando il costo complessivo dell'intervento a 422 milioni di euro (in base alla variazione dell'indice ISTAT del costo delle costruzioni relativo alla Provincia di Firenze): il costo sarà coperto per 169 milioni dallo Stato (con risorse di cui all'art. 20 Legge 67/88), per 121 milioni di euro dalle quattro Aziende Sanitarie, mentre i restanti 132 milioni sono a carico dell'impresa privata.

Ad aprile 2006 il SIOR ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il bando per la realizzazione dei quattro nuovi ospedali toscani che ha consentito di individuare i due migliori offerenti da ammettere alla procedura negoziata con il promotore: questa fase si è conclusa a marzo 2007; a luglio 2007 il SIOR ha aggiudicato la concessione per la costruzione degli ospedali di Prato, Pistoia, Lucca e delle Apuane ad ATI Astaldi. A novembre 2007 è stata firmata la convenzione tra il concessionario ATI Astaldi e le 4 Aziende sanitarie interessate per la realizzazione dei 4 ospedali e la gestione dei servizi non sanitari e commerciali.

I progetti definitivi sono stati consegnati dal concessionario nel mese di aprile 2008; successivamente, tra maggio e luglio, sono state espletate le conferenze dei servizi per l'acquisizione di permessi, autorizzazioni, nulla osta e per l'eventuale modifica degli strumenti urbanistici. Sono altresì iniziate le procedure amministrative relative alle espropriazioni delle aree interessate delle opere.

Le risorse statali per la realizzazione dei Nuovi Ospedali sono state assegnate alla Regione, che a marzo 2008 le ha impegnate totalmente (169,1 milioni di euro) a favore delle ASL interessate.

Le Aziende sanitarie hanno provveduto nel mese di agosto 2008 al pagamento di un acconto sugli oneri di progettazione per un importo complessivo di 2,8 milioni di euro.

#### Interventi per le AOU di Pisa e Siena

Questo filone di intervento prevede un investimento complessivo di 282,8 milioni di euro, la cui copertura è assicurata per 88 milioni da risorse regionali nell'ambito del Programma straordinario degli investimenti (interamente impegnate, con pagamenti per oltre 34 milioni), per 188,6 milioni da risorse delle stesse AOU e per i restanti 6,2 milioni da risorse private.

L'intervento di Siena (nuovo reparto di emergenza e urgenza a Le Scotte) è in fase di realizzazione (conclusione prevista nel 2010); l'Azienda ha impegnato 29,8 milioni di euro, l'intero costo del progetto, e pagato 10,7 milioni.

A Pisa l'intervento riguarda il completamento del trasferimento dell'Azienda da S. Chiara a

Cisanello: è stato firmato un Accordo di programma (marzo 2005) che prevede un investimento di 253 milioni di euro (cui si aggiungono 36,7 milioni di euro da parte dell'Università e 80,7 milioni di euro per le opere infrastrutturali connesse di viabilità, trasporti, servizi, riassetto idraulico, depurazione).

L'intervento è articolato in due azioni: 1 - realizzazione del nuovo Pronto Soccorso del PO di Cisanello (investimento 35 milioni di euro) i cui lavori sono iniziati nel 2006; 2 - realizzazione delle ulteriori opere previste dall'Accordo di Programma fra cui in particolare l'edificio per ospitare le funzioni residue di ricovero ancora ospitate a Santa Chiara (secondo potenziamento), la piastra diagnostica, i magazzini e logistica etc. (intervento complessivo 218 milioni di euro). Per gli interventi relativi alla piastra diagnostica, secondo potenziamento, magazzini e logistica, centrali termiche e elettriche e le relative opere di urbanizzazione nonché per gli interventi a carico dell'Università e del DSU, è in corso la gara di progettazione unitaria da parte dell'AOU Pisana, è terminata la prima fase di preselezione dei 10 partecipanti che hanno già inviato le offerte da valutare da parte e della commissione di gara per la definitiva aggiudicazione.

L'Azienda ha impegnato oltre 72 milioni di euro (che comprendono l'intero contributo regionale) e pagato quasi 16 milioni.

A maggio e a dicembre 2008 la Giunta regionale ha assegnato rispettivamente 3,4 milioni e 6,6 milioni di ulteriori risorse per opere infrastrutturali connesse al trasferimento da S. Chiara a Cisanello e alla realizzazione dei Nuovi ospedali.

#### Completamento del patrimonio strutturale e strumentale della sanità

La Finanziaria 2005 ha destinato ulteriori finanziamenti per 40 milioni di euro (10 milioni nel 2005, 15 nel 2006 e 15 nel 2007) per interventi di completamento del patrimonio strutturale e strumentale della sanità. A fine 2005 è stata approvato dal Consiglio il programma degli interventi (Delibera n. 138 del 21/12/2005: "Interventi per il completamento del patrimonio strutturale e strumentale della sanità – assegnazione risorse"), che ha ripartito le risorse regionali tra sette ASL, la Regione ha impegnato tutte le risorse stanziare ed effettuato pagamenti per 18 milioni di euro.

Il quadro finanziario previsionale presenta un investimento complessivo di quasi 60 milioni di euro, a fronte del quale sono stati definiti 9 progetti: ASL 11 di Empoli, tre interventi (manutenzione straordinaria del PO di San Miniato, 750 mila euro; acquisto di apparecchiature e arredi destinati al nuovo ospedale di Empoli, 20,6 milioni; realizzazione del parcheggio del PO di Empoli, 950 mila euro); ASL 2 di Lucca (opere viarie per la fruibilità del nuovo ospedale, 5,2 milioni); ASL 9 di Grosseto (completamento strutturale e strumentale del presidio ospedaliero Misericordia, 11,3 milioni); ASL 10 di Firenze (riorganizzazione funzionale presidio ospedaliero "Serristori", 5,8 milioni); ASL 5 di Pisa, (attrezzature per il PO di Pontedera, 2,6 milioni); ASL 6 di Livorno (completamento della ristrutturazione del PO di Livorno e acquisto attrezzature, 12,2 milioni); ASL 8 di Arezzo (completamento e sistemazione, 500 mila euro).

L'intervento dell'ASL di Arezzo è concluso, quattro sono in fase di realizzazione e gli altri a vari stadi di progettazione. Le ASL hanno impegnato 45,8 milioni ed effettuato pagamenti per circa 24,8 milioni.

## **2.2 Strutture innovative per il sociale (2003 e sgg.)**

Il Programma, approvato nel luglio 2003 (Delibera Consiglio regionale n. 123 del 23.7.2003: Programma straordinario investimenti "Sviluppo di strutture innovative per il sociale"), prevede la costruzione, il recupero e la riqualificazione di strutture sociali per l'erogazione di

servizi per minori, disabili, anziani, persone con problematiche psico-sociali, immigrati, nomadi, giovani e famiglie, per attività di aggregazione, di mediazione familiare e consultoriale. La programmazione degli interventi è a livello di Zone socio-sanitarie; la realizzazione dei progetti è affidata ai Comuni e alle Aziende sanitarie (anche con il coinvolgimento di soggetti del terzo settore).

Le risorse per la realizzazione del programma ammontano in totale a circa 120 milioni di euro, di cui 25,8 milioni di euro di fondi del Programma straordinario degli investimenti 2003-2005 e 88 milioni di altre risorse pubbliche e private.

I progetti sono stati inizialmente individuati con un Accordo di programma del 2003, sostituito nell'aprile 2004 da un nuovo Accordo di programma che ha consolidato definitivamente il quadro progettuale.

I progetti definiti sono ad oggi 274 per un investimento complessivo di circa 117 milioni di euro; dal punto di vista della distribuzione territoriale dei progetti, le province dove sono maggiormente concentrati gli interventi sono Pisa (22,4 milioni di euro) e Firenze (21,5 milioni di euro); seguono Arezzo (17 milioni; questa è la provincia che ha il maggior numero di progetti, 66) e Livorno (16 milioni). I progetti sono per lo più realizzati dai Comuni (249 progetti per 100 milioni di euro di investimento), e in parte dalle Aziende sanitarie (25 progetti per 16,7 milioni di euro di investimento).

I progetti prevedono la realizzazione di strutture per disabili, per anziani e per la famiglia, per l'accoglienza e l'immigrazione, e l'abbattimento di barriere architettoniche.

Per l'attuazione del programma la Regione ha impegnato 30,7 milioni di euro (l'intero importo del finanziamento), e pagato 28,3 milioni. L'avanzamento degli interventi vede 211 progetti terminati (oltre tre quarti di quelli del programma). I soggetti attuatori hanno effettuato impegni per oltre 98 milioni di euro e pagamenti per oltre 78 milioni (di cui circa 16 milioni nel 2008).

#### Aggiornamento 2005

Per dare continuità al programma di interventi in infrastrutture per il sociale, a maggio 2006 è stato sottoscritto l'Aggiornamento 2005 all'Accordo 2004: l'Aggiornamento comprende 204 ulteriori interventi, molti dei quali sono complementari agli interventi individuati con l'Accordo 2004 o completamenti degli stessi; 6 interventi sostituiscono progetti individuati dall'Accordo 2004 ma non avviati.

Le risorse regionali sull'Aggiornamento 2005 destinate a questi interventi ammontano a 19,8 milioni di euro sul bilancio 2006: 13,1 milioni sono costituiti da stanziamenti derivanti da residui dell'accordo 2004 e dal Fondo regionale assistenza sociale; 6,7 milioni sono parte delle risorse straordinarie della Finanziaria regionale per il 2006 (v. infra). A questi si aggiungono 2,5 milioni dell'annualità 2004, già impegnati, relativi ai progetti non avviati dell'Accordo 2004 e destinati ai 6 interventi sostitutivi sopra citati. Per l'Aggiornamento 2005 la Regione ha impegnato 22,3 milioni di euro (l'intero finanziamento) ed effettuato pagamenti per 8,4 milioni.

L'investimento complessivo ammonta a 65,4 milioni di euro; le province dove ricadono i maggiori investimenti sono Firenze (17,5 milioni), Lucca (10 milioni), Prato (8 milioni); il maggior numero di interventi riguarda l'abbattimento di barriere architettoniche (70 interventi per un investimento di 7,8 milioni); gli altri interventi sono destinati ai disabili (25 progetti per un investimento di 12,7 milioni), agli anziani (26 progetti per un investimento di 11,4 milioni), ai giovani, alle famiglie, agli immigrati e ai nomadi.

Risultano conclusi 67 progetti, mentre 71 sono in fase di realizzazione. I soggetti attuatori hanno impegnato oltre 36 milioni (di cui 10 milioni nel 2008) ed effettuato pagamenti per 28

milioni (di cui 12 milioni nel 2008) <sup>5</sup>.

#### Accordo 2007-2008

La legge finanziaria regionale per il 2006 ha stanziato 20 milioni di euro nel triennio 2006-2008 per ulteriori investimenti in strutture per il sociale (16 milioni per il 2006, 2 milioni per i due anni successivi).

A febbraio 2007 il Consiglio regionale (Delibera n. 28 del 28 febbraio 2007) ha approvato l' "Integrazione del programma straordinario degli investimenti nel settore sociale": ad esso sono destinati i 16 milioni di euro delle risorse 2006, in cui sono compresi anche i 6,7 milioni destinati all'Aggiornamento 2005.

A settembre 2008 la Giunta ha approvato il nuovo Accordo di programma 2007-2008 con finanziamenti per 18,8 milioni di euro (che comprendono 13,3 milioni di risorse straordinarie residue). Il nuovo accordo comprende 169 progetti; la maggior parte sono destinati agli anziani (55 progetti per 8,2 milioni di finanziamento), cui seguono quelli polifunzionali (30 progetti per 4,1 milioni), quelli per disabili e per abbattere barriere architettoniche (53 per 3,3 milioni); ci sono infine progetti dedicati ai giovani (17 per 1,8 milioni) e ai minori, immigrati e famiglie (8 progetti con un finanziamento di 1,2 milioni). Considerando i cofinanziamenti dei soggetti attuatori, il programma prevede un investimento complessivo di oltre 80 milioni di euro.

### **2.3 Impiantistica sportiva (2005)**

La legge finanziaria regionale per il 2005 ha stanziato nel triennio 2005-2007 3 milioni di euro per la realizzazione di impianti sportivi. A dicembre 2005 il Consiglio regionale ha approvato il programma degli interventi (Delibera n. 139 del 23/12/2005: "Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 - Legge finanziaria per l'anno 2005. Integrazione al Programma pluriennale investimenti, articolo 17 - Interventi a favore dell'impiantistica sportiva. Annualità 2005-2006-2007"), destinando le risorse straordinarie a favore degli enti locali della Toscana (singoli o associati) con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Il quadro finanziario attuale prevede un investimento complessivo di 5,1 milioni di euro, di cui 2,1 milioni di cofinanziamento degli enti attuatori. Con le risorse delle tre annualità 2005-2007 sono stati finanziati 70 progetti; di questi, 13 sono conclusi e 14 sono in fase di realizzazione; i restanti sono nelle fasi di progettazione o aggiudicazione lavori. Gli interventi riguardano il recupero e la riqualificazione, la messa a norma del patrimonio sportivo esistente, compreso quello scolastico, il recupero di impianti dismessi, la realizzazione di nuovi impianti.

La Regione ha impegnato tutte le risorse stanziate ed effettuato pagamenti per 2,5 milioni.

### **2.4 Investimenti nei beni culturali (2003 e sgg.)**

#### Toscana "Museo diffuso"

Il Programma, approvato nel luglio 2002 (Delibera Consiglio regionale n. 124 del 24/7/2002: "Legge regionale 1/2/1995, n. 14 - Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali. Approvazione del Programma pluriennale degli interventi strategici nel settore dei beni culturali"), promuove la conservazione, il restauro, la valorizzazione, la messa in

---

<sup>5</sup> Altri investimenti in strutture per il sociale, antecedenti agli Accordi finanziati con il Programma straordinario degli investimenti, sono stati realizzati con i finanziamenti del PISR 2001: considerando anche questi il totale dei progetti attivati sale a 581, dei quali oltre 300 risultano già completati.

sicurezza e la manutenzione dei beni culturali e artistici situati in aree escluse dal DocUP, (Arezzo, Firenze, Lucca, Pistoia, Siena e altri centri minori).

Dopo l'avvio del programma con la prima *tranche* di finanziamenti regionali, ulteriori risorse sono state apportate con le leggi finanziarie del 2004 e 2005; ad oggi le risorse regionali destinate al programma ammontano a 53,9 milioni di euro; oltre al finanziamento regionale gli investimenti sono cofinanziati per 31,4 milioni da altre risorse pubbliche e per 4,5 da risorse private: il quadro finanziario aggiornato prevede quindi investimenti per quasi 90 milioni di euro.

Il programma comprende 71 progetti definiti (30 a Firenze, 16 ad Arezzo, 11 a Lucca, 7 a Pistoia, 6 a Siena e 1 a Pisa), per un investimento complessivo di circa 90 milioni (corrispondente al quadro finanziario previsionale). La Regione ha pressoché interamente impegnato le proprie risorse, con pagamenti per oltre 43 milioni di euro. I soggetti attuatori hanno assunto impegni per 88,2 milioni di euro ed effettuato pagamenti per 82 milioni di euro (di cui 7,3 milioni nel 2008).

Il programma è in fase di completamento: 58 progetti sono conclusi, per un investimento realizzato di oltre 60 milioni di euro; 13 sono in fase di esecuzione dei lavori, quasi tutti con un avanzamento procedurale superiore al 75%.

#### Villa medicea di Careggi

L'acquisto della Villa medicea di Careggi è stato perfezionato nell'aprile 2004 al costo complessivo di 15,2 milioni di euro, interamente impegnato e liquidato. E' previsto il restauro della Villa e la successiva valorizzazione quale struttura culturale inserita nel sistema delle ville medicee.

#### Altri interventi

Con la legge finanziaria regionale per il 2005 sono stati stanziati ulteriori 15 milioni di euro, inizialmente previsti per il cofinanziamento di interventi nell'ambito di un accordo integrativo dell'APQ sui beni culturali; la stipula di tale accordo non si è poi concretizzata.

La maggior parte delle risorse (10 milioni) è stata destinata al nuovo programma 2006-2008 (v. infra), mentre le restanti (5 milioni) sono state assegnate:

- per il restauro e adeguamento dell'ex Convento di S. Apollonia a Firenze (2° lotto), di cui è responsabile l'ARDSU di Firenze (costo complessivo 3,9 milioni di euro, di cui 2 milioni regionali);
- per 4 progetti (3 del Comune di Firenze, 1 del Comune di Viareggio) che integrano l'APQ sui beni culturali finanziato con Delibera CIPE 35/2005; costo complessivo degli interventi 6,6 milioni di euro, di cui 3,5 milioni regionali (3 milioni della finanziaria 2005, 500 mila euro di ulteriori risorse regionali); gli altri cofinanziamenti vengono dai Comuni e da privati (non ci sono cofinanziamenti statali).

La Regione ha impegnato tutte le proprie risorse ed effettuato pagamenti per circa 4 milioni. 2 interventi sono conclusi e gli altri 3 sono in fase di esecuzione lavori; i soggetti attuatori hanno effettuato impegni per 7,5 milioni (2 milioni nel 2008) e pagamenti per 5,6 milioni.

#### Programma straordinario 2006-2008

Il Consiglio regionale ha approvato a luglio 2006 un ulteriore programma di interventi (Delibera Consiglio regionale n. 90 del 26 luglio 2006: "Programma pluriennale degli interventi strategici nel settore dei beni culturali per gli anni 2006-2008"), per cui sono stati stanziati 10 milioni di euro con la legge finanziaria regionale per il 2006 nell'ambito del

---

<sup>6</sup> Ulteriori 8,7 milioni stanziati con le tre leggi finanziarie per questo programma e non utilizzati sono confluiti nel Programma 2006-2008 (v.).

Programma straordinario degli investimenti. Il programma prevede due tipologie di interventi: musei (adeguamento degli standard museali) e beni culturali in generale. Gli interventi devono essere localizzati in aree non Obiettivo 2.

Oltre che con le risorse della Finanziaria 2006 (10 milioni), il programma è finanziato anche con parte delle risorse della Finanziaria 2005 (10 milioni) e con le risorse residue del programma Toscana "Museo diffuso" (8,7 milioni); ulteriori risorse sono state assegnate nel 2007 (3,9 milioni): il totale dei finanziamenti regionali ammonta quindi a 32,6 milioni di euro.

Il programma comprende 44 progetti, 7 relativi ai musei e 37 ai beni culturali in genere. L'investimento complessivo è di 47,1 milioni di euro (3,8 milioni relativi alla prima tipologia di interventi, 43,3 milioni alla seconda). I cofinanziamenti dei soggetti attuatori ammontano a 14,5 milioni. La provincia in cui sono localizzati i maggiori investimenti è Firenze (14,9 milioni), seguita da Pisa (9,4 milioni) e Arezzo (6,2 milioni).

La Regione ha impegnato a favore dei soggetti attuatori l'intero finanziamento previsto (32,6 milioni) e pagato circa 2 milioni. I soggetti attuatori hanno effettuato impegni per oltre 36 milioni e pagamenti per 10 milioni. 6 progetti sono conclusi, 35 sono in fase di esecuzione lavori, i restanti in fase di progettazione o di appalto. Per alcuni progetti, a luglio e agosto 2008 sono stati prorogati i termini per l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. Tutti gli interventi dovranno essere conclusi entro il 30 aprile 2010.

## **2.5 Edilizia scolastica (2006)**

La legge finanziaria regionale 2006 ha destinato 6,0 milioni di euro (2,0 milioni per ciascuna annualità 2006, 2007 e 2008) all'edilizia scolastica. In particolare le risorse sono destinate al sostegno degli enti locali in difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare interventi di edilizia scolastica di particolare urgenza ed indifferibili, pena la sospensione delle attività didattiche negli edifici scolastici che possono risultare a rischio per l'incolumità degli studenti. I finanziamenti sono destinati in via prioritaria ai Comuni in situazione di disagio secondo le norme di cui alla Legge 39/2004 relativa al sostegno dei Comuni montani e dei piccoli Comuni in situazione di disagio.

Nel maggio 2006 la Giunta regionale ha individuato i criteri e le modalità per la concessione e l'utilizzazione dei finanziamenti, stabilendo un contributo non superiore all'85% del costo complessivo di ciascun intervento e comunque non superiore a 300 mila euro per progetto. Potranno essere finanziati interventi di costruzione e completamento di edifici scolastici, l'acquisto di edifici da destinare allo stesso scopo, le ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie effettuate per la messa a norma di edifici scolastici, la riconversione a fini scolastici di edifici adibiti ad altre destinazioni. Gli enti locali hanno iniziato a presentare le domande a partire da giugno 2006.

Nel 2006 sono stati ammessi a finanziamento 16 progetti con un costo complessivo di 7,5 milioni di euro. A ottobre 2007, con le risorse per l'anno 2007, sono stati finanziati altri 11 progetti per un costo complessivo di 7,2 milioni. A luglio 2008 sono stati individuati 10 ulteriori progetti, finanziati con 1,7 milioni delle risorse straordinarie per l'anno 2008<sup>7</sup>.

La Regione ha impegnato tutte le risorse previste dal programma, ed effettuato pagamenti per 1,3 milioni di euro.

---

<sup>7</sup> 300 mila euro di risorse 2008 non sono state assegnate ma riservate a eventuali emergenze che dovessero verificarsi nel 2008.

## 2.6 Edilizia abitativa per studenti universitari (2003 e sgg.)

Il Programma approvato dal Consiglio regionale nel maggio 2002 (Delibera Consiglio regionale del 24.12.2002, n. 80: "Approvazione piano pluriennale di investimenti nell'ambito del Diritto allo Studio Universitario per gli anni 2002-2005") e finanziato inizialmente con risorse regionali pari a 43,9 milioni di euro, prevede la creazione di circa 2.800 posti letto nelle residenze universitarie toscane. Le leggi finanziarie regionali per il 2005 e il 2006 hanno stanziato rispettivamente 28 milioni e 10 milioni di euro per il completamento di progetti avviati (arredo e strumentazioni tecniche), la ristrutturazione e il miglioramento di immobili esistenti, l'edificazione di nuovi posti letto (oltre 300 in tutto).

Il quadro finanziario prevede ad oggi investimenti per oltre 154 milioni di euro, di cui 81,9 milioni di risorse regionali del programma straordinario, mentre le restanti sono altre risorse pubbliche e private. Questo quadro previsionale potrà subire ulteriori incrementi quando sarà completamente definito il quadro progettuale a fronte dei finanziamenti regionali 2007-2008.

Le risorse regionali sono state interamente impegnate, e sono stati effettuati pagamenti per quasi 79 milioni (di cui 13,7 nel 2008).

Le Aziende hanno definito finora 36 progetti, 21 dei quali sono conclusi, per un investimento realizzato pari a 74,4 milioni di euro; tra questi si segnalano: a Firenze, la realizzazione di residenze universitarie (Maragliano, Novoli, Varlungo) e della mensa universitaria a Novoli; a Siena, l'acquisto, la ristrutturazione e l'arredamento delle residenze universitarie di via XXIV maggio e via Piccolomini; a Pisa, l'acquisto dell'ex-hotel Nettuno e la realizzazione della mensa della facoltà di Ingegneria, il cablaggio della residenza di Via Parigi e il completamento della residenza universitaria Praticelli, entrata in esercizio nel corso del 2008 (su cui comunque è prevista la realizzazione di spazi culturali nel 2009).

Questo lo stato di avanzamento degli interventi tuttora in corso nelle:

- a Pisa è in corso di realizzazione l'intervento di completamento arredi della residenza Don Bosco; altri interventi entreranno in progettazione nel 2009 (nuova mensa di Cisanello, riqualificazione mensa via Martiri); sono sospesi altri interventi (edificazione alloggi in loc. San Cataldo, acquisto degli immobili La Mattonaia e Santa Chiara);
- a Firenze sono in corso di esecuzione i lavori di manutenzione delle Case dello studente "Salvemini" e "Calamandrei", la cui conclusione è prevista all'inizio del 2009;
- a Siena è stata acquistata la residenza in loc. Tognazza (già precedentemente ristrutturata), mentre la ristrutturazione è in corso per l'immobile di Viale Sardegna (conclusione prevista nel 2009); nel 2009 è previsto l'inizio dell'adeguamento delle residenze in loc. Uopini (di cui è stato stipulato il preliminare di acquisto) e della residenza Sperandie.

Le Aziende hanno assunto impegni per 102 milioni di euro ed effettuato pagamenti per 82 milioni.

## 2.7 Distretti industriali e sistemi produttivi locali (2005 e sgg.)

La legge finanziaria regionale per il 2005 (L.R. 71/2005) ha destinato risorse per la Riorganizzazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali (programma previsto nell'ambito del Nuovo Patto per lo sviluppo del marzo 2004).

Il Consiglio regionale (con la Delibera n. 88 del settembre 2005) ha riprogrammato le risorse, incrementandole con la premialità CIPE sugli APQ (Delibere CIPE 17/2003 e 20/2004): il programma è quindi finanziato con 13 milioni di risorse del Nuovo Patto (art. 21 legge

finanziaria 2005), 23 milioni di euro previsti dall'art. 19 della legge finanziaria regionale 2005, 4,8 milioni di euro di premialità CIPE. L'anno successivo la finanziaria regionale 2006 ha stanziato ulteriori risorse straordinarie (6 milioni di euro) che sono confluite sul programma, portando il totale delle risorse regionali totali a 46,8 milioni di euro.

A novembre 2005 è stato emanato l'avviso per la manifestazione di interesse per il cofinanziamento di interventi finalizzati al rafforzamento della competitività dei contesti territoriali locali. I progetti ammissibili (relativi ai distretti industriali e al restante territorio regionale) sono stati individuati a giugno 2006. A gennaio 2007 alcuni progetti sono stati rimodulati e sono state concesse proroghe per i termini di presentazione della documentazione. Altri progetti selezionati che presentavano i necessari requisiti sono stati ammessi ai finanziamenti sulle risorse DocUP 2000-2006 e CIPE (Delibere CIPE 20/2004, 35/2005 e 3/2006).

Nel 2008, allo scopo di accelerare l'attuazione degli interventi ed il riutilizzo delle eventuali economie accertate, la Giunta regionale ha adottato un atto di indirizzo (v. DGR 79 del 11/02/2008), cui ha fatto seguito il decreto dirigenziale n. 1290 del 2 aprile 2008 che ha fissato i termini perentori di realizzazione degli interventi medesimi.

Per il programma nel suo complesso la Regione ha impegnato e trasferito ad Artigiancredito risorse per 24 milioni di euro.

Gli interventi relativi all'Azione 1 (opere di urbanizzazione di aree per insediamenti produttivi ed adeguamento e completamento di strutture per la promozione di prodotti locali, fiere e mostre) presentati a giugno 2008 risultano essere 19; per 6 di essi è stato approvato il progetto definitivo, per un investimento complessivo ammesso<sup>8</sup> di 4,3 milioni di euro (di cui 2 milioni di finanziamento regionale).

Relativamente all'Azione 2 (realizzazione di strutture di servizi avanzati: incubatori, laboratori di ricerca, centri di prove sperimentali, ecc.) sono pervenuti 46 studi di fattibilità, di cui 39 sono già stati approvati. Per 14 interventi è stato approvato anche il progetto definitivo per un investimento complessivo ammesso di 11,1 milioni di euro (di cui 7,2 di finanziamento regionale).

Per l'Azione 3 (realizzazione e consolidamento di reti immateriali per il governo dei processi di riorganizzazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali) sono stati presentati 9 studi di fattibilità. 7 di questi sono completati, per un costo ammesso di oltre 190 mila euro, di cui 100 mila di finanziamento regionale. Per gli altri 2 studi di fattibilità le procedure regionali per l'assegnazione del finanziamento regionale definitivo sono in fase di conclusione.

A livello di programma nel suo complesso i soggetti attuatori hanno impegnato 14,1 milioni di euro e pagato 1,8 milioni.

## **2.8 Imprese – Infrastrutture ecologiche per aree produttive (2006)**

La legge finanziaria per il 2006 ha stanziato nell'ambito del Programma straordinario degli investimenti, 4 milioni per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA).

A giugno 2008 lo stanziamento è confluito nel programma regionale Evoluzione competitiva e sostenibile del distretto integrato Toscana (ECeSDIT), che ha partecipato al "bando distretti" promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico con DM 28.12.2007. Il programma prevede

---

<sup>8</sup> A seguito dell'istruttoria regionale, in tutte le Azioni del programma gli *investimenti ammessi* sono a volte inferiori agli *investimenti previsti* indicati negli atti di approvazione degli interventi (DD 2156/06 e 2680/06)

due macro azioni, la seconda delle quali è specificatamente dedicata alle APEA <sup>9</sup>: questa sarà finanziata, oltre ai 4 milioni del Programma straordinario degli investimenti, da compartecipazioni pubbliche o private per almeno 1 milione e dalle risorse statali del "bando distretti" (2,9 milioni), assegnate formalmente al programma ECeSDIT dal Ministero per lo Sviluppo Economico nell'agosto 2008.

Alla fine di dicembre 2008 la Regione ha emanato il bando relativo alle APEA: saranno finanziati progetti per la riqualificazione ambientale di aree per insediamenti produttivi industriali o artigianali che prevedano una gestione unitaria ed integrata di infrastrutture e servizi idonei a garantire il rispetto dell'ambiente (anche mediante il controllo delle emissioni di inquinanti) in un'ottica di sviluppo sostenibile, che tenga in considerazione anche gli aspetti riconducibili alla salute, alla sicurezza ed alla competitività. I progetti dovranno essere realizzati da soggetti pubblici e riguardare: opere di urbanizzazione; nuove realizzazioni o ristrutturazioni di centri di competenza, laboratori di ricerca, strutture per l'alta formazione, servizi pluriaziendali. Gli interventi dovranno concludersi entro l'agosto 2011 (36 mesi dall'assegnazione del cofinanziamento statale).

## 2.9 Rilancio dei poli espositivi (2003)

Il Programma, approvato nel febbraio 2003 (Delibera Consiglio regionale n. 36 del 25/2/2003: "Programma pluriennale degli investimenti 2003-2005. Interventi per il rilancio dei poli espositivi e congressuali della Toscana. Modifiche al piano regionale dello sviluppo economico ex L.R. n. 35/2000 per l'attuazione degli interventi e definizione delle linee strategiche"), intende potenziare i tre poli espositivi di Firenze - Area Metropolitana, Carrara (IMM) e Arezzo (Centro Affari e Convegni) definendo gli obiettivi di crescita e di qualificazione dell'offerta espositiva. Il programma, in seguito ad alcune rimodulazioni, oltre agli interventi nelle sedi principali dei poli, ha incluso anche i progetti della Provincia di Pistoia (completamento dell'auditorium congressuale di Montecatini Terme) e del Comune di Prato (realizzazione polo espositivo nell'area "ex-Banci"), e ha previsto un nuovo intervento (Palazzo dei congressi di Chianciano Terme). Con la più recente rimodulazione del dicembre 2007 sono state aumentate di 500 mila euro le risorse assegnate al polo di Carrara, diminuendo per un pari importo quelle destinate a Firenze Fiera. Il sostegno regionale è realizzato con la partecipazione ad operazioni di aumento del capitale sociale e con l'erogazione di contributi in conto capitale.

Il quadro finanziario prevede 165,2 milioni di investimenti così ripartiti: per l'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, 112,7 milioni di euro; per Carrara, 19 milioni di euro; per il polo espositivo-congressuale aretino 33,6 milioni di euro. Il cofinanziamento regionale è del 50% dell'investimento per ogni polo (82,6 milioni di euro in totale).

Sulle risorse regionali ad oggi risultano impegni complessivi per 31 milioni di euro, quasi interamente pagati (con 2,1 milioni pagati nel 2008): 15 milioni di euro gli impegni per l'area metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia (di cui 2 milioni per il progetto di Montecatini Terme) con pagamenti per 14 milioni; 6,5 milioni per Arezzo, 9,5 milioni per Carrara (entrambi interamente pagati).

Per l'attuazione del programma risultano definiti interventi per 154 milioni di euro, cui corrisponde 14 progetti così ripartiti:

- 4 a Firenze (per un investimento complessivo di 86,6 milioni di euro), dove gli interventi sono stati rimodulati in seguito all'adozione del nuovo piano industriale;

---

<sup>9</sup> La macro azione 1 è relativa a ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico

- 6 ad Arezzo (investimento di 24,6 milioni): 2 progetti sono terminati, 1 in fase di realizzazione, 3 sono in fase di progettazione;
- 2 a Carrara (investimento di 18 milioni), un progetto si è concluso, l'altro è in fase di realizzazione;
- 1 a Montecatini (investimento 4 milioni): l'intervento è in fase di realizzazione;
- 1 a Prato (investimento 20 milioni di euro).

Si registrano da parte dei soggetti attuatori impegni per quasi 142 milioni e pagamenti per 43,3 milioni.

A febbraio 2007 la Regione Toscana e le Province e i Comuni di Firenze e Prato hanno firmato un Protocollo d'intesa che prevede la realizzazione di un centro espositivo polivalente a Prato come articolazione del polo metropolitano di Firenze Fiere.

A luglio 2007 la Giunta ha approvato la bozza di Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia del Demanio, la Regione Toscana, la Provincia di Firenze e il Comune di Firenze per la permuta di più immobili, che coinvolge tra gli altri la Fortezza da Basso: lo scambio è ritenuto necessario per l'acquisizione della Fortezza ed il suo rilancio come principale sede del polo fieristico e congressuale fiorentino. A settembre 2008 è stata approvata una legge regionale recante disposizioni speciali relative ai beni immobili destinati a finalità espositive o congressuali, la quale potrà consentire di riconoscere a Firenze fiera agevolazioni sul canone per la concessione del complesso della Fortezza da basso e di Villa Vittoria. A fine luglio 2008 sono stati nominati Presidente e nuovo Consiglio di amministrazione di Firenze Fiera, passaggio decisivo che consentirà di avviare nuovi investimenti per il rilancio del polo.

## 2.10 Rilancio dell'offerta termale (2005 e sgg.)

Per il rilancio dell'offerta termale sono state stanziare risorse nell'ambito del Programma straordinario degli investimenti con le leggi finanziarie regionali per il 2005 (9 milioni) e per il 2006 (3 milioni). L'obiettivo è di assegnare finanziamenti agli enti locali e alle società termali a prevalente capitale pubblico da questi partecipate, insieme alla Regione (nella forma della ricapitalizzazione delle società o attraverso l'erogazione di contributi) per la realizzazione di investimenti finalizzati alla qualificazione degli stabilimenti, dei relativi impianti e delle dotazioni, collegati a specifici programmi di investimento.

Il Consiglio regionale ha approvato il programma di interventi alla fine del 2005 (Delibera n. 111 del 9 novembre 2005), integrato nel febbraio 2007 (Delibera del Consiglio regionale n. 14 del 13 febbraio 2007) con le risorse della finanziaria 2006. A questi atti sono seguite le delibere attuative della Giunta, la più recente adottata nel maggio 2007: il quadro definitivo prevede la seguente destinazione delle risorse: Chianciano Terme (3,5 milioni), Montecatini Terme (3,5 milioni), Casciana Terme (1 milione), San Giuliano Terme (1 milione). Ulteriori 2 milioni sono riservati alle terme pubbliche partecipate dalla Regione, per interventi che saranno individuati dalla Giunta regionale.

Infine alle terme pubbliche non partecipate dalla Regione sono destinati 2 milioni di euro<sup>10</sup>.

Il programma prevede un contributo dei soggetti attuatori pari al finanziamento regionale, per cui il quadro finanziario previsionale ammonta almeno a 26 milioni di euro.

Nell'ambito del programma, la Regione ha impegnato 10 milioni di euro e pagato 7,8 milioni.

In particolare, sono stati sottoscritti gli aumenti di capitale delle società: Terme di Chianciano

<sup>10</sup> Le risorse previste dal Programma straordinario degli investimenti (1 milione), sono state incrementate a settembre 2008 di un ulteriore milione con risorse regionali previste dal PRSE.

Immobiliare SpA (3,5 milioni, nel 2005 e nel 2007), Terme di Montecatini Immobiliare SpA (2,5 milioni, nel 2006), Terme di Casciana SpA; gli importi sono stati interamente pagati.

Riguardo allo stabilimento termale di San Giuliano Terme, per interventi di restauro e riqualificazione, la Regione ha impegnato 1 milione (e pagato 800 mila euro) a favore del Comune di San Giuliano proprietario dell'immobile.

Risultano definiti 13 progetti, per un investimento totale 18,1 milioni di euro: 4 a Chianciano Terme, 4 a Montecatini, 2 a San Giuliano e 3 a Casciana; 4 progetti sono conclusi, 6 sono in fase di realizzazione, gli altri in progettazione. I soggetti attuatori hanno impegnato 18,1 milioni e pagato 12,2 milioni.

Riguardo alle terme pubbliche non partecipate dalla Regione, a dicembre 2007 è stato emanato un bando per il finanziamento di progetti di ristrutturazione, ampliamento e realizzazione di stabilimenti termali e loro strutture ricettive o di altre infrastrutture turistiche, ricreative o sportive collegate a stabilimenti termali. A ottobre 2008 è stata approvata la graduatoria: sono stati ammessi 5 progetti, per un investimento complessivo previsto di 6,4 milioni di euro; le risorse regionali (2 milioni) sono state interamente impegnate.

## **2.11 Infrastrutture turistiche (2006)**

Con la legge finanziaria per il 2006 sono stati stanziati 4 milioni di euro per infrastrutture turistiche. A novembre 2007 la Giunta regionale ha approvato, nell'ambito dell'Azione 4.2.2. "Infrastrutture per il turismo" del PRSE 2007/2010, un piano di investimenti per la dotazione delle aree sciistiche della Toscana di reti per l'innevamento artificiale, finanziandolo con 1,5 milioni di euro. Le risorse potranno essere utilizzate per l'acquisizione di impianti per l'innevamento artificiale o per la realizzazione di reti di adduzione o depositi idrici finalizzati alla creazione di neve artificiale; i soggetti attuatori degli interventi sono gli enti locali delle aree sciistiche, e saranno finanziati progetti dal costo di almeno 500 mila euro fino al 50% del costo ammissibile; possono essere finanziati interventi iniziati dopo il 30 giugno 2007.

A dicembre 2007 è stato emanato il bando per la presentazione dei progetti; a settembre 2008 è stata individuata un'unica operazione ammissibile ("Innevamento programmato del comprensorio dell'Appennino Pistoiese") e l'intero finanziamento regionale è stato impegnato.

## **2.12 Offerta commerciale (2005 e sgg.)**

Il programma è finanziato dalla legge finanziaria regionale 2005 con 2 milioni di euro (riprogrammati dal Consiglio regionale con Delibera n. 88 del settembre 2005) e dalla legge finanziaria regionale 2006 con 3 milioni di euro.

A maggio 2006, nell'ambito dell'azione B.2 del PRSE, è stato emanato un bando per il finanziamento di progetti di infrastrutture e reti locali, anche immateriali, per il commercio. Il bando, che modifica il precedente bando dell'ottobre 2004, concede finanziamenti in quota del 60%, ed opera fino a concorrenza delle risorse disponibili con graduatorie semestrali; la presentazione dei progetti è avvenuta a partire dal secondo semestre 2006.

Ad aprile 2007 è stata approvata una prima graduatoria semestrale: l'investimento complessivo previsto ammonta a 9,3 milioni di euro.

La Regione ha impegnato l'intero importo e trasferito tali risorse a Fidi Toscana attraverso cui sono gestite le assegnazioni.

### **2.13 Agricoltura – Pretrattamento carcasse animali (2006)**

La legge finanziaria regionale per il 2006 ha stanziato 2 milioni di euro per la realizzazione di un impianto volto al pretrattamento delle carcasse degli animali morti nelle aziende zootecniche. La realizzazione dell'impianto deriva dalla necessità di costituire un sistema regionale di smaltimento, basato sulla realizzazione di una rete di raccolta delle carcasse e dei sottoprodotti di origine animale attraverso specifici cassoni refrigerati scarrabili (container) e sulla costruzione dell'impianto di termodistruzione degli animali realizzato in un'area territorialmente baricentrica, capace di soddisfare le necessità degli allevatori e dei trasformatori regionali nonché di quelli delle Regioni limitrofe.

Sono stati effettuati una serie di incontri con enti locali che potrebbero essere interessati a realizzare nel proprio territorio la struttura, e con alcune ditte che hanno la tecnologia idonea per la realizzazione industriale. Sono inoltre proseguite le analisi dei quantitativi di materiali che potrebbero essere trasportati verso l'impianto di termodistruzione, nonché il numero e la dislocazione dei container nel territorio regionale.

A causa delle difficoltà incontrate per la localizzazione del sito che potrebbe ospitare l'impianto, nel corso del 2008 non sembra ipotizzabile l'impegno delle risorse disponibili; in ogni caso entro il 2009 verranno definite le modalità per attrezzare almeno i container per i materiali a rischio.

### **2.14 Agricoltura – Energia per le aree rurali (2006)**

La legge finanziaria 2006, tra gli interventi a favore dell'agricoltura, ha stanziato 4 milioni di euro per la produzione di energia per le aree rurali. Il programma è stato approvato dal Consiglio regionale nel novembre 2006 (Delibera del Consiglio regionale n. 119 del 14 novembre 2006: "Programma degli investimenti sulla produzione di energia per le aree rurali."), e prevede il finanziamento di impianti termici di teleriscaldamento e/o cogenerazione di piccola e media scala che utilizzino biomasse agroforestali. Gli impianti di teleriscaldamento dovranno fornire energia ad abitazioni delle popolazioni rurali, a strutture pubbliche destinate a servizi pubblici collettivi (uffici pubblici, scuole, asili, centri sociali, case di riposo, ospedali, palestre, piscine, etc.), a distretti con attività agricola ad alta esigenza termica (ad es. aree florovivaistiche); dovranno essere realizzati da enti pubblici territoriali e localizzati in centri abitati con popolazione non superiore a 15.000 abitanti.

I progetti saranno finanziati mediante contributo in conto capitale, fino al 50% della spesa ammissibile (a seconda delle tipologie) e ad un importo massimo di 400 mila euro.

Il bando per la presentazione dei progetti è stato pubblicato nel marzo 2007, e modificato nell'aprile successivo: alla data di scadenza (31 luglio 2007) sono stati presentati 48 progetti, sottoposti in seguito alla valutazione da parte di una commissione tecnico scientifica che ne ha determinato l'ammissibilità tecnica e ha stilato una graduatoria di merito. A novembre 2007 la graduatoria è stata approvata; contemporaneamente sono state trasferite le risorse ad ART€A per le procedure di competenza.

Con le risorse disponibili sono stati finanziati 20 progetti (uno di essi parzialmente), localizzati 5 in provincia di Firenze, 4 in ciascuna delle province di Lucca, Arezzo e Pistoia, 2 in provincia di Siena e 1 in provincia di Grosseto.

L'investimento complessivo previsto è di 8,7 milioni di euro; verranno realizzati impianti corrispondenti ad una potenza nominale complessiva installata di circa 11 MWt (11.340 kWt). Gli enti hanno presentato i progetti esecutivi i progetti dovranno essere realizzati entro il novembre 2009.

A ottobre 2008, sono state stanziati ulteriori risorse regionali pari a 4 milioni di euro (non rientranti nel programma straordinario), con cui è stato possibile lo scorrimento della graduatoria di merito e il finanziamento di altri 22 progetti<sup>11</sup>. Le risorse finanziarie sono state trasferite totalmente ad ART€A per le successive procedure amministrative.

## **2.15 Agricoltura – Riconversione strutture agroindustriali (2006)**

A seguito del trasferimento dallo Stato alla Regione di quattro centri di commercializzazione (Centro Carni di Chiusi, Centro per la commercializzazione dei fiori di Pescia, Impianto invecchiamento vini di Radda in Chianti, Centro Ortofrutticolo di Pisa) la legge finanziaria regionale per il 2006 ha stanziato 4 milioni di euro per la riconversione delle strutture.

In tale ambito, riguardo al Centro Carni di Chiusi è stato costituito un gruppo di lavoro che ha individuato un'area specifica della struttura da sottoporre a manutenzione straordinaria per garantire il servizio di macellazione al territorio della Provincia di Siena. Gli interventi necessari saranno attuati con le risorse regionali. Nel marzo 2007 è stato siglato un protocollo di intesa fra Regione Toscana, Provincia di Siena e Comune di Chiusi che prevede, tra l'altro, di emanare un bando per l'assegnazione ed il trasferimento delle strutture a soggetti pubblici o privati che garantiscano la piena utilizzazione di tutto il complesso secondo le esigenze dell'Amministrazione comunale, ponendo particolare attenzione ai livelli occupazionali con il recupero dei posti di lavoro perduti per l'abbandono dell'attività primaria.

In merito al Centro di Commercializzazione dei fiori dell'Italia Centrale (Comicent), sede del mercato dei fiori di Pescia (gestito da un consorzio in fase di liquidazione), si sta procedendo alla definizione di un'ipotesi progettuale per l'utilizzo polifunzionale dell'immobile con il coinvolgimento della Regione Toscana, del Comune di Pescia e della Provincia di Pistoia: si prevede di siglare un protocollo d'intesa con cui saranno definiti il ruolo di questi soggetti nella realizzazione del progetto e le modalità con cui sarà favorito il passaggio di proprietà agli enti locali nel rispetto del principio di sussidiarietà. Gli interventi che si renderanno necessari per il recupero dell'area e dell'immobile ai fini dello sviluppo della filiera floricola potranno essere sostenuti con risorse regionali da impegnarsi nel 2008.

Nel 2008 la Regione ha costituito un gruppo di lavoro interdirezionale, che ha avviato l'elaborazione di una proposta di legge per il trasferimento della proprietà dei Centri di Commercializzazione Agroalimentari ai rispettivi enti di competenza territoriale.

## **2.16 Invasi idrici multifunzionali (2005)**

A dicembre 2005 il Consiglio regionale ha approvato il Programma per la realizzazione di nuovi invasi idrici multifunzionali ed il recupero di quelli esistenti per il loro adeguamento multifunzionale (Delibera n. 133 del 21.12.2005: "Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 – Legge finanziaria per l'anno 2005. Programma per la realizzazione di nuovi invasi idrici multifunzionali ed il recupero degli esistenti per il loro adeguamento multifunzionale"), al quale è destinato lo stanziamento regionale di 19 milioni di euro disposto dalla legge finanziaria regionale per il 2005.

Il programma ha come priorità la valorizzazione delle risorse superficiali attraverso l'accumulo di invasi, al fine di fronteggiare la situazione di crisi a carico delle risorse idriche; si attua attraverso piani provinciali, in cui si identificano azioni sotto il profilo della multifunzionalità: irrigazione di soccorso, approvvigionamento idropotabile (in aree rurali), lotta agli incendi boschivi, laminazione delle piene.

<sup>11</sup> È stato inoltre completato il finanziamento del progetto a copertura parziale della prima graduatoria

Con l'approvazione del programma è stata stabilita la ripartizione delle risorse disponibili tra le Province (secondo parametri quali il rischio di incendi boschivi, la piovosità, i fabbisogni irrigui, ecc.), che su questa base hanno predisposto i rispettivi piani provinciali comprendenti l'elenco degli interventi, recepiti a maggio 2006 dalla Giunta regionale.

Il quadro finanziario del programma prevede investimenti per 21,6 milioni di euro, con 2,6 milioni di cofinanziamenti pubblici (perlopiù provinciali) che si aggiungono ai 19 milioni di risorse regionali.

I progetti definiti sono in totale 41. La provincia dove sono maggiormente localizzati gli investimenti è Pistoia (5 milioni di euro, con un cofinanziamento della Provincia per 2,3 milioni), seguita da Grosseto con 3 milioni. La Provincia di Prato ha rinunciato alla realizzazione di un intervento, le relative risorse sono confluite su un altro progetto della stessa Provincia.

La Regione ha effettuato impegni per 19 milioni di euro (di cui 5 milioni nel 2008) e pagamenti per 3,5 milioni (di cui 2,8 nel 2008); i soggetti attuatori hanno impegnato 8,4 milioni di euro e pagato 3,2 milioni. 11 interventi sono conclusi e 10 sono in fase di realizzazione (8 di questi con un avanzamento procedurale di oltre il 90%); 16 interventi sono in fase di progettazione, 2 in fase di aggiudicazione.

## **2.17 Rete di distribuzione dell'acqua di Montedoglio (2003)**

Il Programma, approvato nell'aprile 2003 (Delibera Consiglio regionale del 2.4.2003, n. 53: "Programma degli investimenti strategici della Regione: piano attuativo degli interventi relativi al completamento dell'invaso di Montedoglio"), prevede la realizzazione di ulteriori lotti della rete secondaria di distribuzione irrigua per l'utilizzo delle acque dell'invaso di Montedoglio. Le opere avranno ricadute positive sia sull'agricoltura sia sull'ambiente del territorio interessato dall'invaso (3.000 gli ettari di territorio agricolo interessati), garantendo l'approvvigionamento idrico senza impoverire le falde superficiali e sotterranee della Valdichiana.

Il piano finanziario complessivo prevede investimenti per 10,3 milioni di euro integralmente sostenuti dalla Regione.

Gli interventi sono due: uno è localizzato nella Val di Chiana a sud di Arezzo, il soggetto attuatore è la Provincia di Arezzo e l'investimento previsto è di 6,2 milioni di euro; l'altro è localizzato nella Valtiberina toscana, il soggetto attuatore è la Comunità montana della Valtiberina e l'investimento previsto di 4,1 milioni di euro.

La Regione ha impegnato l'intero finanziamento di 10,3 milioni di euro e pagato 8,4 milioni.

I soggetti attuatori hanno impegnato 10,3 milioni di euro (l'intero importo del programma), ed effettuato pagamenti per 6,1 milioni di euro.

L'intervento sulla rete secondaria di distribuzione irrigua della Valtiberina si è definitivamente concluso nel 2007; per quanto riguarda la rete secondaria di distribuzione irrigua della Valdichiana, i lavori sono iniziati a dicembre 2006 e sono realizzati per tre quarti.

## **2.18 Infrastrutture viarie (2001 e sgg.)**

Gli interventi sulla rete viaria regionale sono effettuati attraverso i programmi approvati con DCR n. 35 del 27/2/2002 ("Approvazione programma pluriennale investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2002-2007") e con DCR n. 126 del 19/1/2001 ("Approvazione del programma investimenti 2001 per gli interventi di adeguamento e di nuova costruzione della viabilità regionale"). In particolare, il programma 2002-2007 è stato

finanziato con risorse regionali nell'ambito del Programma straordinario degli investimenti. Fanno parte del programma gli interventi di messa in sicurezza e ammodernamento della SGC Firenze-Pisa-Livorno e la realizzazione della bretella autostradale Lastra a Signa-Prato.

La realizzazione delle opere è affidata alle Province, con le quali è stato messo a punto il programma e che contribuiscono alle stesse con risorse proprie.

Dopo l'approvazione iniziale, il Consiglio regionale ha più volte rimodulato i programmi per adeguarli al più preciso quadro finanziario e procedurale che è andato definendosi con l'avanzare delle progettazioni e delle realizzazioni, e per tenere conto delle modifiche del quadro normativo nazionale (e in particolare del Patto di stabilità interno introdotto dalla legge finanziaria nazionale per il 2005).

A novembre 2008 il Consiglio ha approvato le modifiche al programma conseguenti al monitoraggio del giugno precedente (DCR 88/2008). A dicembre 2008 è stata presentata una nuova proposta di rimodulazione.

Il quadro previsionale aggiornato del programma prevede investimenti complessivi per circa 1.180 milioni di euro, finanziati per 516,5 milioni con risorse dedicate del Programma straordinario degli investimenti, per circa 265 milioni con altre risorse gestite dalla Regione (fondi ex Bassanini e risorse CIPE – 135 milioni di euro – che cofinanziano alcuni interventi attraverso l'APQ sulle infrastrutture di trasporto), per 180 milioni da altre risorse pubbliche (perlopiù di enti locali); il programma è anche cofinanziato da risorse private per circa 220 milioni (quasi tutte destinate alla Bretella Lastra a Signa-Prato). Alcuni interventi previsti dall'APQ, per un investimento totale di oltre 54 milioni e con finanziamento CIPE pari a 41 milioni, non prevedono cofinanziamenti da parte della Regione.

Per i programmi 2001, 2002-2007 sulle risorse gestite dalla Regione si registrano impegni per 568,2 milioni di euro (pari al 73% delle risorse stanziato; di queste, 115 milioni sono stati impegnati nel 2008) e pagamenti per 334 milioni di euro (di cui circa 71 milioni pagati nel 2008).

Nel loro complesso i programmi 2001 e 2002-2007 comprendono 170 progetti definiti (considerando la bretella Lastra a Signa-Prato e gli interventi di risanamento acustico) per un costo complessivo di oltre 1.176 milioni di euro, finanziati per due terzi dalla Regione (776 milioni di euro). La provincia dove sono maggiormente concentrati gli investimenti è Firenze con 275 milioni di euro, seguita da Pisa con 143 milioni<sup>12</sup> e Arezzo (115 milioni).

- L'intervento più rilevante del programma è la bretella autostradale Lastra a Signa – Prato, con un investimento totale di 243 milioni di euro, finanziata con un contributo regionale di 28,9 milioni (interamente impegnato e liquidato nel 2006), e con risorse private di 214 milioni. A luglio 2006 è stata firmata la convenzione tra Regione e Società infrastrutture toscane SpA per la progettazione, realizzazione e gestione della Bretella; ad agosto 2007 è stata approvata la modifica del contratto di concessione di Project Financing. A gennaio 2009 la Giunta regionale, a conclusione della procedura di VIA regionale, ha emesso pronuncia favorevole di compatibilità ambientale.
- Numerosi interventi riguardano la SGC Fi-Pi-Li (18 progetti per un investimento totale di oltre 164 milioni di euro, di cui 159 milioni di risorse regionali); su tale arteria si segnala la conclusione nel 2008 di alcuni importanti interventi, per un importo oltre 20 milioni di euro: risanamento pavimentazione e installazione di barriere centrali e laterali nei tratti Firenze-Ginestra Fiorentina e Empoli Est-Empoli Ovest. In tutto sulla Fi-Pi-Li sono conclusi 9 interventi; sono in fase di realizzazione l'intervento sullo svincolo di Empoli Est, e quelli nel tratto pisano della SGC (miglioramento della sicurezza, adeguamento delle

---

<sup>12</sup> In queste due province ricadono la maggior parte degli interventi sulla SGC Fi-Pi-Li.

pavimentazioni e degli svincoli). I soggetti attuatori hanno impegnato 125 milioni e pagato oltre 36 milioni.

- Sulla viabilità regionale ordinaria sono definiti 151 interventi, per un investimento di 769 milioni di euro, di cui 590 di risorse regionali. Nel 2008 si segnala la conclusione del 1° lotto della viabilità di collegamento tra la variante Aurelia e il porto di Viareggio, la realizzazione di rotatorie sulla SRT 439 Sarzanese Valdera in provincia di Lucca e sulla SRT 325 Val di Setta-Val di Bisenzio in loc. Indicatore in provincia di Firenze.

Dall'inizio del programma, sulla viabilità regionale ordinaria, risultano conclusi in tutto 59 progetti per un investimento realizzato di oltre 83 milioni di euro.

54 progetti sono in fase di esecuzione lavori: tra questi si segnalano le varianti di Castelnuovo Garfagnana e di Santa Chiara sulla SRT 445, la Bretella del cuoio (collegamento del comprensorio del cuoio con la SGC Fi-Pi-Li), vari interventi sulla SRT 325 Val di Setta e Val di Bisenzio (adeguamento del tratto Prato – Vaiano), sulla SRT 71 (varianti di Bibbiena e di Camucia), sulla SRT 439 Sarzanese Valdera (variante di Ponsacco e ponte sull'Arno in loc. Ponte alla Navetta), sulla nuova viabilità Mezzana-Perfetti Ricasoli (lotto 5, cofinanziato dal Cipe).

I soggetti attuatori hanno effettuato impegni per 301 milioni di euro (di cui 59 milioni nel 2008) e pagamenti per oltre 132 milioni (di cui 49 milioni nel 2008).

## **2.19 Mobilità – treni (2005)**

Con la legge finanziaria regionale per il 2005, la Regione ha stanziato per 45 milioni di euro (15 milioni per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007) per l'acquisto di materiale rotabile da utilizzare in Toscana per l'esercizio dei servizi ferroviari regionali in gestione di TrenItalia.

Una parte delle risorse (9,5 milioni per l'annualità 2005 e 5,2 milioni per l'annualità 2006) è stata utilizzata per finanziare il programma di rinnovo del materiale rotabile 2004-2006 approvato dal Consiglio regionale nel luglio 2004, che prevede un investimento complessivo di 77 milioni di euro; nel programma sono confluite ulteriori risorse regionali per 1,5 milioni di euro, e cofinanziamenti di Trenitalia pari a 60,8 milioni di euro.

A luglio 2006 il Consiglio regionale (Delibera n. 68 del 5/7/2006: "Programma di investimenti per il rinnovo del materiale rotabile per l'esercizio dei servizi ferroviari regionali in gestione a TrenItalia s.p.a. - periodo 2006-2008") ha approvato il nuovo programma per il 2006-2008, destinando ad esso gli ulteriori 30,3 milioni di euro previsti dalla Finanziaria regionale 2005. Il programma prevede l'acquisto di 6 convogli composti da una vettura semipilota e 5 carrozze a doppio piano, e di 10 convogli composti da 1 locoleggera E464, 1 vettura semipilota e 6 carrozze monopiano. Il tutto per un investimento totale di 130,6 milioni di euro.

Complessivamente i due programmi prevedono un investimento di 207,6 milioni di euro, di cui 46,5 milioni finanziati dalla Regione (45 milioni dei quali nell'ambito del Programma straordinario degli investimenti) e 161,1 milioni da TrenItalia.

Nel 2008 si è concluso il programma 2004-2006, attraverso il quale sono state acquistate 10 locoleggere E464, di 11 treni Minuetto diesel e 5 treni Minuetto elettrici. La Regione ha interamente impegnato le risorse previste pari a 16,2 milioni di euro (pressoché interamente pagate); Trenitalia ha impegnato e pagato l'intero importo del programma (77 milioni di euro).

Riguardo al programma 2006-2008, sono stati acquistati i 6 convogli a doppio piano previsti (entrati in servizio a partire da marzo 2007). Il programma è stato rimodulato nel luglio 2007 con la previsione di acquisto di altri 4 convogli a doppio piano e 4 locoleggere E464; queste

ultime sono state acquistate nel 2008. Con un'ulteriore parziale rimodulazione, a novembre 2008 è stato previsto l'acquisto di ulteriori 6 locoleggere E464. Per il programma 2006-2008 la Regione ha impegnato 20,3 milioni di euro e pagato quasi 17 milioni.

## **2.20 Mobilità - Piani urbani della mobilità (2005 e sgg.)**

La legge finanziaria regionale per il 2005 ha stanziato 39 milioni di euro (13 milioni per ogni annualità 2005-2007) per interventi sulla mobilità urbana, nell'ambito del Programma straordinario degli investimenti.

Nel luglio 2005 il programma è stato approvato dal Consiglio regionale (Delibera n. 61 del 5 luglio 2005: "Attuazione del piano regionale della mobilità e della logistica. Programma pluriennale degli investimenti. Interventi relativi ai piani urbani della mobilità.").

In coerenza con le priorità indicate dal Piano regionale della mobilità e della logistica, il programma è articolato in due filoni:

- sostegno alla tramvia dell'area fiorentina (31,2 milioni di euro), destinati al Comune di Firenze;
- interventi di infrastrutture sulle reti di TPL dei sistemi metropolitani e urbani che garantiscano collegamenti tra parcheggi di interscambio, stazioni ferroviarie, centri urbani o poli attrattori di traffico e mobilità (7,8 milioni di euro).

Riguardo alla tramvia di Firenze, il cui intervento è in corso e prevede un investimento complessivo di 226 milioni di euro, la Regione ha impegnato a favore del Comune di Firenze l'intero importo del finanziamento di 31,2 milioni <sup>13</sup>, e pagato oltre 29 milioni. Il Comune di Firenze ha impegnato per l'intero importo dell'intervento e pagato oltre 80 milioni di euro.

Riguardo agli investimenti sulle reti TPL sono stati finanziati 9 progetti dei seguenti Comuni: Arezzo (Sistema integrato mobilità per accesso alla città), Viareggio (Linea alta mobilità della Versilia), Pisa (Linee alta mobilità), Pontedera (Parcheggio Stazione FS), Pistoia (Parcheggio scambiatore), Pescia (Area Stazione FS), Prato (Linee alta mobilità), Siena (Scala mobile di collegamento Stazione FS-centro storico), Empoli (Interscambio Stazione FS). I progetti dei Comuni di Prato e di Pontedera sono terminati, tutti gli altri hanno presentato i progetti definiti entro i termini stabiliti (dicembre 2006). L'investimento complessivo previsto è di quasi 19 milioni di euro. La Regione ha impegnato 4,5 milioni di euro e pagato 3,7 milioni. I soggetti attuatori hanno assunto impegni per 7,5 milioni ed effettuato pagamenti per 3,6 milioni.

Per la prosecuzione del programma, la legge finanziaria regionale per il 2006 (L.R. 70/2005) ha stanziato 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2007 e 2008. A novembre 2008 la Regione ha impegnato 1,5 milioni per il progetto di integrazione modale nella stazione di Montevarchi, il cui investimento previsto è di 7,4 milioni. Le restanti risorse, 8,5 milioni, sono state stanziare sull'annualità 2009 del bilancio regionale; con queste risorse saranno finanziati: -interventi di sostegno a reti di TPL e in grado di garantire l'interscambio mezzo pubblico/treno e mezzo privato/treno con i servizi ferroviari strutturati nel progetto Memorario; -interventi di recupero dei nodi di interscambio con il servizio ferroviario regionale; - il completamento di interventi già finanziati nell'ambito dei PUM. A dicembre 2008 è stato emanato il bando per l'individuazione degli interventi.

---

<sup>13</sup> Le risorse previste per l'annualità 2007 sono state trasferite dal Programma straordinario degli investimenti alle risorse regionali previste per il cofinanziamento degli interventi UE 2007-2013.

## **2.21 Mobilità – porti (2005)**

La prosecuzione per il 2005-2007 del Programma straordinario degli investimenti prevede un investimento regionale di 14 milioni di euro nel triennio (5 milioni per ciascuno degli anni 2005 e 2006, 4 milioni per il 2007), destinato ad integrare i programmi di investimento dei porti regionali di Viareggio, Campo nell'Elba e Monte Argentario.

Sulla base dei piani d'intervento predisposti dai Comuni le risorse sono state ripartite annualmente tra i tre porti regionali, assegnando complessivamente a Viareggio 9,9 milioni, a Monte Argentario 1,9 milioni e a Campo nell'Elba 2,1 milioni. Le Regione ha interamente impegnato le risorse stanziare e pagato 4,8 milioni.

## **2.22 Miglioramento della qualità urbana della città di Firenze (2003)**

Il Programma, approvato nel maggio 2003 (Delibera Consiglio regionale del 7 maggio 2003 n. 88: "Programma degli investimenti strategici della Regione. Piano attuativo degli interventi per il miglioramento della qualità urbana della città di Firenze per gli anni 2003-2005"), sostiene i progetti per la mobilità e per l'ambiente nel comune di Firenze.

Il programma è stato rimodulato dal Consiglio regionale nel 2005 su richiesta del Comune di Firenze, e attualmente comprende interventi relativi alla riqualificazione e valorizzazione del Parco delle Cascine e alla mobilità (nuova viabilità fra Viale XI Agosto e Via dell'Olmattello e nuova strada Porta al Prato – Via Pistoiese). Il quadro finanziario previsionale del programma (asestato nel 2006 con la precisazione dei costi del progetto della nuova strada Porta al Prato – Via Pistoiese) prevede investimenti per 33,8 milioni di euro, di cui 10,3 milioni di risorse regionali, 21 milioni del Comune di Firenze e 2,5 milioni di privati.

I progetti definiti sono in tutto 11. La Regione ha impegnato 10,3 milioni di euro (l'intero stanziamento regionale) e pagato 5,4 milioni (di cui 1,4 milioni nel 2008). Il Comune di Firenze ha impegnato finora 10,3 milioni e pagato 5,5 milioni.

Per quanto riguarda l'avanzamento degli interventi relativi al Parco delle Cascine, 6 sono conclusi, 2 sono in fase di esecuzione lavori (conclusione prevista nel 2009).

Riguardo agli interventi sulla mobilità:

- è stato completato ed è in funzione dall'inizio di agosto 2008 il sottopasso di collegamento Viale XI Agosto-Olmattello (investimento totale di oltre 2 milioni di euro, di cui l'80% finanziato dalla Regione);

- è in corso di progettazione la nuova strada Porta al Prato – via Pistoiese (costo previsto 26,7 milioni di euro, di cui 4 milioni di risorse regionali, 20,2 milioni del Comune di Firenze e 2,5 milioni di privati); a luglio, la giunta comunale di Firenze ha adottato la variante urbanistica relativa ad alcune aree interessate dal progetto dell'opera; l'inizio dei lavori è previsto nel 2009.

Già concluso da tempo l'ultimo progetto previsto dal programma riguardante lo studio sul servizio merci intermodale.

## **2.23 Difesa dall'erosione della costa (2003)**

Il programma, approvato nel marzo 2003 (Delibera Consiglio regionale dell'11.3.2003, n. 47: "Programma straordinario degli investimenti strategici della Regione Toscana. Attuazione degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale e delle attività di formazione del Piano di gestione integrata della costa"), intende realizzare interventi di ripascimento delle

spiagge basse, il ripristino delle dune, la creazione o la risistemazione di opere di difesa degli abitati, la qualificazione ambientale e turistica; il programma prevede anche azioni di sistema.

Il quadro finanziario attuale individua investimenti per oltre 111 milioni di euro, finanziati dalla Regione per 109,6 milioni di euro con risorse stanziare quasi esclusivamente nell'ambito del Programma straordinario degli investimenti.

Ad oggi risultano definiti 33 progetti per 107,6 milioni di euro:

- 10 progetti (per 9,6 milioni di euro) riguardano le azioni di sistema (indagini, ricerche, monitoraggi, etc.);
- 23 progetti (98 milioni di euro) riguardano interventi sulla costa, così suddivisi: 9 a Livorno (18,6 milioni di euro), 7 a Grosseto (18,6 milioni di euro), 4 a Pisa (16 milioni di euro), 2 a Massa Carrara (41,5 milioni di euro) e infine 1 a Lucca (3,3 milioni di euro). I progetti sono gestiti per la maggior parte dalle Province.

Da parte della Regione sono stati assunti impegni per oltre 49 milioni di euro (di cui 28,6 nel 2008) e pagamenti per 16,4 milioni di euro.

Due azioni di sistema sono concluse.

L'intervento sulla Spiaggia di Cavo all'Elba si è concluso; sono in fase di realizzazione gli interventi nei tratti costieri "Torrente Parmignola - Marina di Carrara" (di cui si è concluso il primo lotto) e "Bocca d'Arno - Marina di Pisa".

Entro il primo semestre 2009 è previsto l'avvio dei lavori per 5 interventi (per un investimento previsto di circa 32 milioni): -"Porto di Carrara - fiume Versilia", primo lotto, attualmente in fase di aggiudicazione lavori per il quale la Regione ha impegnato 19,8 milioni di euro; -"Porto di Viareggio - fiume Serchio"; -"Golfo di Baratti"; -"Foce fiume Ombrone", per il quale è stato sottoscritto a ottobre 2008 un Accordo di programma per un investimento complessivo di 5,6 milioni di euro; -secondo lotto dell'intervento "Torrente Parmignola - Marina di Carrara".

## **2.24 Superamento delle situazioni di crisi idrica e tutela delle risorse idriche (2004 e sgg.)**

Il Programma è stato attivato con la legge finanziaria regionale per il 2004. Il Consiglio regionale nell'aprile 2004 (Delibera del 22 aprile 2004, n. 41: "Piano regionale di azione ambientale 2004-2006. Indirizzi e primo stralcio delle azioni per le zone di criticità ambientali") ha approvato il programma e individuato un primo filone di interventi riguardanti la risoluzione delle carenze idropotabili. Il Consiglio regionale ha poi individuato nel gennaio 2005 (Delibera del 25 gennaio 2005, n. 5: "Programma degli interventi per il superamento delle situazioni di crisi idrica e per la tutela delle risorse idriche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004).") un secondo filone di interventi relativi alla prevenzione dell'inquinamento delle acque e alla tutela dell'assetto idrogeologico.

### Risoluzione delle più critiche situazioni di carenza idrica a scopo idropotabile

Per questo filone nel 2004 il Consiglio regionale ha approvato i criteri generali di indirizzo e definito il quadro generale degli interventi, sulla cui base la Giunta individuato i progetti ammessi al finanziamento; la realizzazione degli interventi è coordinata dalle Autorità di ambito (AATO risorse idriche).

Il quadro degli interventi è stato aggiornato (ad aprile 2006 e a novembre 2008) ammettendo a finanziamento progetti ritenuti prioritari dalle AATO ed eliminandone altri.

Il quadro finanziario aggiornato prevede un investimento complessivo di quasi 128 milioni di euro, di cui 32 milioni di finanziamento regionale, mentre le restanti risorse sono a carico dei soggetti attuatori. Le risorse regionali sono state interamente impegnate, con pagamenti per 23 milioni di euro (di cui 3,3 milioni nel 2008).

I progetti definiti sono 336. Per quanto riguarda l'avanzamento procedurale, risultano terminati 185 progetti, altri 34 risultano in corso di esecuzione; i soggetti attuatori hanno impegnato quasi 98 milioni di euro, con pagamenti per oltre 83 milioni.

#### Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento delle acque e alla tutela dell'assetto idrogeologico

Il programma di questo filone, approvato nel gennaio 2005 dal Consiglio regionale, prevede un finanziamento regionale di 58 milioni del Programma straordinario; a queste si aggiungono le risorse del Ministero dell'Ambiente che vengono trasferite alla Regione (al momento pari a 9 milioni), ulteriori risorse regionali e cofinanziamenti a carico di AATO, enti locali, privati. Gli interventi previsti dal programma sono realizzati previa stipula di Accordi programma tra la Regione, il Ministero dell'Ambiente e/o i soggetti locali coinvolti <sup>14</sup>.

Due Accordi sono stati firmati nel luglio 2004 (Adeguamento dei depuratori del distretto tessile pratese e la realizzazione dello schema idrico duale per il riutilizzo delle acque reflue di Prato e Pistoia; Riorganizzazione e adeguamento della depurazione industriale del comprensorio del cuoio).

A gennaio e a marzo 2006 sono stati firmati quattro ulteriori Accordi e rimodulati i piani finanziari dei due firmati nel 2004 <sup>15</sup>. Ad aprile 2008 l'accordo di programma riguardante il comprensorio del cuoio è stato rimodulato per tenere conto di problematiche emerse durante la fase di definizione dei progetti: è stato previsto un investimento aggiuntivo di 8 milioni di euro, finanziato per 6 milioni con risorse regionali.

Il quadro aggiornato vede pertanto 6 Accordi: Tutela delle risorse idriche del distretto tessile (investimento complessivo 40,3 milioni di euro di cui 10 a carico della Regione), del distretto conciario (investimento complessivo 145,9 milioni di euro di cui 34 a carico della Regione), e del distretto cartario (investimento complessivo 66,6 milioni di euro di cui 10 a carico della Regione); Riutilizzo acque reflue dell'entroterra versiliese a fini irrigui (investimento complessivo 14 milioni di euro di cui 2,5 a carico della Regione); Tutela del lago di Massaciuccoli e bonifica delle Carbonaie (investimento complessivo 20,5 milioni di euro di cui 2,5 a carico della Regione); Tutela dell'invaso di Bilancino attraverso la sistemazione idraulico-forestale (investimento complessivo 3,1 milioni di cui 1 a carico della Regione).

L'investimento complessivo previsto dagli Accordi è di 290,4 milioni di euro.

Nel 2008 la Giunta regionale ha avviato le procedure per erogare i finanziamenti regionali previsti per gli Accordi riguardanti l'entroterra versiliese, il lago di Massaciuccoli <sup>16</sup> e il distretto cartario (in tutto 15 milioni sull'annualità 2008); a maggio 2008 è stata trasferita una parte delle risorse statali, che hanno consentito di definire l'avvio degli interventi.

L'accordo sul tessile pratese è in fase di attuazione: i soggetti attuatori hanno impegnato 17 milioni e pagato 8,6 milioni; l'accordo è articolato in vari progetti (acquedotti industriali di Montemurlo e Campi Bisenzio, post trattamento per riutilizzo delle acque, fitodepurazione)

---

<sup>14</sup> Con la firma degli Accordi vengono di norma adeguati i piani finanziari previsti nel programma approvato dal Consiglio.

<sup>15</sup> A gennaio 2006 sono stati firmati, oltre a quelli elencati, anche due ulteriori accordi ("Tutela del lago di Burano" e "Aumento delle risorse idropotabili e miglioramento del sistema depurativo della Valdicecina"), che non rientrano nell'ambito del Programma straordinario degli investimenti e non prevedono finanziamenti regionali

<sup>16</sup> relativamente ai due accordi sono stati individuati 8 interventi, 6 dei quali hanno concluso la progettazione, mentre gli altri 2 sono in fase di redazione

alcuni dei quali sono conclusi, altri in fase di realizzazione o di progettazione.

Per quanto riguarda l'accordo relativo al lago di Bilancino, la Regione ha impegnato 1 milione per il finanziamento di due stralci dell'intervento complessivo "Sistemazione idraulico forestale a monte dell'invaso di Bilancino".

Per questo filone la Regione ha impegnato 70,5 milioni di euro (di cui 51,5 milioni nel 2008) ed effettuato pagamenti per 9 milioni di euro (di cui 5 milioni nel 2008).

#### Programma 2006-2008

La legge finanziaria regionale per il 2006 ha stanziato ulteriori 14 milioni di euro per gli interventi sulle risorse idriche (1 milione per il 2006, 6 milioni per il 2007 e 7 milioni per il 2008).

Nel 2006 il Consiglio regionale, come primo stralcio del programma, ha deciso il finanziamento di un dissalatore sull'isola di Giannutri, per il quale a novembre 2006 è stato sottoscritto un accordo di programma tra Regione, AATO 6 e Comune di Isola del Giglio: l'opera sarà finanziata esclusivamente con risorse regionali pari a 600 mila euro, interamente impegnati (332 mila euro pagati). A novembre 2007 il progetto è stato inserito tra gli interventi urgenti previsti dall'ordinanza n. 3598/2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri per cui è possibile l'applicazione di procedure acceleratorie e derogatorie.

A giugno 2007 il Consiglio regionale (Delibera n. 63 del 13 giugno 2007: "Programma pluriennale degli investimenti per il superamento delle situazioni di crisi idrica e per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche di cui all'articolo 38 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006). Destinazione del finanziamento.") ha approvato il programma per l'utilizzazione delle restanti risorse (13,4 milioni di euro), che prevede tre linee d'intervento:

a) miglioramento del sistema di approvvigionamento idrico dall'invaso di Montedoglio per usi idropotabili nell'Alto Valdarno, nel senese e nel grossetano (10 milioni di euro); beneficiari dei finanziamenti sono le AATO 4 e 6, gli interventi da eseguire saranno individuati con uno specifico Accordo di programma;

b) miglioramento della qualità dell'acqua erogata, attraverso l'eliminazione del superamento dei parametri di cui al D.lgs. 31/2001 per i quali la Regione ha richiesto la deroga ministeriale (2,8 milioni di euro, ripartiti tra le AATO da 2 a 6);

c) realizzazione di punti di approvvigionamento pubblici di acqua di qualità (600 mila euro, ripartiti uniformemente tra i sei ATO).

Il programma stabilisce che i finanziamenti regionali coprano al massimo il 33% del costo degli interventi.

A novembre 2008 sono stati individuati gli interventi relativi alla linea b). Per quanto riguarda la linea c) è stato stabilito che gli AATO presentino un programma di interventi.

A dicembre 2008 è stato firmato l'accordo di programma (tra Regione Toscana, AATO 4 e 6, Autorità di Bacino del Fiume Arno) sul sistema di approvvigionamento dell'invaso di Montedoglio; l'accordo prevede diversi interventi (impianto di potabilizzazione, condotte di collegamento, sistemi di adduzione) per un investimento complessivo di 81,5 milioni di euro.

A dicembre 2008 la Regione ha impegnato le risorse relative alle linee b) e c) pari a 3,4 milioni ed effettuato pagamenti per 2,8 milioni.

## **2.25 Valorizzazione ambientale territorio toscano (2006)**

La legge finanziaria 2006 ha stanziato 15 milioni di euro (2 milioni nel 2006, 5 milioni nel 2007 e 8 milioni nel 2008) per interventi di valorizzazione ambientale del territorio toscano,

ovvero interventi innovativi finalizzati anche alla diminuzione dell'inquinamento dell'aria e del suolo. Dall'esame dei dati ambientali la sofferenza maggiore si è delineata nella piana fiorentina (con il frequente superamento dei limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento atmosferico ed in particolare delle PM10), nella quale esiste anche la necessità di realizzare sistemi di trattamento rifiuti ben dimensionati al fine di soddisfare l'autosufficienza. A tali fini il Presidente della Giunta Regionale ha attivato, dal novembre 2005, un tavolo di lavoro finalizzato al raggiungimento di un'intesa strategica, aperto agli Enti locali interessati, alle Comunità di ATO ed alle aziende di servizio. Nel corso di tutto il 2006 sono stati effettuati una serie di incontri che hanno portato a dicembre 2006 alla sottoscrizione del preliminare d'intesa; il 31/01/2007 è stato infine firmato il protocollo d'intesa.

A seguito della firma dell'accordo, a luglio 2007 il Consiglio regionale ha approvato il programma di interventi (Delibera n. 91 del 25 luglio 2007: "Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70, art. 39. Programma finanziario degli interventi per la valorizzazione ambientale."), che saranno articolati su tre filoni: implementazione della raccolta differenziata, del recupero e del riciclo dei rifiuti (8 milioni di euro); miglioramento della qualità dell'aria attraverso il controllo delle emissioni dei veicoli e degli edifici (4 milioni); incentivazione alle forme di mobilità dolce, incluse le ciclovie (3 milioni).

Per i filoni riguardanti il miglioramento della qualità dell'aria e l'incentivazione delle forme di mobilità dolce, a ottobre 2007 la Giunta ha adottato la delibera di attuazione (Delibera n. 714 del 15 ottobre 2007: "Criteri per la ripartizione dei fondi di cui alla DCRT 91/2007 relativi agli interventi per ridurre emissione gas serra e percentuale della popolazione esposta all'inquinamento atmosferico"): le risorse sono destinate ai comuni della piana fiorentina, per il 30% in ugual misura e per il restante 70% in proporzione alla popolazione residente e alle autovetture circolanti. I comuni firmatari devono presentare propri Piani di azione comunale (PAC) come condizione per l'erogazione del primo 20% delle risorse; le erogazioni successive saranno condizionate alla presentazione dei progetti previsti dai PAC e ai loro stati di avanzamento.

A dicembre 2007 le risorse sono state ripartite tra i comuni secondo quanto previsto dalla delibera e interamente impegnate; poiché i comuni beneficiari avevano presentato i PAC nei termini previsti dalla delibera, è stato contestualmente liquidato il primo 20% delle risorse, pari a 1,4 milioni.

Alla fine di giugno 2008 i Comuni interessati hanno presentato in tutto 47 progetti, che coprono l'intero finanziamento assegnato (in alcuni è previsto un cofinanziamento da parte del Comune); i progetti, verificati dalla Regione, sono in fase di avvio.

Per il filone relativo alla raccolta differenziata, a febbraio 2008 la Giunta ha adottato la delibera con la quale sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse (Delibera n. 126 del 25/02/2008: "Criteri per la ripartizione dei fondi di cui alla DCRT 91/2007 relativi agli interventi per l'incremento della raccolta differenziata"), destinate ad interventi finalizzati all'incremento della raccolta differenziata in conformità agli obiettivi definiti nel PRS. Le risorse sono ripartite nel territorio della piana in relazione alla popolazione servita secondo le seguenti percentuali: Comunità di Ambito 6 Area Metropolitana Fiorentina (50%), Comunità di Ambito 5 Pistoia (30%), Comunità di Ambito 10 Prato (20%).

Gli interventi devono essere individuati tramite apposito bando; al fine di dare avvio al processo di integrazione degli ATO 5, 6 e 10, come previsto dalla L.R. 61/07, a settembre 2008 è stato emanato un unico bando, destinato ai soggetti gestori del servizio degli ATO 5, 6 e 10.

A dicembre 2008, dopo la costituzione formale dell'ATO Toscana Centro, la Regione ha

impegnato a favore di quest'ultimo le risorse previste (8 milioni).

La Comunità di Ambito Toscana Centro ha effettuato l'istruttoria delle domande pervenute, ed è in fase di approvazione della graduatoria definitiva.

## **2.26 e-Toscana (2003 e sgg.)**

Il programma iniziale, approvato nel febbraio 2003 (Delibera Consiglio regionale del 12/2/2003, n. 20: "Programma straordinario pluriennale degli investimenti strategici 2003-2005. Approvazione del progetto 'e-Toscana'"), prevede una serie di progetti per lo sviluppo della società regionale dell'informazione e l'e-government, finalizzati a potenziare la rete e le infrastrutture, migliorare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, semplificare i rapporti con i cittadini e le imprese.

Il programma si articola in tre filoni di intervento: Linea 1 - Pubblica amministrazione e imprese, Linea 2 - Associazioni di categoria e libere professioni, Linea 3 - Famiglie e cittadini.

Il quadro finanziario aggiornato prevede un investimento complessivo per le tre linee di 86 milioni di euro: 25,8 milioni di risorse regionali nell'ambito del Programma straordinario 2003-2005, 30,1 di cofinanziamenti degli enti locali e dei privati che concorrono ai progetti, 30,1 milioni di altri finanziamenti regionali, statali e comunitari.

### Linea 1

Comprende interventi per l'innovazione tecnologica della pubblica amministrazione toscana: potenziamento delle infrastrutture della Rete telematica, messa in rete di istituzioni e centri di servizio; ad oggi sono definiti 20 progetti, di cui 12 gestiti direttamente dalla Regione e 8 gestiti da altri soggetti (per la maggior parte Comuni); l'investimento complessivo è di 61,5 milioni di euro (cui si aggiungono 3,8 milioni di euro di azioni di supporto e sostegno al programma per un totale di 65,3 milioni).

Le risorse impegnate dalla Regione sono pari a 42,2 milioni di euro (di cui 3,8 milioni per le azioni di sostegno), con pagamenti per 41,7 milioni.

I progetti di Linea 1 sono tutti realizzati.

### Linea 2

Comprende progetti per favorire l'ingresso nella rete delle imprese e dei professionisti e la conseguente integrazione pubblico-privato, semplificando il rapporto e contribuendo al miglioramento dell'efficienza del sistema.

Sono stati emanati due bandi in seguito ai quali sono stati finanziati due pacchetti di progetti:

- bando 2003: comprende 20 progetti (individuati nel maggio 2004), per un investimento complessivo è di 5,7 milioni di euro (comprese le attività di supporto al programma per 0,2 milioni di euro), di cui 2,8 milioni di risorse regionali (interamente impegnate e pagate); tutti i progetti sono conclusi;

- bando 2004: comprende 22 progetti (individuati nel luglio 2005), con un investimento complessivo di 4,4 milioni di euro (comprese le attività di supporto al programma per 0,2 milioni di euro), di cui 2,3 di risorse regionali; i progetti sono realizzati dagli enti locali in partnership con associazioni di categoria e delle libere professioni; la Regione ha impegnato tutte le risorse stanziare, e pagato 1,4 milioni; 13 progetti sono conclusi, gli altri in fase di conclusione.

Per i due bandi nel loro complesso i soggetti attuatori hanno impegnato 9 milioni di euro e pagato 6,8 milioni.

### Linea 3

E' rivolta al sostegno della domanda di informazione, alla rimozione del digital divide, al rafforzamento e alla diffusione delle opportunità di partecipazione e di accesso per tutti nella società regionale dell'informazione e della conoscenza; prevede tre tipi d'intervento, per un investimento complessivo di 10,5 milioni di euro.

- Creazione dei PAAS (punti di accesso assistiti ai servizi telematici e a Internet distribuiti sul territorio regionale), destinati a facilitare l'inserimento in rete dei cittadini fornendo loro gli strumenti e l'assistenza necessaria attraverso la creazione punti di accesso assistiti; al progetto hanno aderito 192 Comuni (67% dei Comuni toscani); il progetto è concluso con l'apertura di 298 PAAS. La Regione ha finanziato il progetto con 5,2 milioni di euro, l'investimento realizzato è di 8,2 milioni. Le risorse regionali sono state interamente impegnate e pagate. A dicembre 2006, al fine di consolidare ed ampliare la Rete dei Paas, sono stati individuate nuove linee di intervento, finanziate dalla Regione per 1,1 milioni di euro nell'ambito della prosecuzione del programma e-Toscana (v. infra).
- Finanziamenti alle province per propri progetti anch'essi destinati a favorire l'accesso a famiglie e cittadini: sono stati finanziati 16 progetti provinciali, per un investimento complessivo di 1,7 milioni di euro (di cui 700 mila euro di finanziamento regionale); i progetti, avviati nel 2005, sono tutti conclusi.
- DTT LAB Toscana: l'intervento si è concretizzato nella costituzione di un centro di competenza sulla televisione digitale terrestre, in collaborazione con alcuni centri di ricerca e università (MICC di UNIFI, ingegneria di UNISI e CSP di Torino) che hanno cofinanziato il Laboratorio con 158 mila euro e con una serie di attività di ricerca; la Regione ha finanziato il progetto con 400 mila euro; il Laboratorio ha sviluppato le proprie attività a supporto del progetto DTToscana (Progetto regionale cofinanziato dal CNIPA), realizzando metodologie, tecnologie e prodotti per applicazioni interattive in ambiente MHP operanti attraverso la televisione digitale terrestre.

Tutti gli interventi citati sono conclusi. Le risorse regionali impegnate per Linea 3 ammontano a 6,4 milioni di euro (l'intero finanziamento), quasi interamente pagate.

#### Finanziamenti 2005 e 2006

Le leggi finanziarie regionali per il 2005 e il 2006 hanno stanziato complessivamente ulteriori 16 milioni di euro per le annualità 2006-2008 per il potenziamento delle infrastrutture telematiche. Ad aprile 2006 il Consiglio Regionale (Delibera n. 40 del 27/4/2006: "Finanziamento delle linee di intervento del progetto e-toscana") ha approvato la prosecuzione del programma e-Toscana, confermando l'articolazione nelle tre linee di intervento e ripartendo le risorse previste (5,5 milioni per il 2006, 6,5 milioni per il 2007 e 4 milioni per il 2008). Inoltre, la legge finanziaria regionale 2005 ha destinato 5 milioni di euro agli Interventi per l'efficienza e l'innovazione nella PA (Area 4 del Nuovo Patto).

Parte di queste risorse sono confluite nel "Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e la società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007-2010" (Delibera del Consiglio regionale n. 68 dell'11/07/2007). Relativamente a tale programma si segnalano i seguenti interventi finanziati con risorse del programma straordinario:

- per il progetto "Banda larga per le aree rurali della Toscana" (finanziato da risorse CIPE, Por CREO FESR e provinciali), a marzo e a giugno 2008 sono state approvate le graduatorie definitive degli operatori di telecomunicazione (OPC) individuati a seguito di bando, e impegnati 8,6 milioni di euro (di cui 6,8 sulle risorse del POR CREO FESR), che si aggiungono ai 6,8 milioni già impegnati nel 2007; nel luglio 2008 è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra Regione e gli Enti che intendono aderire al progetto.

- a marzo 2008 sono stati impegnati 180 mila euro relativi al contributo previsto dal Protocollo d'intesa ANCI - Regione per il supporto all'attuazione del progetto e-toscana per l'accesso;
- nell'ambito degli interventi destinati all'ampliamento e al consolidamento della rete dei PAAS, a marzo 2008 è stato deciso di attuare una forma di erogazione dei contributi in grado di soddisfare la totalità dei PAAS ad oggi accreditati destinando 1.300 euro per ogni PAAS accreditato fino al raggiungimento della cifra complessiva di 350 mila euro;
- a giugno 2008 è stato approvato il protocollo d'Intesa fra CNIPA e Regione Toscana per l'Integrazione delle varie componenti del sistema pubblico di connettività (SPC) e per il loro governo; in tale contesto sempre nel mese di giugno è stato approvato il nuovo schema di convenzione per l'adesione alla RTRT, che propone un testo aggiornato frutto di un processo condiviso dagli organismi della rete e che rappresenta l'avvio di una nuova fase di sviluppo e crescita di RTRT nell'ambito di SPC; per gli interventi relativi al sistema pubblico di connettività regionale sono stati impegnati 2,5 milioni di euro di risorse del programma straordinario;
- sempre nel mese di giugno è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra Regione e ANCI Toscana per lo sviluppo della Società dell'Informazione, con particolare riferimento ai comuni di piccole dimensioni territoriali; l'onere finanziario a carico della Regione ammonta complessivamente a 600 mila euro per il 2008-2010;
- tra il 2007 e il 2008 sono stati avviati interventi per la realizzazione dei centri per il telelavoro nelle aree marginali e disagiate; tali interventi, sviluppati con il supporto dei territori tramite le gestioni associate, hanno comportato un cofinanziamento di 557 mila euro di risorse straordinarie per 10 telecentri, per un totale di circa 200 posti/lavoro;
- dopo la conclusione della prima sperimentazione del sistema VoiP nella PA, ha preso avvio la realizzazione della prima infrastruttura VoiP di carattere regionale nella PA locale (2 milioni di euro di cui 1,6 milioni di risorse del programma straordinario);
- per interventi di informatizzazione nel settore della giustizia, sono previste risorse straordinarie per 500 mila euro (di cui 157 mila impegnate);
- nell'ambito dell'azione "Internet per i più giovani", che prevede la realizzazione e la gestione di uno spazio in rete sicuro, sono previste risorse regionali per 991 mila euro di cui 406 mila di risorse del programma straordinario;
- nel dicembre 2008 è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione, ANCI Toscana e UNCEM Toscana, per la realizzazione del progetto "Errequ@dro-scuole in rete e reti di scuole", che si propone di realizzare un'integrazione in rete delle scuole dei comuni montani e delle piccole isole lo svolgimento di lezioni a distanza, la fruizione di contenuti didattici e la condivisione di progetti ed esperienze educative; il finanziamento della Regione per la realizzazione del progetto è di 350 mila euro, di cui 260 mila di risorse straordinarie;
- a fine 2008 è stata conclusa la gara d'appalto relativa all'infomobilità nell'ambito del programma ELISA finanziato dalla Regione con 500 mila euro di risorse straordinarie.

Nell'ambito degli interventi relativi alla Rete telematica regionale, nel mese di dicembre 2008 si è conclusa la gara d'appalto per il nuovo contratto di servizio; la nuova infrastruttura tecnologica metterà il sistema RTRT al primo posto in Italia, con un abbattimento del 30% sui costi di connessione a livello locale ed un potenziamento della capacità di rete. La nuova RTRT si affianca alle iniziative per la larga banda e perfeziona il sistema delle connessioni locali della PA toscana.

#### Ulteriori interventi

Agli interventi di e-Toscana finanziati dal Programma regionale degli investimenti si

affiancano i progetti finanziati con l'APQ per lo sviluppo della società dell'informazione. Complessivamente, l'Intesa nel settore della società dell'informazione (l'APQ iniziale è dell'aprile 2004) prevede 14 interventi, tutti a carattere regionale, per un investimento di 21,6 milioni euro (di cui quasi il 90% risorse gestite dalla Regione), e una spesa di 13 milioni di euro (di cui il 17% nel 2008).

## **2.27 Portale della Toscana (2003)**

Il Programma, approvato da Consiglio regionale nel febbraio 2003 (Delibera Consiglio regionale del 12.2.2003, n. 21: "Programma straordinario degli investimenti strategici 2003-2005. Approvazione del progetto Portale della Toscana"), prevede la realizzazione di un Portale quale strumento di valorizzazione e promozione, a livello internazionale, delle risorse istituzionali, economiche, culturali e sociali della regione, semplificando e velocizzando l'accesso a informazioni e servizi di cittadini, imprese, enti e altri soggetti pubblici e privati.

Il progetto è realizzato dalla Fondazione "Sistema Toscana", i cui soci fondatori sono Regione e Banca Monte dei paschi di Siena, che si è costituita alla fine del 2004.

La Regione ha destinato al progetto uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro, cui si aggiunge un finanziamento di pari importo della Banca Monte dei Paschi di Siena, costituito da apporti di risorse finanziarie, beni materiali e immateriali necessari.

La Regione ha impegnato e pagato tutte le proprie risorse già entro il 2006.

La realizzazione vera e propria del Portale è iniziata nel 2005, dopo il completamento dell'organizzazione della Fondazione, con l'aggiornamento del progetto esecutivo in ottica multicanale e di redditività economica.

Nel giugno 2006, è stata rilasciata la prima versione del Portale. La prosecuzione del progetto ha visto lo sviluppo di applicazioni interattive rivolte ai diversi target di utenza cui il Portale è rivolto (imprese, cittadini, turisti). Nel maggio 2007 è stata rilasciata la versione definitiva del Portale, concludendo così il progetto che passa all'esercizio ordinario.

La Fondazione ha attivato le risorse previste dal programma (10 milioni di euro), sostenendo costi per 10 milioni <sup>17</sup>.

Il Portale contiene 80 mila "pezzi" (news e articoli, rubriche, servizi), con una media di aggiornamento che supera le 200 notizie al giorno. Booking e ticketing sono i servizi on-line più cliccati e richiesti insieme all'e-commerce <sup>18</sup>. E' stata inoltre completata la progettazione e l'approdo on line della versione in inglese del Portale.

---

<sup>17</sup> L'importo comprende l'apporto di beni e servizi da parte della Banca Monte dei Paschi per la realizzazione del Portale.

<sup>18</sup> Dati inizio 2008

## Tabelle e grafici

### **Nota di lettura**

Nelle tabelle allegate sono riportate alcune informazioni di sintesi sullo stato di avanzamento dei programmi finanziati con il Programma straordinario degli investimenti.

I dati sono ricavati dagli atti di programmazione e gestionali adottati per dare attuazione ai singoli programmi e dal sistema di monitoraggio dei progetti del Programma straordinario degli investimenti impostato dalla Regione, con la collaborazione dei soggetti attuatori.

I dati rappresentano una situazione in evoluzione, in particolare per i programmi di più recente approvazione, in quanto il quadro informativo (con particolare riferimento al concorso finanziario dei partners pubblici e privati della Regione) si viene modificando per effetto della progressiva messa a punto del piano degli interventi (anche a seguito del reperimento di risorse aggiuntive).

Ogni tabella è organizzata in base all'anno di avvio dei programmi (e suddivisa in tre sezioni A, B, C), per fornire una visione complementare rispetto all'ordine per settore di intervento seguito nella prima parte del report.

### **Tabella 1 - Quadro finanziario previsionale**

Presenta il quadro finanziario previsionale di massima dei programmi, prendendo le mosse dalle previsioni del DPEF 2003 e dalle successive leggi finanziarie regionali, integrate dagli ulteriori elementi di sviluppo conseguenti all'effettiva implementazione dei programmi.

### **Tabella 2 - Programmazione finanziaria e impegni delle risorse sul Bilancio regionale**

Presenta la programmazione finanziaria delle sole risorse regionali (dedicate e aggiuntive), con i relativi impegni e pagamenti. I dati sono presentati secondo le seguenti scansioni temporali:

- fino al 2007: vengono riportati gli impegni e i pagamenti; le assegnazioni si assumono uguali agli impegni;
- 2008: vengono indicate le assegnazioni, gli impegni e i pagamenti per l'anno corrente;
- 2009-2010: vengono indicate le assegnazioni e gli impegni.

La colonna "modalità di impegno" indica come le risorse regionali vengono impegnate, distinguendo le seguenti tipologie:

- a l'impegno avviene in tranches che seguono l'avanzamento realizzativo dei singoli progetti (p.es. l'impegno avviene al termine della progettazione di uno o più interventi)
- b l'impegno è contestuale all'adozione dell'atto che individua i progetti finanziati (decreto di approvazione della graduatoria di un bando, delibera di approvazione di un Accordo di programma)
- c l'impegno è a favore di un soggetto intermedio tra la Regione e i soggetti attuatori, che si occupa della gestione.

Di seguito alla tabella, per i programmi 2003-2004 vengono presentati i grafici dell'andamento degli impegni e dei pagamenti dal dicembre 2003 al monitoraggio corrente.

### **Tabella 3 - Risorse per i progetti definiti per soggetto finanziatore**

Presenta, per i progetti ad oggi concretamente definiti, la pianificazione finanziaria di dettaglio suddivisa in base alla tipologia dei soggetti finanziatori.

### **Tabella 4 - Progetti definiti (numero e risorse) per ambito provinciale di localizzazione**

Presenta, per i progetti ad oggi concretamente definiti, la localizzazione dei progetti per ambito provinciale (nella colonna "Toscana" sono indicati i progetti a valenza interprovinciale o relativi all'intero territorio regionale).

### **Tabella 5 - Progetti definiti (numero e risorse) per soggetto attuatore e avanzamento complessivo della spesa**

Presenta il quadro dei progetti ad oggi concretamente definiti in base alla tipologia dei soggetti attuatori, responsabili della realizzazione operativa. I dati sulla spesa da parte dei soggetti attuatori, se confrontati con gli stanziamenti dei singoli programmi (relativi all'intero periodo di programmazione e pertanto comprendenti anche le annualità successive), esprimono non tanto il grado di efficienza dei processi di gestione quando piuttosto lo stato di realizzazione finanziaria complessiva del programma.

### **Tabella 6 - Avanzamento procedurale dei progetti**

Presenta la distribuzione del numero dei progetti definiti secondo la fase procedurale raggiunta alla data di monitoraggio.

I dati relativi al programma per le infrastrutture viarie comprendono gli interventi del programma 2001 (Delibera C.R. 126 del 19/06/2001) e del programma 2002/2007 (Delibera C.R. n. 35 del 27/02/2002), con esclusione degli interventi integralmente finanziati con risorse CIPE.

Eventuali discordanze tra i dati parziali e i totali dipendono da arrotondamenti automatici degli importi effettuati dai programmi di elaborazione.

I dati, riferiti al 31/12/2008, sono tuttora in corso di aggiornamento.

**Tabella 1 - Quadro finanziario previsionale**

A. Programmi 2003-2004

(importi in milioni di euro)

Programmi	atto di approvazione	Risorse regionali dedicate		Altre risorse gestite dalla		Altre risorse pubbliche		Risorse private		TOTALE
		ME	%	ME	%	ME	%	ME	%	
Infrastrutture viarie	Delibere C.R. n. 35 del 27/2/2002 e n. 126 del 19/6/2001	516,5	44%	265,5	22%	179,9	15%	219,8	19%	1.181,7
Difesa della costa	Delibera C.R. n. 47 del 11/3/2003	103,3	93%	6,3	6%	1,9	2%			111,5
Rilancio poli espositivi	Delibera C.R. n. 36 del 25/2/2003	82,6	50%			82,6		50%		165,2
Investimenti sanitari	Delibera C.R. n. 202 del 23/12/2002	88,0	12%	169,1	24%	309,1	44%	138,5	20%	704,7
Strutture innovative per il sociale (1)	Delibera C.R. n. 123 del 23/7/2003	34,0	19%	19,0	10%	120,7	66%	9,2	5%	182,8
Edilizia abitativa per studenti universitari (2)	Delibera C.R. n. 80 del 24/5/2002	81,9	52%			74,2		48%		156,1
Toscana "Museo diffuso" (2)	Delibera C.R. n. 124 del 24/7/2002	68,8	66%			31,4	30%	4,5	4%	104,7
E-Toscana	Delibera C.R. n. 20 del 12/2/2003	25,8	30%	30,2	35%	30,1		35%		86,1
Portale della Toscana	Delibera C.R. n. 21 del 12/2/2003	5,0	50%					5,0	50%	10,0
Rete distribuzione acqua di Montedoglio	Delibera C.R. n. 53 del 2/4/2003	10,3	100%							10,3
Miglioramento qualità urbana città di Firenze	Delibera C.R. n. 88 del 7/5/2003	10,3	31%			20,9	62%	2,6	8%	33,8
Tutela risorse idriche	Delibere C.R. n. 41 del 27/4/2004 e n. 5 del 25/1/2005	90,0	22%	20,5	5%	307,8		74%		418,3
<b>Totale 2003-2004</b>		<b>1.116,5</b>	<b>35%</b>	<b>510,6</b>	<b>16%</b>	<b>1.538,1</b>		<b>49%</b>		<b>3.165,2</b>

B. Programmi 2005

(importi in milioni di euro)

Programmi	atto di approvazione	Risorse regionali dedicate		Altre risorse gestite dalla		Altre risorse pubbliche		Risorse private		TOTALE
		ME	%	ME	%	ME	%	ME	%	
Patrimonio strutturale e strumentale della sanità	Delibera C.R. n. 138 del 2/12/05	40,0	67%	1,5	3%	18,3	31%			59,8
Infrastrutture telematiche (1)	Delibera C.R. n. 40 del 27/4/06 Delibera C.R. n. 68 del 11/07/07	16,0	42%			22,0		58%		38,0
Beni culturali - ulteriori investimenti	Delibera G.R. n. 804 del 1/8/05 Delibera G.R. n. 804 del 27/3/06	5,0	48%	0,5	5%	4,3	42%	0,6	6%	10,4
Mobilità - treni	Delibera C.R. n. 98 del 27/07/06 Delibera C.R. n. 68 del 05/07/06	45,0	22%	1,5	1%			161,0	78%	207,6
Mobilità - PUM	Delibera C.R. n. 61 del 05/07/05 e n. 113 del 9/11/05	28,6	12%	10,4	4%	172,4	70%	33,2	14%	244,6
Mobilità - porti	Decreto dir. 4538 del 4/7/05	14,0	100%							14,0
Impiantistica sportiva	Delibera C.R. n. 139 del 2/12/05	3,0	58%			2,1	42%			5,1
Offerta termale (1)	Delibera C.R. n. 111 del 9/11/05 e Delibera C.R. n. 14 del 13/2/07	12,0	46%	1,0	4%	13,0		50%		26,0
Invasi idrici multifunzionali	Delibera C.R. n. 133 del 2/12/05	19,0	88%			2,6	12%			21,6
Efficienza e innovazione nella PA	Delibera C.R. n. 88 del 27/8/05	5,0	100%							5,0
Distretti industriali e sistemi produttivi locali (1)	Delibera C.R. n. 88 del 27/8/05	42,0	79%	4,8	9%	5,8	11%	0,4	1%	53,0
Competitività e sostenibilità offerta commerciale (1)	Delibera C.R. n. 88 del 27/8/05; Delibere G.R. n. 553 del 31/7/06 e n. 534 del 7/8/06	5,0	100%							5,0
<b>Totale 2005</b>		<b>234,6</b>	<b>34%</b>	<b>19,7</b>	<b>3%</b>	<b>435,9</b>		<b>63%</b>		<b>690,2</b>

Le colonne "altre risorse pubbliche" e "risorse private" derivano dai dati dei progetti definiti, se utilizzabili; altrimenti sono ricavate dagli atti di approvazione dei programmi o da comunicati stampa

(1) Il programma è finanziato anche con risorse straordinarie 2006

(2) Il programma è finanziato anche con risorse straordinarie 2005; nelle risorse regionali dedicate non sono conteggiati 8,7 milioni di euro che sono stati destinati al programma per i beni culturali 2006

**Tabella 1 - Quadro finanziario previsionale**

C. Programmi 2006 (3)

*(importi in milioni di euro)*

Programmi	atto di approvazione	Risorse regionali dedicate		Altre risorse gestite dalla		Altre risorse pubbliche		Risorse private		TOTALE
		M€	%	M€	%	M€	%	M€	%	
Agricoltura e svil.rurale: pretrattamento carcasce animali		2,0	100%							2,0
Agricoltura e svil.rurale: energia per le aree rurali	Delibera C.R. n. 119 del 14/11/2006	4,0	32%	4,0	32%	4,7	37%			12,7
Agricoltura e svil.rurale: riconversione strutture agroindustriali		4,0	100%							4,0
Imprese - infrastrutture ecologiche per aree produttive		4,0	100%							4,0
Infrastrutture tur. e comm. - turismo	Delibera G.R. n. 799 del 12/11/2007	4,0	100%							4,0
Edilizia scolastica	Delibera G.R. n. 374 del 22/5/06	6,0	34%			11,8	66%			17,8
Beni culturali (4)	Delibera C.R. n. 90 del 26/7/2006	28,7	61%	3,9	8%	14,5	31%			47,1
Edilizia scolastica	Delibera G.R. n. 374 del 22/5/06	6,0	34%			11,8	66%			17,8
Mobilità - PUM		10,0	100%							10,0
Risorse idriche 2006-2007	Delibera C.R. n. 50 del 24/5/2006; Delibera C.R. n. 63 del 13/06/2007;	14,0	34%			27,2	66%			41,2
Valorizzazione ambientale territorio toscano	Delibera G.R. n. 91 del 25/07/2007	15,0	100%							15,0
Strutture innovative per il sociale (5)	Delibera C.R. n. 28 del 28/2/2007; Delibera G.R. n. 692 del 8/9/2008	13,3	17%	6,1	8%	61,2	76%			80,6
<b>Totale 2006</b>		<b>111,0</b>	<b>43%</b>	<b>14,0</b>	<b>5%</b>	<b>131,1</b>	<b>51%</b>			<b>256,1</b>

(3) Le risorse destinate dalla Finanziaria 2006 all'ulteriore finanziamento dei programmi di investimento a sostegno delle imprese, del commercio, dell'offerta termale e delle infrastrutture telematiche sono state inserite nella sezione B della tabella poiché utilizzate congiuntamente alle risorse stanziati in precedenza.

(4) Comprende 10 milioni inizialmente stanziati con la Finanziaria 2005 e 8,7 milioni residuali del programma "Museo diffuso" (2003)

(5) Lo stanziamento effettivo è di 20 milioni di euro, dei quali 6,7 milioni sono confluiti nel programma "Strutture innovative per il sociale" iniziato nel 2003 (cfr. sezione A della tabella)

Programmi	Risorse regionali dedicate		Altre risorse gestite dalla		Altre risorse pubbliche e risorse private		TOTALE
	M€	%	M€	%	M€	%	
A. Totale programmi 2003-2004	1.116,5	35%	510,6	16%	1.538,1	49%	3.165,2
B. Totale programmi 2005	234,6	34%	19,7	3%	435,9	63%	690,2
C. Totale programmi 2006	111,0	43%	14,0	5%	131,1	51%	256,1
<b>Totale generale</b>	<b>1.462,2</b>	<b>36%</b>	<b>544,3</b>	<b>13%</b>	<b>2.105,0</b>	<b>51%</b>	<b>4.111,5</b>

**Tabella 2 - Programmazione finanziaria e impegni delle risorse sul Bilancio regionale**

A. Programmi 2003-2004

(importi in milioni di euro)

Programmi	mod. impegno	fino al 2007			2008			2009-2010			TOTALI		
		impegni	paga- menti	assegna- zioni	assegna- zioni	impegni	paga- menti	assegna- zioni	assegna- zioni	impegni	paga- menti	assegna- zioni	impegni
Infrastrutture varie (1)	a	394,2	316,7	241,6	151,5	17,3	142,6	22,5	778,4	568,2	334,0		
Difesa della costa	a	19,0	16,2	73,7	13,2	0,3	16,8	16,8	109,6	49,1	16,4		
Rilancio poli espositivi	b	31,0	30,6	51,6					82,6	31,0	30,6		
Investimenti sanitari strategici	b	88,0	34,0						88,0	88,0	34,0		
Nuovi ospedali	b			169,1	169,1	0,5			169,1	169,1	0,5		
Totale		88,0	34,0	169,1	169,1	0,5			257,2	257,2	34,5		
Strutture innovative per il sociale	a	30,7	28,3						30,7	30,7	28,3		
Accordo 2004	b	22,3	8,4						22,3	22,3	8,4		
Aggiornamento 2005	b	53,0	36,7						53,0	53,0	36,7		
Totale		76,9	75,9	5,0	5,0	3,0			81,9	81,9	78,9		
Edilizia abitativa per studenti universitari	b												
Toscana	b	53,5	47,5	0,0					53,6	53,5	47,5		
"Museo Villaggio Mediceo Careggi"	b	15,2	15,2						15,2	15,2	15,2		
Totale		68,8	62,7	0,0					68,8	68,8	62,7		
E-Toscana	a	42,2	41,7	2,3					44,5	42,2	41,7		
Linea 1	b	5,1	4,2	0,1					5,2	5,1	4,2		
Linea 2	b	6,4	6,3						6,4	6,4	6,3		
Linea 3	b	53,7	52,2	2,3					56,0	53,7	52,2		
Totale		53,7	52,2	2,3					56,0	53,7	52,2		
Portale della Toscana	a/b	5,0	5,0						5,0	5,0	5,0		
Rete distribuzione acqua di Montedoglio	a	10,3	8,4						10,3	10,3	8,4		
Miglioramento qualità urbana città di Firenze	a	10,3	5,4						10,3	10,3	5,4		
Tutela risorse idriche	b	32,0	23,0						32,0	32,0	23,0		
carenze idriche	a	19,0	8,5	36,1	35,1	0,5	23,4	16,4	78,5	70,5	9,0		
risoluzione inquinamento	a	51,0	31,5	36,1	35,1	0,5	23,4	16,4	110,5	102,5	32,0		
Totale		861,4	675,4	579,5	373,9	21,5	182,8	55,7	1.623,7	1.291,0	697,0		
<b>TOTALE 2003-04</b>													

(1) comprese le risorse CIPE che cofinanziano alcuni progetti

**Tabella 2 - Programmazione finanziaria e impegni delle risorse sul Bilancio regionale**

B. Programmi 2005







Programmi	mod. impegno	fino al 2007			2008			2009-2010			TOTALI		
		impegni	pagamenti	assegnazioni	impegni	assegnazioni	pagamenti	impegni	assegnazioni	pagamenti	impegni	assegnazioni	pagamenti
Patrimonio strutturale e strumentale della sanità	b	40,0	18,0	1,5							41,5	40,0	18,0
Infrastrutture telematiche	a	6,7	3,6	7,1	5,1	0,1	2,2	0,3			16,0	12,2	3,6
Beni culturali - ulteriori investimenti	b	5,5	3,9								5,5	5,5	3,9
Mobilità - treni	a	35,7	33,0	7,6	0,7		3,2				46,5	36,5	33,0
Mobilità - <i>tramvia FI</i>	a	31,2	29,1								31,2	31,2	29,1
Mobilità - PUM	a	3,0	3,0	4,8	1,5	0,7					7,8	4,5	3,7
Totale		34,2	32,1	4,8	1,5	0,7					39,0	35,7	32,8
Mobilità - porti	a	14,0	4,8								14,0	14,0	4,8
Impiantistica sportiva	a	2,8	2,5								2,8	2,8	2,5
Offerta termale	b	8,0	7,8	5,0	2,0						13,0	10,0	7,8
Invasi idrici multifunzionali	b	14,0		19,0	5,0	3,5					19,0	19,0	3,5
Efficienza e innovazione nella PA	a	2,0	0,7	3,0	0,7						5,0	2,6	0,7
Distretti industriali e sistemi produttivi locali	c	24,0	24,0	22,8							46,8	24,0	24,0
Competitività e sostenibilità offerta commerciale	c	5,0	5,0								5,0	5,0	5,0
<b>Totale 2005</b>		<b>192,0</b>	<b>135,5</b>	<b>70,7</b>	<b>14,9</b>	<b>4,3</b>	<b>5,4</b>	<b>0,3</b>	<b>254,2</b>	<b>207,3</b>	<b>139,8</b>		







C. Programmi 2006 (\*)

Programmi	mod. impegno	fino al 2007			2008			2009-2010			TOTALI		
		impegni	pagamenti	assegnazioni	impegni	assegnazioni	pagamenti	impegni	assegnazioni	pagamenti	impegni	assegnazioni	pagamenti
Agricoltura e sviluppo rurale: energia per le aree rurali	c	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0					8,0	8,0	8,0
Infrastrutture tur. e comm. - turismo	b			4,0	1,5						4,0	1,5	
Edilizia scolastica	b	4,0	1,2	1,9	1,9	0,1					5,9	5,9	1,3
Beni culturali 2006-08	b	27,6	3,6	5,0	5,0	0,1					32,6	32,6	3,7
Mobilità - PUM 2008-2009	b			1,5	1,5	1,5	8,5				10,0	1,5	1,5
Tutela risorse idriche 2006-08	a	0,6	0,3	13,4	3,4	2,8					14,0	4,0	3,1
Valorizzazione ambientale territorio toscano	a	4,0	3,4	8,0	3,0						15,0	7,0	3,4
Strutture per il sociale - Accordo 2008	b			19,4							19,4		
<b>Totale 2006</b>		<b>40,2</b>	<b>12,5</b>	<b>57,2</b>	<b>20,3</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>0,3</b>	<b>108,9</b>	<b>60,4</b>	<b>21,0</b>		

(\*) solo programmi che presentano impegni al 31.12.2008

Grafico 1 - Programmazione finanziaria, impegni e pagamenti relativi ai programmi 2003-2004 (v. Tab. 2 A)

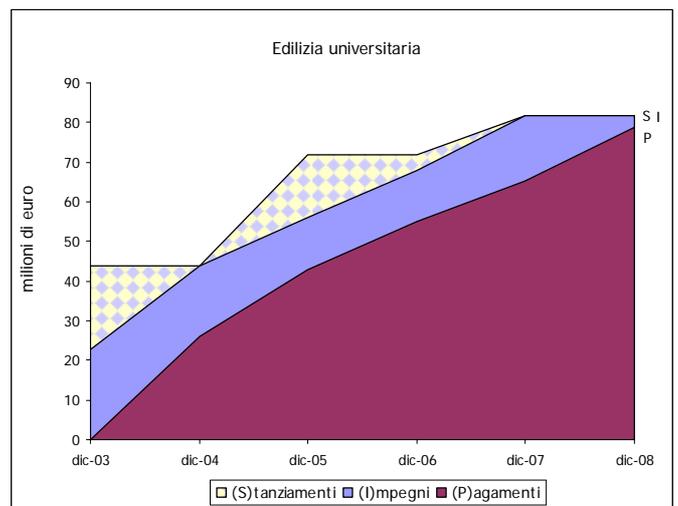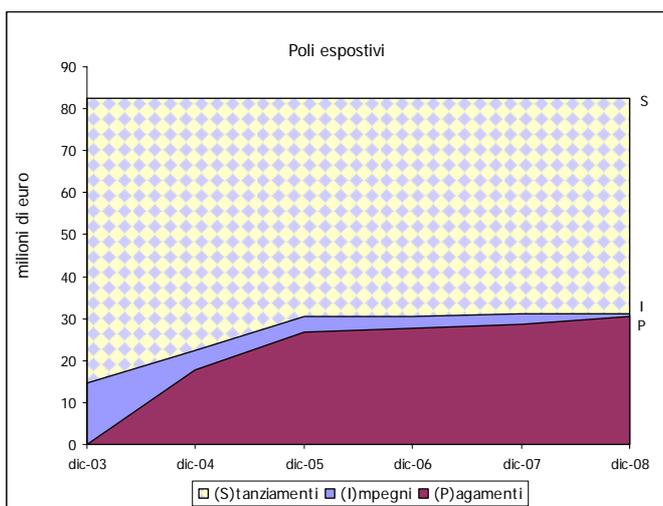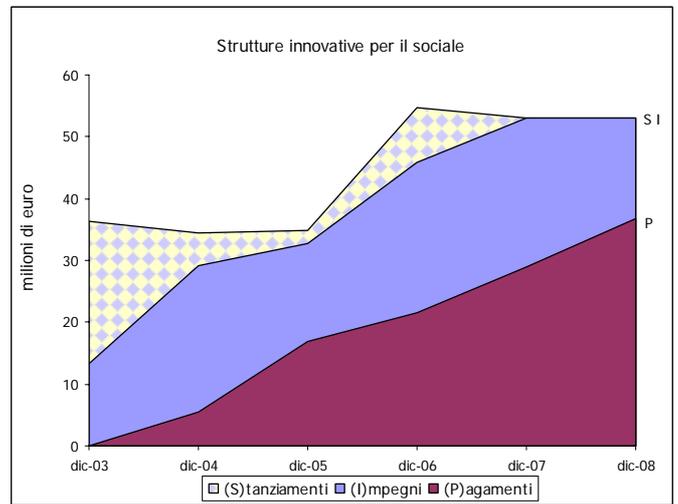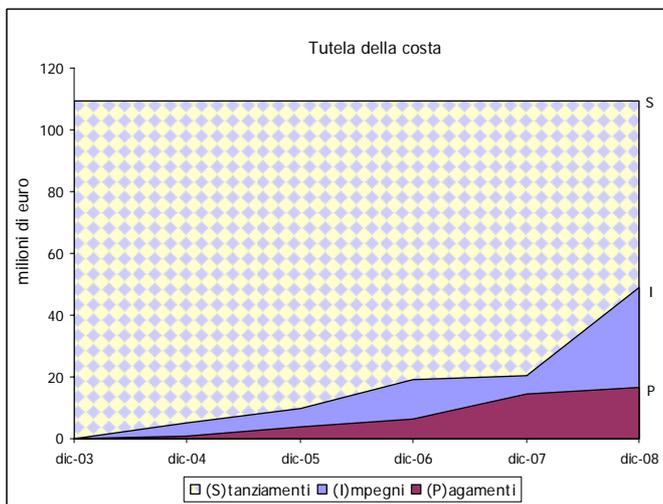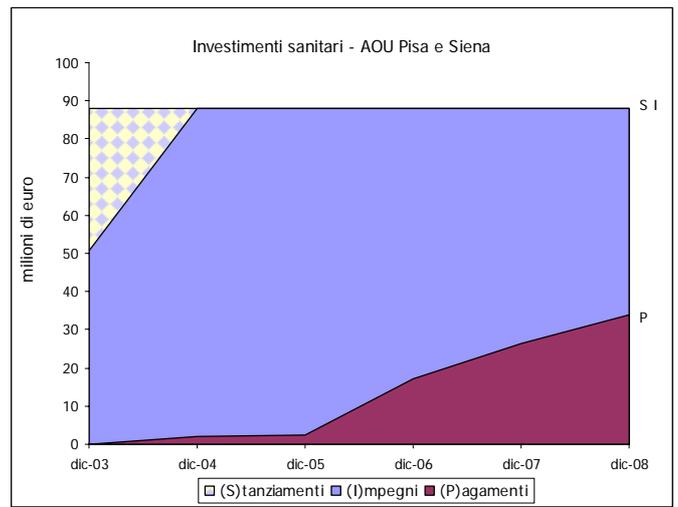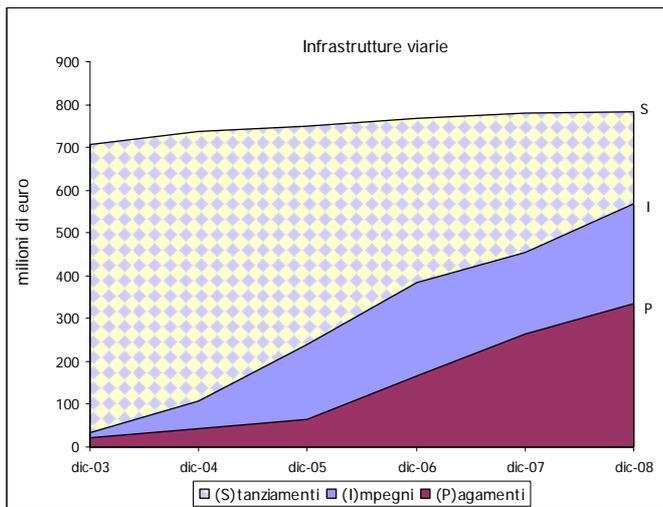

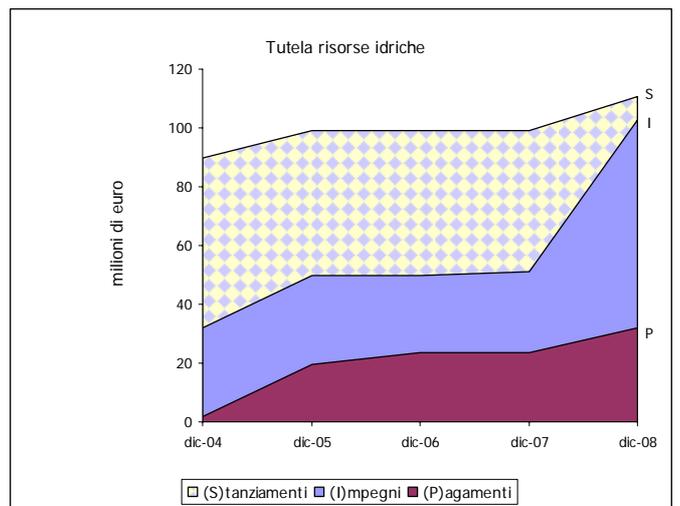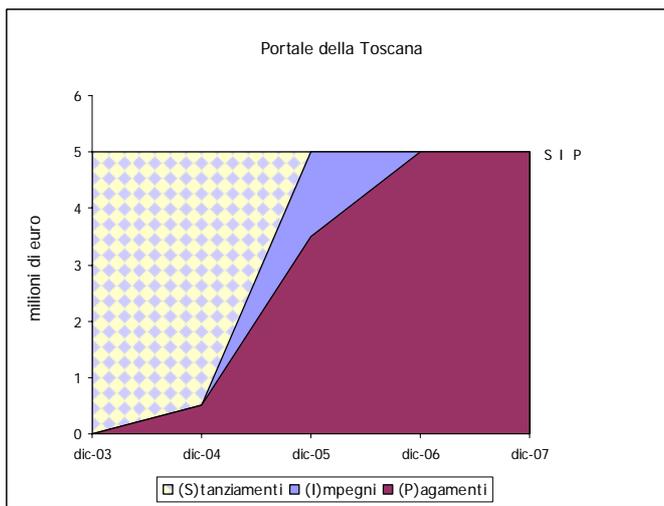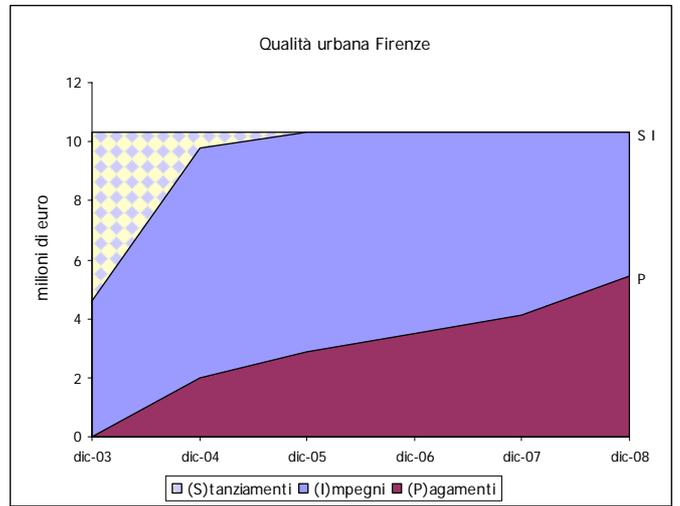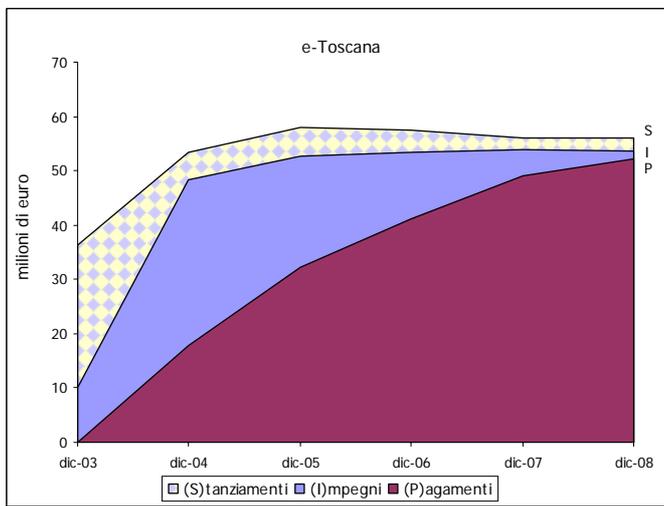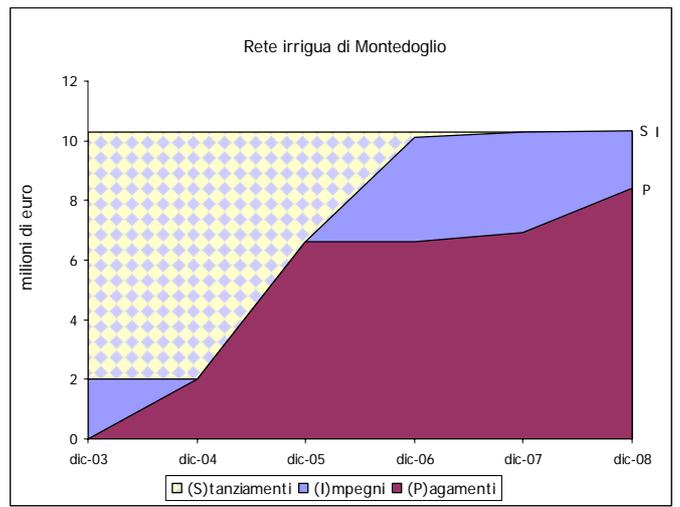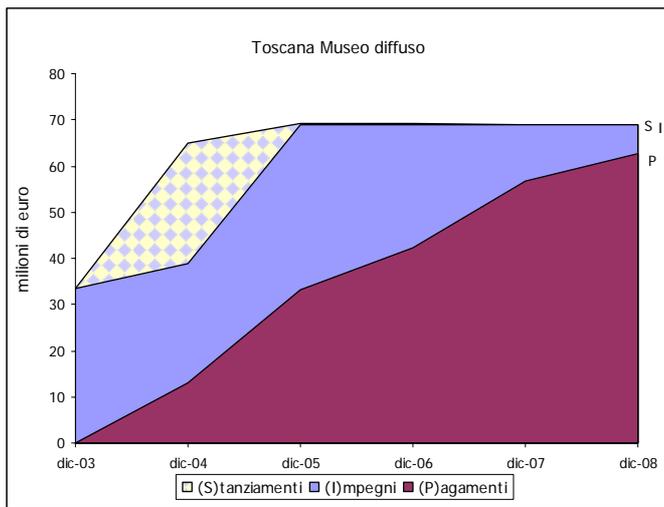

**Tabella 3 - Risorse per i progetti definiti per soggetto finanziatore**

A. Programmi 2003-2004

(importi in milioni di euro)

Programmi	Soggetti finanziatori							TOTALE
	Regione	Enti locali	Enti e az. regionali	Stato	Altro pubblico	Aziende speciali	Privati	
Infrastrutture viarie	776,6	161,6	-	12,5	5,8	-	219,8	1.176,3 (1)
<i>viabilità regionale</i>	587,7	157,5	-	12,5	5,8	-	5,7	769,1
<i>SGC FI-PI-LI</i>	159,2	4,2	-	-	-	-	0,6	163,9
<i>Lastra a Signa-Prato</i>	29,7	-	-	-	-	-	213,5	243,3
Difesa della costa	105,8	1,9	-	-	-	-	-	107,6
Rilancio poli espositivi	79,1	19,7	-	-	10,7	42,2	2,2	154,0
Interventi sanitari strategici	257,2	-	309,1	-	-	-	138,5	704,7
<i>Nuovi Ospedali</i>	169,1	-	120,5	-	-	-	132,3	421,9
<i>AO Pisa e Siena</i>	88,0	-	188,6	-	-	-	6,2	282,8
Strutture innovative per il sociale (*)	52,9	108,9	9,2	0,1	2,5	1,4	7,8	182,8
<i>Accordo 2004</i>	30,6	72,7	4,2	0,1	0,6	1,4	7,8	117,3
<i>Aggiornamento 2005</i>	22,3	36,2	5,0	-	1,9	-	-	65,4
Edilizia abitativa per studenti universitari (*)	81,9	-	28,2	29,8	-	-	16,2	156,1
Toscana "Museo diffuso" (*)	68,8	31,0	-	-	0,4	-	4,5	104,7
<i>progetti 2003-2005</i>	53,6	31,0	-	-	0,4	-	4,5	89,5
<i>Villa Medicea Careggi</i>	15,2	-	-	-	-	-	-	15,2
E-Toscana	51,5	20,7	-	3,6	0,8	-	5,1	81,6 (2)
<i>linea 1</i>	40,5	15,2	-	3,6	0,5	-	1,5	61,4
<i>linea 2</i>	4,7	1,6	-	-	0,1	-	3,5	9,8
<i>linea 3</i>	6,4	3,8	-	-	0,2	-	0,2	10,5
Portale della Toscana	5,0	-	-	-	-	-	5,0	10,0
Rete distribuzione acqua di Montedoglio	10,3	-	-	-	-	-	-	10,3
Miglioramento qualità urbana città di Firenze	10,3	20,9	-	-	-	-	2,6	33,8
Tutela risorse idriche	110,5	8,9	-	90,5	13,4	177,5	17,5	418,3
<i>carenze idriche</i>	32,0	3,8	-	1,0	-	91,1	-	127,9
<i>riduzione inquinamento</i>	78,5	5,1	-	89,5	13,4	86,4	17,5	290,4 (3)
<b>TOTALE</b>	<b>1.609,9</b>	<b>373,6</b>	<b>346,5</b>	<b>136,5</b>	<b>33,6</b>	<b>221,0</b>	<b>419,2</b>	<b>3.140,3</b>
<i>Rapporto di composizione %</i>	51%	12%	11%	4%	1%	7%	13%	100%

(\*) Il programma comprende anche progetti finanziati da risorse 2005 o 2006 e destinate all'integrazione dei programmi approvati originariamente

(1) sono compresi i progetti finanziati con risorse CIPE (senza cofinanziamenti regionali), per un investimento di 54 milioni di euro

(2) a questi importi si aggiungono le risorse della Regione utilizzate per le azioni di sostegno, pari a 3,8 milioni di euro per la linea 1 e a 0,4 milioni di euro per la linea 2

(3) la ripartizione dei finanziamenti tra enti locali, altro pubblico, aziende speciali e privati non è definitiva

**Tabella 3 - Risorse per i progetti definiti per soggetto finanziatore**

B. Programmi 2005

(importi in milioni di euro)

Programmi	Soggetti finanziatori							TOTALE
	Regione	Enti locali	Enti e az. regionali	Stato	Altro pubblico	Aziende speciali	Privati	
Patrimonio strutturale e strumentale della sanità	41,5	1,3	17,0					59,8
Beni culturali (APQ)	5,5	2,4	1,9				0,6	10,5
Mobilità - treni	46,5					161,0		207,6
Mobilità - PUM	39,0	94,6	-	73,8	4,0	33,2	-	244,6
<i>tramvia FJ</i>	<i>31,2</i>	<i>83,7</i>		<i>73,8</i>	<i>4,0</i>	<i>33,2</i>		<i>226,0</i>
<i>PUM</i>	<i>7,8</i>	<i>10,8</i>						<i>18,6</i>
Impiantistica sportiva	3,0	2,1						5,1
Offerta termale	8,0	2,6				3,0	4,5	18,1
Invasi idrici multifunzionali	18,9	2,5			0,1			21,5
Distretti industriali e sistemi produttivi locali	9,2	5,0			0,8		0,4	15,4
<b>TOTALE</b>	<b>171,7</b>	<b>110,6</b>	<b>18,9</b>	<b>73,8</b>	<b>4,9</b>	<b>197,2</b>	<b>5,5</b>	<b>582,6</b>
<i>Rapporto di composizione %</i>	<i>29%</i>	<i>19%</i>	<i>3%</i>	<i>13%</i>	<i>1%</i>	<i>34%</i>	<i>1%</i>	<i>100%</i>

C. Programmi 2006 (\*)

(importi in milioni di euro)

Programmi	Soggetti finanziatori							TOTALE
	Regione	Enti locali	Enti e az. regionali	Stato	Altro pubblico	Aziende speciali	Privati	
Agricoltura - Energia aree rurali	4,0	4,7						8,7
Edilizia scolastica	4,0	11,4			0,4			15,8
Beni culturali 2006-08	32,6	14,5						47,1
Tutela risorse idriche 2006-2008 ( <i>Giannutri</i> )	0,6							0,6
Sociale Accordo 2008	19,4	46,2	14,8			0,1		80,6
<b>TOTALE</b>	<b>60,6</b>	<b>76,8</b>	<b>14,8</b>	<b>-</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>-</b>	<b>152,8</b>
<i>Rapporto di composizione %</i>	<i>40%</i>	<i>50%</i>	<i>10%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>

(\*) solo programmi con progetti definiti

**Tabella 4 - Progetti definiti (numero e risorse) per ambito provinciale di localizzazione**  
A. Programmi 2003-2004

Programmi	Arezzo		Firenze		Grosseto		Livorno		Lucca		Massa Carrara		Pisa		Pistoia		Prato		Siena		Toscana		TOTALE		
	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	
Infrastrutture viarie	19	114,6	40	275,0	8	53,0	8	20,0	15	75,9	2	22,1	16	143,3	18	59,5	17	77,5	26	92,2	1	243,3	170	1.176,3	
viabilità regionale	19	114,6	29	170,4	8	53,0	5	10,1	15	75,9	2	22,1	12	93,9	18	59,5	17	77,5	26	92,2	-	-	151	769,1	
SSC FI-PI-LI	-	-	11	104,6	-	-	3	9,9	-	-	-	-	4	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-	18	163,9	
Lastra a Signa-Prato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	243,3	1	243,3
Difesa della costa	-	-	-	-	7	18,7	9	18,6	1	3,3	2	41,5	4	16,0	-	-	-	-	-	-	-	10	9,6	33	107,6
Rilancio poli ospitali	6	25,3	4	86,6	-	-	-	-	-	-	2	18,0	-	-	1	4,0	1	20,0	-	-	-	-	-	14	154,0
Interventi sanitari strategici	-	-	-	-	-	-	-	-	1	105,8	1	96,7	2	253,0	1	102,2	1	117,2	1	29,8	-	-	7	704,7	
Nuovi Ospedali	-	-	-	-	-	-	-	-	1	105,8	1	96,7	-	-	1	102,2	1	117,2	-	-	-	-	4	421,9	
AO Pisa e Siena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	253,0	-	-	-	-	1	29,8	-	-	3	282,8	
Strutture innovative per il sociale (*)	110	22,6	65	39,0	39	7,9	17	19,1	53	21,9	34	10,8	73	29,4	34	6,0	21	19,5	32	6,3	-	-	478	182,8	
Accordo 2004	66	17,2	44	21,5	15	1,1	11	16,2	25	12,0	16	7,8	51	22,4	19	3,6	8	10,7	19	4,8	-	-	274	117,3	
Aggiornamento 2005	44	5,4	21	17,5	24	6,9	6	2,9	28	9,9	18	3,1	22	7,0	15	2,4	13	8,8	13	1,5	-	-	204	65,4	
Edilizia abitativa studenti universitari (*)	-	-	10	54,8	-	-	-	-	-	-	2	1,8	13	57,4	-	-	-	-	11	42,2	-	-	36	156,1	
Toscana "Museo diffuso" (*)	16	10,8	31	53,8	-	-	-	-	11	19,5	-	-	1	3,1	7	7,7	-	-	6	9,8	-	-	72	104,7	
progetti 2003-2005	16	10,8	30	38,5	-	-	-	-	11	19,5	-	-	1	3,1	7	7,7	-	-	6	9,8	-	-	71	89,5	
Villa Medicea Careggi	-	-	1	15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15,2	
E-Toscana (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	81,6	
linea 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	81,6		
linea 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	61,4		
linea 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	9,8		
Portale della Toscana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	10,5		
Rete distribuzione acqua di Montedoglio	2	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10,0		
Miglioramento qualità urbana città di Firenze	-	-	11	33,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10,3	
Tutela risorse idriche	30	10,5	80	22,9	19	12,4	10	4,8	72	109,4	36	6,0	28	160,5	43	42,3	7	40,8	17	8,7	-	-	342	418,3	
carenze idriche	30	10,5	79	19,8	19	12,4	10	4,8	69	8,3	36	6,0	27	14,6	43	42,3	6	0,5	17	8,7	-	-	336	127,9	
riduzione inquinamento	-	-	1	3,1	-	-	-	-	3	101,1	-	-	1	145,9	-	-	-	-	1	40,3	-	-	6	290,4	
TOTALE	183	194,2	241	565,9	73	92,0	44	62,4	153	335,8	79	197,0	137	662,8	104	221,7	47	275,0	93	188,9	93	344,6	1.247	3.140,3	
Rapporto di composizione %	-	6%	-	18%	-	3%	-	2%	-	11%	-	6%	-	21%	-	7%	-	9%	-	6%	-	11%	-	100%	

(\*) Il programma comprende anche progetti finanziati da risorse 2005 o 2006 e destinate all'integrazione dei programmi approvati originariamente

(1) sono compresi i progetti finanziati con risorse CIPE (senza cofinanziamenti regionali), per un investimento di 54 milioni di euro

(2) a questi importi si aggiungono le risorse della Regione utilizzate per le azioni di sostegno, pari a 3,8 milioni di euro per la linea 1 e a 0,4 milioni di euro per la linea 2

(3) i progetti di e-Toscana sono per la gran parte non riconducibili ad uno specifico ambito provinciale

**Tabella 4 - Progetti definiti (numero e risorse) per ambito provinciale di localizzazione**

B. Programmi 2005

Programmi	Arezzo		Firenze		Grosseto		Livorno		Lucca		Massa		Pisa		Pistoia		Prato		Siena		Toscana		TOTALE	
	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€
Patrimonio strutturale e strumentale della sanità	1	0,5	3	27,3	1	11,3	1	12,2	1	5,2	-	-	2	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	9	59,8
Beni culturali (APQ)	-	-	4	8,1	-	-	-	-	1	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10,5
Mobilità - treni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilità - PUM	1	2,1	2	228,1	-	-	-	-	1	0,8	-	-	2	3,7	2	1,6	1	2,0	1	6,4	-	-	10	244,6
tramvia FI	-	-	1	226,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	226,0
PUM	1	2,1	1	2,1	-	-	-	-	1	0,8	-	-	2	3,7	2	1,6	1	2,0	1	6,4	-	-	9	18,6
Impiantistica sportiva	6	0,5	9	0,7	7	0,5	9	0,6	8	0,6	5	0,3	9	0,7	7	0,5	4	0,2	6	0,5	-	-	70	5,1
Offerta termale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4,8	4	6,3	-	-	4	7,0	-	-	13	18,1
Invasi idrici multifunzionali	9	2,7	7	2,1	3	3,0	4	2,3	3	1,6	3	0,6	7	1,7	1	5,0	2	0,4	2	2,2	-	-	41	21,5
Distretti industriali e sistemi produttivi locali	8	4,6	9	1,9	1	0,06	-	-	4	4,5	1	0,04	3	3,46	3	0,8	-	-	-	-	-	-	29	15,4
TOTALE	25	10,4	34	268,3	12	14,8	14	15,0	18	15,0	9	1,0	28	17,7	17	14,2	7	2,6	13	16,1	-	-	177	582,6
Rapporto di composizione %	-	2%	-	46%	-	3%	-	3%	-	3%	-	0%	-	3%	-	2%	-	0%	-	3%	-	-	36%	100%

(1) la ASL 11 di Empoli è titolare di tre interventi, due in provincia di Firenze (relativi al Nuovo Ospedale di Empoli) e uno in provincia di Pisa (riguardante il Presidio Ospedaliero di S. Miniato)

(2) il programma non è riconducibile a progetti

C. Programmi 2006 (\*)

Programmi	Arezzo		Firenze		Grosseto		Livorno		Lucca		Massa		Pisa		Pistoia		Prato		Siena		Toscana		TOTALE	
	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€	n.	M€
Agricoltura - Energia aree rurali	4	1,2	5	2,6	1	0,2	-	-	4	2,4	-	-	-	-	4	1,8	-	-	2	0,5	-	-	20	8,7
Edilizia scolastica	5	2,4	3	2,1	3	1,3	2	0,3	8	4,3	2	0,5	1	0,1	1	0,8	1	0,3	2	3,6	-	-	28	15,8
Beni culturali 2006-08	9	6,2	12	14,3	-	-	-	-	4	5,1	1	0,2	8	9,4	4	4,9	2	3,7	4	3,3	-	-	44	47,1
Tutela risorse idriche	-	-	-	-	1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,6
2006-2008 (Giannutri)	38	9,5	35	28,4	12	2,7	11	6,9	29	11,5	6	4,4	17	11,4	7	1,6	2	2,4	12	1,9	-	-	169	80,6
Sociale Accordo 2006	56	19,2	55	47,5	17	4,8	13	7,2	45	23,4	9	5,1	26	20,9	16	9,0	5	6,4	20	9,4	-	-	262	152,8
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rapporto di composizione %	-	1,3%	-	31%	-	3%	-	5%	-	15%	-	3%	-	1,4%	-	6%	-	4%	-	6%	-	-	100%	

(\*) solo programmi con progetti definiti

**Tabella 5 - Progetti definiti (numero e risorse) per soggetto attuatore e avanzamento complessivo della spesa**  
A. Programmi 2003-2004

Programmi	Tipologia soggetto attuatore														TOTALE	
	Regione Toscana		Enti locali		Enti e aziende regionali		Altro pubblico		Aziende speciali		Privati		TOTALE		Avanzamento della spesa (soggetti attuatori)	
	n.	ME	n.	ME	n.	ME	n.	ME	n.	ME	n.	ME	n.	ME	Impegni	Pagamenti
															ME	ME
Infrastrutture viarie (1)																
<i>viabilità regionale</i>																
<i>SSC FI-PI-LI</i>																
<i>Lastra a Signa-Prato</i>																
Difesa della costa	10	9,6	22	93,7	1	4,3									52,4	17,3
Rilancio poli espositivi			2	24,0											141,9	43,3
Investimenti sanitari																
<i>NUOVI OSPEDALI</i>																
<i>AO PISA e SIENA</i>																
Strutture innovative per il sociale (*)			427	156,8	49	24,1	2	1,9							135,1	106,4
<i>Accordo 2004</i>			249	100,7	25	16,7									98,4	78,3
<i>Aggiornamento 2005</i>			178	56,1	24	7,4	2	1,9							36,7	28,1
Edilizia abitativa per studenti universitari (*)																
<i>Toscana "Museo diffuso" (*)</i>	1	15,2	55	79,8			1	0,1							102,1	26,6
<i>progetti 2003-2005</i>			55	79,8			1	0,1							88,2	82,1
<i>Villa Medicea Careggi</i>	1	15,2													15,2	15,2
E-Toscana (2)																
<i>linea 1</i>	14	54,0	44	21,8			2	0,4							68,0	54,3
<i>linea 2</i>	12	45,2	8	16,3											48,6	37,0
<i>linea 3</i>			20	3,9			2	0,4							9,0	6,8
Portale della Toscana	2	8,8	16	1,7											10,5	10,5
Rete distribuzione acqua di Montedoglio			2	10,3											10,0	10,0
Miglioramento qualità urbana città di Firenze			11	33,8											11,0	5,5
Tutela risorse idriche			33	3,8											115,0	92,9
<i>carenze idriche</i>			33	3,8											98,1	84,3
<i>riduzione inquinamento</i>															16,9	8,6
TOTALE	25	78,8	762	1.348,6	93	889,2	5	2,4	323	551,0	39	270,5	1.247	3.140,3	1.277,7	710,5

I dati sulla spesa da parte dei soggetti attuatori, se confrontati con gli stanziamenti dei singoli programmi (relativi all'intero periodo di programmazione e pertanto comprendenti anche le annualità successive al 2007), esprimono non tanto il grado di efficienza della gestione quanto piuttosto lo stato di realizzazione complessiva del programma limitatamente al profilo finanziario, da integrare anche con lo stato di avanzamento procedurale (cfr. tabella 6).

(\*) Il programma comprende anche progetti finanziati da risorse 2005 o 2006 e destinate all'integrazione dei programmi approvati originariamente

(1) sono compresi i progetti finanziati con risorse CIPE (senza cofinanziamenti regionali), per un investimento di 54 milioni di euro

(2) a questi importi si aggiungono le risorse della Regione utilizzate per le azioni di sostegno, pari a 3,8 milioni di euro per la linea 1 e a 0,4 milioni di euro per la linea 2

**Tabella 5 - Progetti definiti (numero e risorse) per soggetto attuatore e avanzamento complessivo della spesa**  
B. Programmi 2005

Programmi	Tipologia soggetto attuatore														TOTALE		
	Regione Toscana		Enti locali		Enti e aziende regionali		Altro pubblico		Aziende speciali		Privati		TOTALE		Avanzamento della spesa (soggetti attuatori)		
	n.	ME	n.	ME	n.	ME	n.	ME	n.	ME	n.	ME	n.	ME	Impegni	Pagamenti	
															ME	ME	
Patrimonio strutturale e strumentale della sanità	-	-	2	6,1	7	53,7	-	-	-	-	-	-	-	9	59,8	45,8	24,8
Beni culturali (APQ)	-	-	4	6,6	1	3,9	-	-	-	-	-	-	-	5	10,5	7,5	5,6
Mobilità - treni (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	207,6	-	-	-	-	10	207,6	161,1	144,4
Mobilità - PUM	-	-	10	244,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	244,6	233,5	103,6
tramvia FI	-	-	1	226,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	226,0	226,0	100,0
PUM	-	-	9	18,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	18,6	7,5	3,6
Impiantistica sportiva	-	-	70	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	5,1	3,9	1,8
Offerta termale	-	-	1	1,0	-	-	-	-	9	12,6	3	4,5	-	13	18,1	18,1	12,2
Invasi idrici multifunzionali	-	-	30	13,9	-	-	-	9	6,5	2	1,2	-	-	41	21,5	8,4	3,2
Distretti industriali e sistemi produttivi locali	-	-	21	11,8	-	-	-	7	2,8	1	0,8	-	-	29	15,4	14,1	1,8
TOTALE	-	-	138	289,1	8	57,6	16	9,3	12	222,1	3	4,5	-	177	582,6	492,3	297,5

I dati sulla spesa da parte dei soggetti attuatori, se confrontati con gli stanziamenti dei singoli programmi (relativi all'intero periodo di programmazione e pertanto comprendenti anche le annualità successive al 2007), esprimono non tanto il grado di efficienza della gestione quanto piuttosto lo stato di realizzazione complessiva del programma limitatamente al profilo finanziario, da integrare anche con lo stato di avanzamento procedurale (cfr. tabella 6)

(1) il programma non è articolabile in progetti

C. Programmi 2006 (\*)

Programmi	Tipologia soggetto attuatore														TOTALE		
	Regione Toscana		Enti locali		Enti e aziende regionali		Altro pubblico		Aziende speciali		Privati		TOTALE		Avanzamento della spesa (soggetti attuatori)		
	n.	ME	n.	ME	n.	ME	n.	ME	n.	ME	n.	ME	n.	ME	Impegni	Pagamenti	
															ME	ME	
Agricoltura - Energia aree rurali	-	-	20	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	8,7	-	-
Edilizia scolastica	-	-	28	15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	15,8	1,5	0,2
Beni culturali 2006-08	-	-	44	47,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	47,1	36,3	10,1
Tutela risorse idriche 2006-2008 (Giannutri)	-	-	1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,6	0,04	0,04
Sociale Accordo 2008	-	-	136	61,0	32	19,3	-	-	1	0,2	-	-	-	169	80,6	-	-
TOTALE	-	-	229	133,2	32	19,3	-	-	1	0,2	-	-	-	262	152,8	37,8	10,3

I dati sulla spesa da parte dei soggetti attuatori, se confrontati con gli stanziamenti dei singoli programmi (relativi all'intero periodo di programmazione e pertanto comprendenti anche le annualità successive al 2007), esprimono non tanto il grado di efficienza della gestione quanto piuttosto lo stato di realizzazione complessiva del programma limitatamente al profilo finanziario, da integrare anche con lo stato di avanzamento procedurale (cfr. tabella 6)

(\*) solo programmi con progetti definiti

**Tabella 6 - Avanzamento procedurale dei progetti**

A. Programmi 2003-2004

Programmi		numero dei progetti per fase di avanzamento procedurale						Totale
		proget- tazione in corso	proget- tazione terminata	aggiudi- cazione lavori	esecuzione lavori in corso	progetti conclusi	progetti da avviare	
Infrastrutture viarie	<i>viabilità regionale</i>	13		25	54	59		151
	<i>SGC FI-PI-LI</i>	1		5	3	9		18
	<i>L. a Signa-Prato</i>	1						1
Difesa dall'erosione della costa		19		1	8	3	2	33
Rilancio poli espositivi		7			4	3		14
Interventi sanitari strategici	<i>Nuovi Ospedali</i>	4						4
	<i>AO Pisa e Siena</i>	1			2			3
Strutture innovative per il sociale (**)	<i>Accordo 2004</i>				54	211	9	274
	<i>Agg. 2005</i>				71	67	66	204
Edilizia abitativa per universitari		1		1	7	21	3	36
Toscana "Museo diffuso"	<i>progetti 2003- 2004</i>				13	58		71
	<i>Villa Medicea Careggi</i>					1		1
E-Toscana	<i>linea 1</i>					20		20
	<i>linea 2</i>				9	33		42
	<i>linea 3</i>					18		18
Portale della Toscana						2		2
Rete di distribuzione dell'acqua di Montedoglio					1	1		2
Miglioramento qualità urbana città di Firenze		1			2	8		11
Tutela risorse idriche	<i>carenze idriche</i>				34	185	117	336
	<i>riduzione inquinamento</i>	1			1		4	6

La tabella non comprende i sottoprogrammi non ancora pienamente entrati in fase operativa al 31.12.2008

(\*) la colonna comprende i progetti per i quali il dato del monitoraggio procedurale non è disponibile

(\*\*) il dato dei progetti in corso di esecuzione può comprendere anche progetti nelle fasi precedenti

**Tabella 6 - Avanzamento procedurale dei progetti**

B. Programmi 2005

<i>Programmi</i>	numero dei progetti per fase di avanzamento procedurale							Totale
	proget- tazione in corso	proget- tazione terminata	aggiudi- cazione lavori	esecuzione lavori in corso	progetti conclusi	progetti da avviare	(*)	
Patrimonio strutturale e strumentale della sanità			2	5	1		1	9
Beni culturali (APQ)				3	2			5
Mobilità - PUM	<i>tramvia FI</i>			1				1
	<i>PUM</i>		7			2		9
Impiantistica sportiva		1	2	22	21		24	70
Offerta termale	3			6	4			13
Invasi idrici multifunzionali	16		2	10	11	2		41
Distretti industriali e sistemi produttivi locali	20			2	7			29

C. Programmi 2006

<i>Programmi</i>	numero dei progetti per fase di avanzamento procedurale							Totale
	proget- tazione in corso	proget- tazione terminata	aggiudi- cazione lavori	esecuzione lavori in corso	progetti conclusi	progetti da avviare	(*)	
Agricoltura - Energia aree rurali				20				20
Edilizia scolastica		2					26	28
Beni culturali 2006-2008	1	1	1	35	6			44
Tutela risorse idriche 2006-2008 (Giannutri)			1					1

La tabella non comprende i sottoprogrammi non ancora pienamente entrati in fase operativa al 31.12.2008

(\*) la colonna comprende i progetti per i quali il dato del monitoraggio procedurale non è disponibile
