

PR FESR 2021-2027

Informativa sullo stato di avanzamento del Programma (punto 3 OdG)

Comitato di Sorveglianza, 6 dicembre 2024

Autorità di Gestione del PR FESR

Agenda

Parte a – Progressi compiuti nell’attuazione e questioni che incidono sulla performance del Programma

- I. Programma Regionale FESR Toscana 2021-2027: dotazione e priorità
- II. Overview generale sull’attuazione del Programma
- III. Focus dell’avanzamento per Priorità
- IV. Aggiornamento Strategie Territoriali Urbane
- V. Aggiornamento Strategie Territoriali Aree Interne
- VI. Opzioni di Semplificazione dei Costi attuate nel Programma
- VII. I principali fattori che incidono sull’attuazione del Programma e le misure adottate per massimizzare la performance
- VIII. Aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo – Si.Ge.Co.
- IX. Il Piano di Monitoraggio Ambientale

Parte b – Operazioni di Importanza Strategica

- I. Attuazione operazioni pianificate di Importanza Strategica

Parte c – Tempistiche e modalità del riesame intermedio

- I. Il riesame intermedio: le modalità e le tempistiche

**COMITATO DI
SORVEGLIANZA
PR FESR 2021-2027**

Parte a. Progressi compiuti nell'attuazione e questioni che incidono sulla performance del Programma




Programma Regionale FESR Toscana 2021-2027: dotazione e priorità

Dotazione complessiva di **1,229 Milioni di Euro**

- **491,6 Milioni di Euro** di quota FESR
- **737,3 Milioni di Euro** di quota Nazionale

Il **30,9%** delle risorse è destinato al contrasto al **cambiamento climatico**

Il **3,4%** delle risorse è destinato alla salvaguardia della **biodiversità**

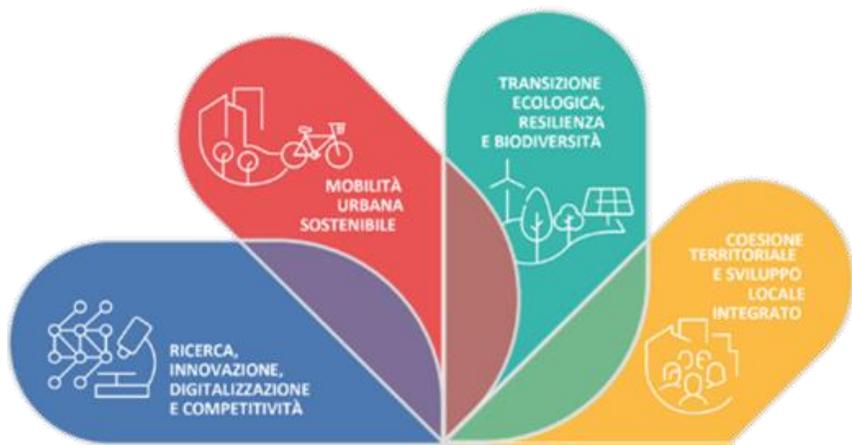

Si articola in **5 priorità:**



Priorità 1

Ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività



47,9%
€ 589.000.000



Priorità 2

Transizione ecologica, resilienza e biodiversità



29,9%
€ 367.860.000



Priorità 3

Mobilità urbana sostenibile



10,4%
€ 127.500.000



Priorità 4

Coesione territoriale e sviluppo locale integrato



8,3%
€ 101.466.850



Priorità 5

Assistenza Tecnica



3,5%
€ 43.009.265

Overview generale sull'attuazione del Programma al 30 novembre 2024

Si articola in **5 priorità**:

	Dotazione finanziaria	Risorse attivate	Impegni	Pagamenti	N.Progetti
<p>Priorità 1 Ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività</p>	<p>47,9% € 589.000.000,00</p>	€ 358.282.248,99	€ 183.205.525,11	€ 10.256.789,79	1.891
<p>Priorità 2 Transizione ecologica, resilienza e biodiversità</p>	<p>29,9% € 367.860.000</p>	€ 248.665.026,40	€ 1.479.870,91	€ 37.152,59	2
<p>Priorità 3 Mobilità urbana sostenibile</p>	<p>10,4% € 127.500.000</p>	—	—	—	—
<p>Priorità 4 Coesione territoriale e sviluppo locale integrato</p>	<p>8,3% € 101.466.850</p>	—	—	—	—
<p>Priorità 5 Assistenza Tecnica</p>	<p>3,5% € 43.009.265</p>	€ 15.115.384,43	€ 5.451.325,32	€ 5.251.325,32	4
TOTALE	€ 1.228.836.115,00	€ 622.062.659,82	€ 190.136.721,34	€ 15.545.267,70	1897



13

Procedure aperte

27

Procedure chiuse



Priorità 1 - Ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività 1/2

PROGRAMMAZIONE

Dotazione Totale: 589,00 Mln di Euro


di cui Quota FESR: 235,60 Mln di Euro

OS 1.3 - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)

208,00 Mln di Euro
35,31%

OS 1.1 - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

355,00 Mln di Euro
60,27%

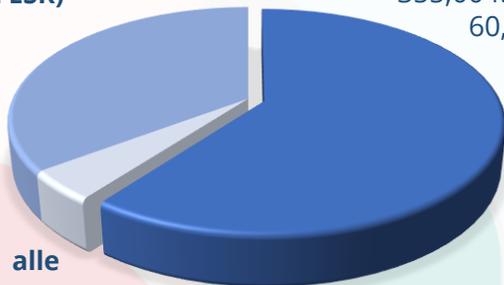

OS 1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

26,00 Mln di Euro
4,41%

PRIORITÀ 1



**RICERCA, INNOVAZIONE,
DIGITALIZZAZIONE E
COMPETITIVITÀ**

AVANZAMENTO FINANZIARIO AI 30-11-2024

Risorse Attivate:
358,28 Mln di Euro
60,83%

Impegni ammessi:
183,20 Mln di Euro
31,10 %

Pagamenti ammessi:
10,26 Mln di Euro
1,74 %

Impegni ammessi



Pagamenti ammessi



Priorità 1 - Ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività 2/2

AVANZAMENTO PROCEDURALE



Procedure aperte: 9

- **Azione 1.1.2:**
 - Bando Ricerca, Sviluppo e Innovazione per l'attrazione investimenti;
- **Azione 1.1.3:**
 - Bando per il sostegno all'innovazione digitale nei borghi - piccoli comuni delle aree interne;
 - Bando per il sostegno all'innovazione digitale nei Centri Commerciali Naturali;
 - Bando per il sostegno all'innovazione digitale delle cooperative di comunità;
- **Azione 1.1.5:**
 - Bando sostegno per la creazione ed il consolidamento di start-up innovative;
- **Azione 1.2.1.2:**
 - Avviso pubblico per lo sviluppo di progettualità sui dati, rivolto agli enti locali toscani;
- **Azione 1.3.2:**
 - Bando per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti fino a € 50.000,00;
 - Attivazione dello Strumento Finanziario - sezione Regione Toscana FG - Garanzie;
- **Azione 1.3.5:**
 - Bando opere cinematografiche e audiovisive (II ed.).



Procedure chiuse: 13

- **Azione 1.1.1:**
 - Avviso pubblico Laboratori aperti dell'istruzione tecnologica superiore rivolto alle Fondazioni ITS Academy della Toscana;
- **Azione 1.1.3:**
 - Bando Impresa Digitale;
- **Azione 1.1.4.1:**
 - Bando Progetti strategici di ricerca e sviluppo;
 - Bando Progetti di ricerca e sviluppo per le MPMI e Midcap;
- **Azione 1.1.6:**
 - Trasferimento tecnologico. Azioni di sistema;
- **Azione 1.2.1.1:**
 - Big e Open Data (3D-Data, Smart Region, TOR);
 - Servizi di sviluppo, manutenzione evolutiva e correttiva del sistema CART (Interoperabilità);
 - Progetto FRONT END;
- **Azione 1.2.2:**
 - Ecosistema digitale per la cultura;
- **Azione 1.3.1:**
 - Bando Internazionalizzazione 2023;
- **Azione 1.3.3:**
 - Servizi per attrazione investimenti;
- **Azione 1.3.4:**
 - Toscana Promozione Turistica;
- **Azione 1.3.5:**
 - Bando opere cinematografiche e audiovisive (I ed.).



**SUPERAMENTO DEL
TARGET
INTERMEDIO AL
2024 DELL'
INDICATORE DI
OUTPUT
ASSEGNATO**



Priorità 1 - Avanzamento Target fisici 1/2

Priorità del Programma	Azione/sub-Azione	Indicatore	Denominazione Indicatore	Unità di misura	Target al 31.12.2024	Avanzamento al 30.11.2024
1 - Ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività	1.1.1 - Laboratori aperti dell'istruzione tecnica superiore	RCO08	Valore nominale delle attrezzature di ricerca e innovazione	Euro	420.000	0
	1.1.2 - Ricerca, sviluppo e innovazione per l'attrazione investimenti	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: micro, piccole, medie e grandi imprese)	Numero imprese	10	0
	1.1.3 - Servizi per l'innovazione	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: micro, piccole, medie e grandi imprese)	Numero imprese	396	0
	1.1.4.1 - Ricerca e sviluppo per le imprese anche in raggruppamento con organismi di ricerca	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: micro, piccole, medie e grandi imprese)	Numero imprese	405	0
	1.1.4.1 - Ricerca e sviluppo per le imprese anche in raggruppamento con organismi di ricerca	RCO10	Imprese che collaborano con istituti di ricerca	Numero imprese	242	0
	1.1.4.2 - Aiuti agli investimenti strategici in ricerca e sviluppo per le imprese condotti in sinergia con interventi di carattere nazionale	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: micro, piccole, medie e grandi imprese)	Istituzioni pubbliche	6	0
	1.1.4.2 - Aiuti agli investimenti strategici in ricerca e sviluppo per le imprese condotti in sinergia con interventi di carattere nazionale	RCO10	Imprese che collaborano con istituti di ricerca	Numero imprese	1	0
	1.1.5 - Start-up innovative	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: micro, piccole, medie e grandi imprese)	Numero imprese	59	0
	1.1.6 - Riorganizzazione e strutturazione del sistema regionale di trasferimento tecnologico. Azioni di sistema	RCO10	Imprese che collaborano con istituti di ricerca	Numero imprese	77	0
	1.2.1.1 - Servizi digitali per la PA (Soggetto beneficiario: Regione Toscana)	RCO14	Istituzioni pubbliche supportate per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali	Istituzioni pubbliche	32	40
	1.2.1.2 - Servizi digitali per la PA (Soggetto beneficiario: Istituzioni Pubbliche)	RCO14	Istituzioni pubbliche supportate per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali	Istituzioni pubbliche	8	0
	1.2.2 - Ecosistema digitale per la cultura	RCO14	Istituzioni pubbliche supportate per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali	Istituzioni pubbliche	20	20
	1.3.1 - Sostegno alle PMI - export	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: micro, piccole, medie e grandi imprese)	Numero	506	4
	1.3.2 - Sostegno alle PMI - investimenti produttivi	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: micro, piccole, medie e grandi imprese)	Numero	2.764	29
	1.3.3 - Servizi per attrazione investimenti	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: micro, piccole, medie e grandi imprese)	Numero	200	330
	1.3.4 - Promozione turistica	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: micro, piccole, medie e grandi imprese)	Numero	319	397
	1.3.5 - Sostegno alle imprese culturali	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: micro, piccole, medie e grandi imprese)	Numero	8	0

Priorità 1 - Avanzamento Target fisici 2/2


Priorità del Programma	Obiettivo specifico	Indicatore	Denominazione Indicatore	Unità di misura	Target al 31.12.2024	Avanzamento al 30.11.2024
1 - Ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività	OS 1.1 - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: micro, piccole, medie e grandi imprese)	Numero imprese	629	0
		RCO08	Valore nominale delle attrezzature di ricerca e innovazione	Euro	420.000	0
		RCO10	Imprese che collaborano con istituti di ricerca	Istituzioni pubbliche	255	0
	OS 1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	RCO14	Istituzioni pubbliche supportate per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali	Istituzioni pubbliche	60	60
	OS 1.3 - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: micro, piccole, medie e grandi imprese)	Numero	3.429	760

Priorità 2 - Transizione ecologica, resilienza e biodiversità 1/2

PROGRAMMAZIONE

Dotazione Totale: 367,86 Mln di Euro

di cui Quota FESR: 147,14 Mln di Euro

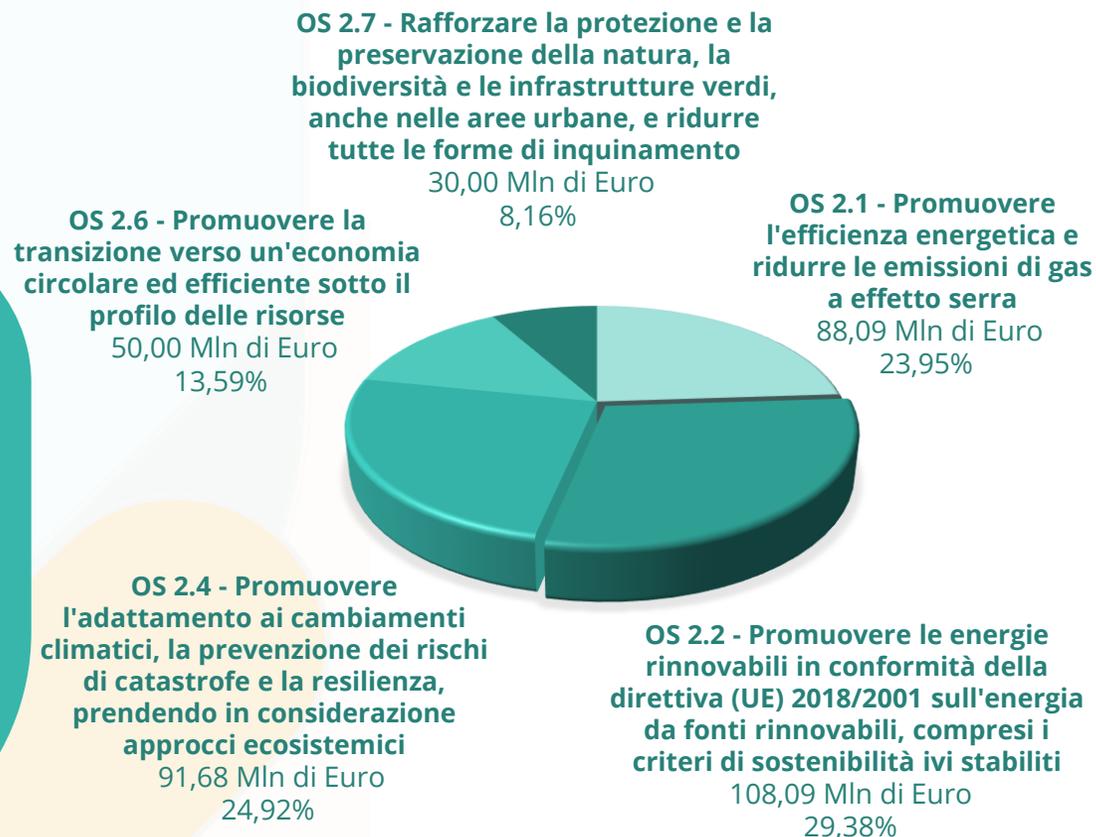

PRIORITÀ 2

TRANSIZIONE
ECOLOGICA,
RESILIENZE E
BIODIVERSITÀ



AVANZAMENTO FINANZIARIO Al 30-11-2024

Risorse Attivate:
248,66 Mln di Euro
67,60%

Impegni ammessi:
1,47 Mln di Euro
0,40 %

Pagamenti ammessi:
0,37 Mln di Euro
0,10 %



L'avanzamento registrato riguarda l'Obiettivo Specifico 2.4 - Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici

Priorità 2 - Transizione ecologica, resilienza e biodiversità 2/2

AVANZAMENTO PROCEDURALE



Procedure aperte: 4

- **Azione 2.1.2 e Azione 2.1.3:**
 - Progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese (RSA);
- **Azione 2.1.3:**
 - Progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi;
- **Azione 2.2.1 e Azione 2.2.2:**
 - Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici - Riserva AREE INTERNE;
- **Azione 2.2.2 e Azione 2.2.3:**
 - Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese (RSA);



Procedure chiuse: 10

- **Azione 2.1.1.1 e Azione 2.1.2:**
 - Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici (Edifici pubblici e RSA) - Riserva AREE INTERNE;
- **Azione 2.1.1.2:**
 - Efficientamento energetico degli edifici pubblici nelle Strategie territoriali urbane;
- **Azione 2.4.1.1:**
 - Bando prevenzione sismica negli edifici pubblici - Riserva AREE INTERNE;
- **Azione 2.4.1.3:**
 - Realizzazione Banche dati e Sistema Informativo Territoriale per la Sismica;
- **Azione 2.4.3.1:**
 - Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofi naturali;
- **Azione 2.4.3.2:**
 - Bando Interventi per il recupero, il riequilibrio e la tutela della fascia costiera;
- **Azione 2.4.3.3:**
 - Bando Interventi di infrastrutture verdi per l'adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione del rischio idraulico;
- **Azione 2.4.3.4:**
 - Interventi di protezione contro il rischio idrogeologico da frane - Riserva AREE INTERNE;
- **Azione 2.7.1.2:**
 - Infrastrutture verdi delle Strategie territoriali urbane;
- **Azione 2.7.2:**
 - Bando Natura e biodiversità - Riserva AREE INTERNE.

Priorità 2 - Avanzamento Target fisici

Priorità del Programma	Obiettivo specifico	Indicatore	Denominazione Indicatore	Unità di misura	Target al 31.12.2024	Avanzamento al 30.11.2024
2 - Transizione ecologica, resilienza e biodiversità	OS 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	RCO24	Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofi naturali	Euro	800.000	37.160
		RCO25	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate per fasce costiere, rive fluviali e lacustri contro le inondazioni	Km	2	0
		RCO26	Infrastrutture verdi costruite o ristrutturate per l'adattamento ai cambiamenti climatici	Ha	20	0
		RCO106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane	Ha	0,2	0
	OS 2.6 Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse	RCO34	Capacità aggiuntiva per il riciclaggio dei rifiuti	Tonnellate/anno	30.000	0

Priorità 3 - Mobilità urbana sostenibile

PROGRAMMAZIONE

 **Dotazione Totale:** 127,50 Mln di Euro

 **di cui Quota FESR:** 51,00 Mln di Euro

**Azione 2.8.2 -
Piste ciclabili**
11,00 Mln di Euro

**Azione 2.8.3 - Rinnovo
autobus e treni**
5,00 Mln di Euro

Azione 2.8.1 - Tramvia
111,50 Mln di Euro

PRIORITÀ 3



**MOBILITÀ
URBANA
SOSTENIBILE**

AVANZAMENTO PROCEDURALE



➤ **Azione 2.8.1 - Tramvia:**

- Decisione n. 40 del 20 novembre 2023 - Costi dell'intervento (111,5 mln a valere sul PR FESR 2021-2027 - Azione 2.8.1 e 113,00 mln a valere sul Programma FSC 2021-2027);
- DGR n. 629 del 27-05-2024 - Azioni ed interventi per l'estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana e il collegamento infrastrutturale metropolitano fra le città di Firenze e Prato;
- DGR n.1252 del 04-11-2024 - Approvazione degli Indirizzi per l'attuazione dell'intervento a valere sul PR FESR 2021-2027 e sull'Accordo per la Coesione FSC 2021-2027 e dell'Atto d'obbligo.

➤ **Azione 2.8.2 - Piste ciclabili:**

- Decisione n.34 del 25-11-2024 - Indirizzi per l'attuazione dell'azione 2.8.2 "Piste ciclabili" del Programma PR FESR 21-27, definizione delle priorità d'intervento in materia di mobilità ciclabile.


Priorità 4 - Coesione territoriale e sviluppo locale integrato

PROGRAMMAZIONE

Dotazione Totale: 101,47 Mln di Euro

di cui Quota FESR: 40,59 Mln di Euro

OS 5.1 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane
80,00 Mln di Euro



OS 5.2 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane
21,47 Mln di Euro

PRIORITÀ 4



**COESIONE TERRITORIALE
E SVILUPPO LOCALE
INTEGRATO**



O.S. 5.1

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane



Rigenerazione urbana e qualità dell'abitare



Cultura



Efficientamento energetico degli edifici pubblici



Infrastrutture verdi



O.S. 5.2

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane



Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale



Micro-infrastrutturazione per l'attrattività di attività produttive



Riqualificazione e rigenerazione dei sistemi insediativi



Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l'elaborazione di strategie territoriali


Priorità 4 - Aggiornamento Strategie Territoriali Urbane

AVANZAMENTO PROCEDURALE



O.S. 5.1

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane

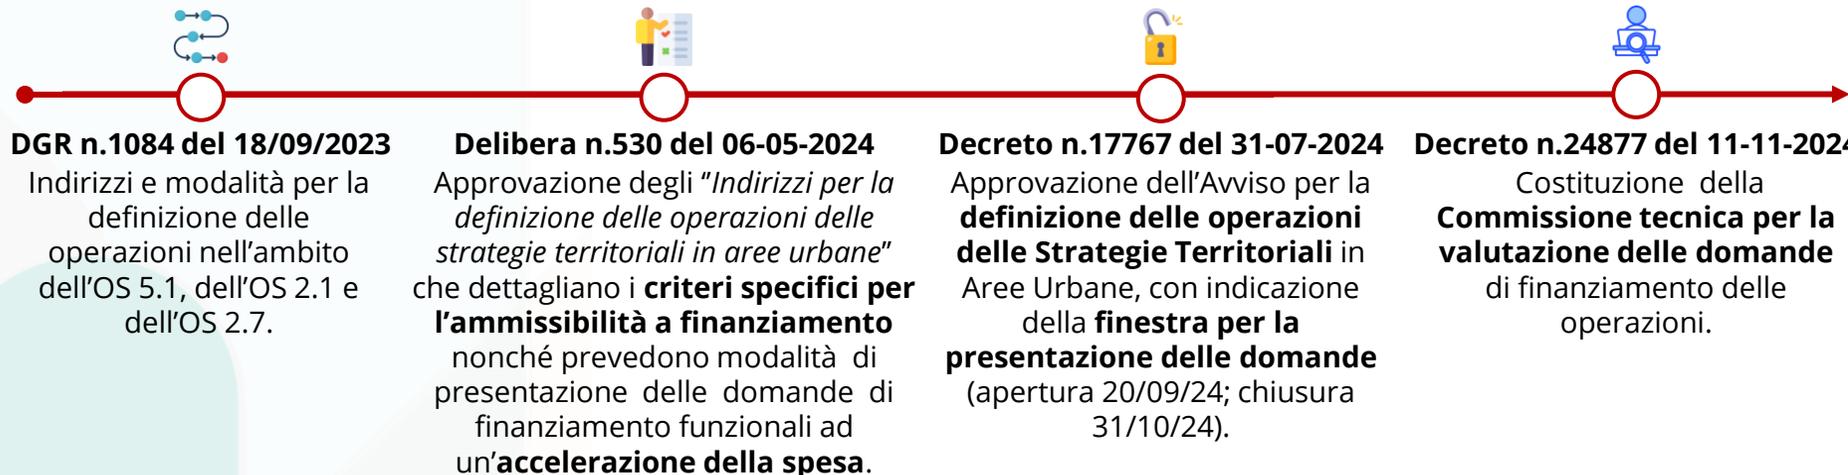

13 Strategie territoriali individuate nel programma (DGR n.422 del 11.04.2022 s.m.i.)



ESITI DELL'AVVISO



Entro il termine di presentazione delle domande hanno completato l'inserimento delle domande di finanziamento **9** su **13** Strategie Territoriali, di cui:

- **47 domande** a valere sull'Azione 5.1.1;
- **13 domande** a valere sulla Sub-Azione 2.1.1.2;
- **6 domande** a valere sulla Sub-Azione 2.7.1.2.

Non hanno provveduto all'inserimento delle domande **4 Strategie** che hanno confermato l'interesse a dare attuazione alle rispettive Strategie dando adeguata motivazione e fornendo un aggiornamento dei cronoprogramma.

Le RISORSE destinate alle Strategie Territoriali Urbane



TOTALE : 100,42 M€

- Azione 5.1.1 **80,00 M€** ;
- Sub-Azione 2.1.1.2 **15,72 M€**;
- Sub-Azione 2.7.1.2 **4,69 M€**.

Priorità 4 - Aggiornamento Strategie Territoriali Aree Interne 1/3

OVERVIEW STRATEGIE TERRITORIALI AREE INTERNE



O.S. 5.2

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane

PROGRAMMAZION E REGIONALE DI SVILUPPO E STRATEGIA PER LE AREE INTERNE



- il **Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025** approvato con Risoluzione del Consiglio regionale 239/2023 indica tra gli obiettivi strategici la **promozione della coesione territoriale e dei luoghi della Toscana diffusa**;
- nel **Progetto Regionale 27 "Interventi nella Toscana diffusa, nelle aree interne e nei territori montani"** si conferma il sostegno alle strategie territoriali locali nei territori delle Aree interne attraverso un approccio plurifondo e di governance multi-livello;
- la **proposta di legge "Valorizzazione della Toscana Diffusa"** ha l'obiettivo di creare il quadro normativo ed economico per rendere strutturali e organici tutti gli interventi in favore dei territori più periferici e fragili.
- il **PR FESR sostiene sei Aree strategiche territoriali**, attraverso la Priorità 4 e con il concorso di risorse da altre Azioni e Priorità del Programma, nonché del PR FSE+ e del CSR FEASR 23/27;
- attraverso **premierità e bandi dedicati a specifici territori** si punta a sostenere interventi **a favore di tutti i comuni classificati «interni»**.

Le sei Aree interne strategiche

(115 amministrazioni locali coinvolte)



Le RISORSE destinate alle Strategie

FESR	FSE+	FEASR
OP 1: 28,15 M€ OP 2: 55,05 M€ OP 5: 21,40 M€	OP 4: 6,60 M€	SRG 06 - Leader 7,20 M€
TOT: 104,60 M€	TOT: 6,60 M€	TOT: 7,20 M€

Priorità 4 - Aggiornamento Strategie Territoriali Aree Interne 2/3

AVANZAMENTO PROCEDURALE

DGR n. 199 del 28/02/2022

Strategia regionale per le aree interne nella programmazione 2021-2027. Indirizzi per le strategie territoriali locali.

DGR n. 1476 del 19/12/2022

Definizione degli elementi essenziali del percorso di elaborazione delle strategie territoriali

DD n. 3419 del 22/02/2023

Approvazione dell' Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione delle strategie preliminari.

DGR n. 94 del 12/02/2024

Presenza d'atto della valutazione delle strategie preliminari, riparto delle risorse e avvio della seconda fase di elaborazione definitiva.

3 dicembre 2024:

Termine presentazione delle domande di finanziamento relative agli interventi riguardanti infrastrutture

20 dicembre 2024:

Termine di presentazione delle proposte di intervento relative alle Azioni del PR FESR che sostengono investimenti per le imprese



DGR n. 1198 del 28/10/2024

Proroga dei tempi del procedimento delle strategie

DGR n. 932 del 05/08/2024

Elenchi di interventi infrastrutturali delle sei strategie territoriali individuati in esito alle attività negoziali

DGR n. 519 del 06/05/2024

Indirizzi operativi per le strategie territoriali definitive e per gli Investimenti Territoriali Integrati (I.T.I.)



16 gennaio 2025:

Termine di consegna all'AdG del documento di Strategia territoriale definitiva

3 marzo 2025:

Termine di emanazione del provvedimento di ammissibilità a finanziamento per singola operazione

31 marzo 2025:

Conclusione percorso di elaborazione delle Strategie territoriali definitive

NEXT

Sottoscrizione
I.T.I.

NEXT

Avvio
interventi



IL PERCORSO NEGOZIALE PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

- Febbraio 2024:**
Trasmissione ai Capofila d'Area degli indirizzi formulati dai RdA nell'ambito dei lavori della Commissione tecnica di valutazione delle Strategie Preliminari
- Definizione da parte delle Coalizioni di un Piano degli interventi ritenuti prioritari
- Maggio 2024:**
Incontri tra le Coalizioni ed il "GdL Fondi Europei" del Comitato di *governance* per il confronto tecnico per la verifica degli interventi proposti dalle Aree
- Richiesta integrazioni e schede di dettaglio
- Agosto 2024:**
Approvazione degli elenchi individuati in esito alle attività negoziali (DGR 932/2024)



REGIMI DI AIUTO

La selezione delle operazioni avviene **tramite bandi/avvisi** dedicati oppure ordinari con riserva di risorse (Az.1.1.3 «specifici territori»)

Priorità 4 - Aggiornamento Strategie Territoriali Aree Interne 3/3

INTEGRAZIONE CON ALTRI FONDI

Nel percorso di elaborazione delle strategie territoriali sono state intraprese, in raccordo con l'AdG FSE e con l'AdGR FEASR le attività per la definizione di progetti integrati e complementari con gli interventi FESR.

FSE+

Il PR FSE+ concorre alle strategie destinando **6,6 Mln di Euro** (1,1 M€ per ciascuna Area) da utilizzare per progetti afferenti a:

- **Priorità 2 - Istruzione e formazione** (OS 4.6):
- **Priorità 3 - Inclusione sociale** (OS 4.11)

Dalla prima ricognizione dei fabbisogni è emerso un maggiore interesse sull'Obiettivo Specifico 4.11 con un totale di richieste per un valore di **5,61 Mln di Euro**.

FEASR

Nell'ambito del **Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-27** è stata individuata per le strategie delle aree interne **una riserva di fondi specifica la cui gestione è affidata ai GAL**, per favorite forme e strumenti di attuazione maggiormente sinergiche e coerenti con le strategie di sviluppo rurale Leader nei medesimi territori.

Le risorse sono pari complessivamente a **7,2 Mln di Euro** (1 M€ per ciascuna delle sei Aree e 1,2 M€ complessivi per i 7 GAL incaricati della gestione e delle attività di animazione).

I GAL devono elaborare un **Piano di sviluppo rurale d'area (PSRA)** per ciascuna delle sei aree, basandosi sugli indirizzi delle coalizioni delle aree interne e con il contributo degli *stakeholders* locali.

Opzioni di Semplificazione dei Costi attuate nel Programma

Al 30 novembre 2024 si riscontra l'attuazione delle **Opzioni di Costo Semplificato (OSC)**, ai sensi dell' Art.53 par. 1 lett. b), c), d) del Reg.2021/1060, la cui metodologia di calcolo è stata definita attraverso apposite Deliberazioni di Giunta Regionale.

Atto amministrativo di riferimento	Oggetto Atto	Azioni/Sub-azioni interessate	Tipologia OSC
Delibera n.1327 del 20-11-2023	Approvazione delle metodologie per l'applicazione delle Opzioni Semplificate dei Costi ex art. 53, co. 1 RDC	Azione 1.2.1 Servizi digitali per la PA	Somme forfettarie
		Azione 2.4.1 Prevenzione sismica negli edifici pubblici	Costi unitari
Delibera n.1427 del 02-12-2024	Integrazione alla metodologia per l'applicazione delle Opzioni Semplificate dei Costi ex art. 53, co. 1 RDC	Sub Azione 2.4.1.1 Contributi per interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici	Costi unitari
Delibera n.1463 del 11-12-2023	Approvazione delle metodologie per l'applicazione delle Opzioni Semplificate dei Costi ex art. 53, co. 1 RDC	Azione 1.1.2 Ricerca, sviluppo e innovazione per l'attrazione investimenti	Costi unitari
		Azione 1.1.4 Ricerca e sviluppo per le imprese anche in raggruppamento con organismi di ricerca	Costi unitari
Delibera n.293 del 18-03-2024	Approvazione delle metodologie per l'applicazione delle Opzioni Semplificate dei Costi ex art. 53, co. 1 RDC	Azione 2.2.1 Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici	Costi unitari
		Azione 2.2.2 Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA	Costi unitari
Delibera n.596 del 20-05-2024	Modifiche alla metodologia per l'applicazione delle Opzioni Semplificate dei Costi ex art. 53, co. 1 RDC	Azione 2.2.1 Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici	Costi unitari
		Azione 2.2.2 Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA	Costi unitari
Delibera n.1155 del 21-10-2024	Approvazione della metodologia per l'applicazione delle Opzioni Semplificate dei Costi ex art. 53, co. 1 RDC	Azione 2.1.2 Efficientamento energetico nelle RSA	Costi unitari
		Azione 2.1.3 Efficientamento energetico delle imprese	Costi unitari
Delibera n.1156 del 21-10-2024	Approvazione della metodologia per l'applicazione delle Opzioni Semplificate dei Costi ex art. 53, co. 1 RDC	Azione 1.1.3 Servizi per l'innovazione	Somme forfettarie Tassi forfettari

I principali fattori che incidono sull'attuazione del Programma e le misure adottate per massimizzare la performance 1/2

Principali punti di criticità



- **Effetto "spiazzamento"** determinato dalla presenza di iniziative analoghe al PR nell'ambito di altri Programmi di spesa (fra i quali il PNRR) e da misure di incentivazione nazionali sul tema dell'energia che ha determinato:
 - una ridotta propensione ad investire sul FESR da parte dei potenziali beneficiari con particolare riguardo alla sfera delle imprese;
 - un eccessivo carico amministrativo in capo alle strutture tecniche degli enti pubblici che ha indotto i Responsabili di Azione, anche su impulso dei potenziali beneficiari, alla concessione di proroghe sui termini di presentazione delle istanze nell'ambito degli Avvisi di selezione delle operazioni;
- Adozione, nell'ambito del PR, delle **procedure connesse all'applicazione delle Opzioni di Semplificazione dei Costi** ed alla **definizione delle procedure riguardanti alle verifiche ambientali**, con particolare riguardo al DNSH ed all'immunizzazione dagli effetti del clima per infrastrutture, che hanno determinato ritardi nella definizione dei dispositivi di attuazione;
- Recente **introduzione del Codice dei Contratti pubblici** con le incertezze interpretative che ordinariamente caratterizzano il regime transitorio;
- **Disposizioni regolamentari sulle modalità di individuazione delle strategie territoriali**, esplicitate con l'art. 29 (per gli aspetti connessi al processo definizione) e con l'art. 30 (relativamente all'esigenza di stipulare un ITI) del RDC che, data la loro complessità hanno determinato, all'atto dell'applicazione, una tempistica notevolmente estesa nel percorso di ammissione a finanziamento delle strategie.

Misure correttive introdotte



- **Attivazione di un monitoraggio rafforzato** sulle procedure in essere da parte dell'AdG nei confronti delle strutture regionali Responsabili di Azione mirato ad individuare le criticità che si frappongono all'attuazione delle procedure ed a scandire la tempistica di svolgimento degli adempimenti finalizzati all'ammissione a finanziamento delle operazioni;
- **Adozione di una deliberazione di Giunta regionale (n. 687 del 17.06.2024) che introduce e regola l'utilizzo dell'overbooking** quale strumento volto a massimizzare le capacità di spesa delle singole Priorità;
- **Adozione della deliberazione di Giunta regionale n. 1432 del 02/12/2024 sull'accelerazione della spesa;**
- Istituzione di una specifica **struttura regionale di accompagnamento alla sostenibilità ambientale degli interventi** con l'obiettivo di supportare l'AdG e le strutture regionali nella corretta applicazione delle disposizioni per il rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale (stabilizzazione della struttura individuata in via transitoria).

I principali fattori che incidono sull'attuazione del Programma e le misure adottate per massimizzare la performance 2/2

Misure correttive introdotte - Focus sulle misure di accelerazione della spesa approvate con DGR 1432 del 02/12/2024

Nell'ambito della **deliberazione di Giunta regionale del 02/12/2024 sull'accelerazione della spesa**, è stabilita:

- l'introduzione di **misure volte a ridurre i tempi delle diverse fasi dei procedimenti di selezione e di attuazione delle operazioni**, prevedendo tempi certi, pena la decadenza dal beneficio;
- l'**adozione**, laddove percorribile, di **procedure di appalto integrato** per operazioni afferenti ai lavori;
- l'**introduzione**, per la totalità delle tipologie di intervento, di **step di rendicontazioni intermedi** in grado di massimizzare le capacità di spesa per le procedure di riferimento;
- la **rendicontazione e la certificazione delle spese relative a uno specifico fondo regionale investimenti MPMI** da costituire destinato al sostegno alle imprese, nonché la **progettazione definitiva della linea tramviaria 2.2 "Aeroporto - Sesto Fiorentino"**;
- l'**estensione del ricorso all'istituto dell'overbooking** ai fini del raggiungimento del target finanziario N+3 al 31.12.2025;
- l'**introduzione dei target di spesa quali indicatori rilevanti del PQPO** per tutti i Settori responsabili dell'attuazione del PR FESR 2021-2027;
- l'**adesione alla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)** che determinerà una riprogrammazione del PR da proporre in sede di riesame intermedio.



Aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo – Si.Ge.Co.

Il **Sistema di Gestione e Controllo** (Si.ge.Co) è stato approvato con **Delibera di Giunta regionale del 2 dicembre 2024**. Si riportano di seguito, le novità introdotte:

- ✓ modifiche derivanti dalla necessità di adeguarsi ai rilievi della Commissione Europea in sede di audit:
 - introduzione **verifiche a campione**, tramite Arachne, sulle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse;
 - **utilizzo di Arachne** ai fini del controllo della dimensione d'impresa;
- ✓ Aggiornamento sull'identificazione degli **Organismi Intermedi** (introduzione ARTEA e MIMIT)
- ✓ Aggiornamento della sezione relativa al **sistema informativo SFT**
- ✓ Specificazioni sulle modalità di adozione delle **Opzioni Semplificate dei Costi**
- ✓ Aggiornamento delle **strutture regionali afferenti alle Autorità del Programma**;
- ✓ Specificazioni sui **ruoli fra RdA e Beneficiario** nel caso di operazioni a titolarità regionale;
- ✓ modifiche ai metodi e strumenti per i controlli di I livello.



Attualmente in fase di definizione il **documento metodologico di valutazione del rischio per le verifiche di gestione**.

Il Piano di Monitoraggio Ambientale 1/2



Con **Delibera n.1283 del 11-11-2024** è stato approvato il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) del Programma Regionale Toscana (PR) FESR 2021-2027, che riepiloga e sistematizza il **quadro informativo complessivo relativo agli aspetti ambientali**.



Quali sono i presupposti e gli elementi normativi di riferimento?



- **Normativa europea** (artt. 9 e 10 della Direttiva 42/2001), **nazionale** (art. 18 del D.lgs. 152/2006) e **regionale** (art. 29 della L.R. 10/2010), che dispongono che, quando viene adottato un piano o un programma, si debba dare conto delle misure prese in merito al monitoraggio degli effetti ambientali significativi;
- **Rapporto ambientale**, che prevede la costruzione di un sistema di monitoraggio con la definizione della periodicità, dei contenuti da monitorare e l'individuazione degli indicatori;
- **Osservazioni presenti nel Parere motivato di VAS del NURV**, in merito alla necessità e modalità di elaborazione di un Piano di Monitoraggio Ambientale.



Quali sono le finalità?



- il PMA delinea la **procedura complessiva funzionale al monitoraggio e verifica dei profili ambientali** del Programma, delle azioni e dei singoli interventi dettagliando gli step procedurali, i soggetti coinvolti e le relative funzioni, gli strumenti previsti e la tempistica di riferimento.

Le procedure di monitoraggio ambientale integrano e **si incardinano nei processi di monitoraggio ordinario** del PR, utilizzando i meccanismi di controllo esistenti ed evitando una duplicazione del monitoraggio.



Quali sono gli aspetti ambientali oggetto del Piano di monitoraggio?



- **Settori di intervento** e relativo contributo ai **coefficienti ambientali**;
- **Indicatori ambientali**;
- Principio **DNSH**;
- Verifica climatica o **climate proofing**.

Il Piano di Monitoraggio Ambientale 2/2

Il Piano definisce le attività di verifica e monitoraggio degli aspetti ambientali e specifica nel dettaglio i **soggetti** coinvolti, le relative funzioni, gli **strumenti** previsti e la **tempistica** di riferimento.

Strumento

Attore/i

Cadenza temporale



Rapporto di monitoraggio



Autorità di Gestione
(con supporto del Valutatore)



Struttura
regionale di
accompagnamento
alla
sostenibilità
ambientale
degli
interventi
(a supporto in
tutte le
attività)

1. Redazione del primo Rapporto di monitoraggio ambientale prevista per il 2026, con dati riferiti al 31 dicembre 2025;
2. Redazione del Rapporto di monitoraggio finale prevista per il 2030, con dati riferiti al 31 dicembre 2029.



Check list di autovalutazione



Responsabile di Azione

Utilizzata durante tutta la durata del Programma, per la verifica dei dispositivi di attuazione in fase di elaborazione e pubblicazione.



Attività di alimentazione del sistema di monitoraggio




Beneficiario

Attività continuativa



Attività di verifica bimestrale dei dati di monitoraggio riferiti agli aspetti ambientali




AdG e RdA

Attività continuative bimestrali



Monitoraggio annuale interventi e report annuale



AdG e RdA

Attività annuale

Parte b. Operazioni di Importanza Strategica



Attuazione operazioni pianificate di Importanza Strategica

Tra le funzioni del **Comitato di Sorveglianza**, ai sensi dell'art. 40 par. 1 lett. g) del RDC, è previsto l'esame dei progressi compiuti nell'attuare **operazioni di importanza strategica (OIS)** che, per il PR FESR sono state identificate nelle seguenti.

PRIORITÀ 1



OS 1.1 - Rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate



Interventi per l'attrazione di nuovi progetti di investimento in Ricerca e Innovazione

ATTUAZIONE AZIONE

Approvati gli indirizzi per l'attivazione del Bando «RSI per attrazione investimenti» con **Delibera GR n.1454 del 11.12.2023**.

Publicato il **Bando a sportello** con **Decreto Dirigenziale n.17200 del 24.07.2024**, il quale prevede finestre temporali di valutazione e relative graduatorie.

La prima finestra di presentazione è bimestrale (successivamente quadrimestrale), con pubblicazione della graduatoria entro gennaio 2025.

Attualmente si rilevano sulla piattaforma circa **25 proposte progettuali**, di cui alcune già formalizzate.

PRIORITÀ 2



OS 2.2 - Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2021 compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti



Sostegno delle comunità energetiche

ATTUAZIONE AZIONE

Il Bando è in fase di predisposizione.

Si prevede la **pubblicazione entro gennaio 2025**.

PRIORITÀ 3



OS 2.8 - Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, come parte della transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio



Intervento di estensione della rete tramviaria della città di Firenze Aeroporto - Sesto Fiorentino

ATTUAZIONE AZIONE

I costi dell'intervento definiti con **Decisione n. 40 del 20 novembre 2023** (111,5 mln a valere sul PR FESR 2021-2027 - Azione 2.8.1 e 113,00 mln a valere sul Programma FSC 2021-2027).

Con **Delibera GR n. 629 del 27.05.2024** sono state definite le azioni ed interventi per l'estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana e il collegamento infrastrutturale metropolitano fra le città di Firenze e Prato.

Con **Delibera GR n.1252 del 04.11.2024** sono stati approvati gli Indirizzi per l'attuazione dell'intervento.

Parte c. Tempistiche e modalità del riesame intermedio



Il riesame intermedio: le modalità e le tempistiche

Art. 18
Reg. (UE)
2021/1060

Elementi
da tenere in
considerazione

Importo di
flessibilità

Esiti

Entro il **31 marzo 2025**, lo Stato membro presenta alla CE una valutazione relativa ai risultati del **riesame intermedio**, compresa una proposta riguardante l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità e se necessario una proposta di modifica del Programma.




Raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;



Piano nazionale integrato per l'energia e il clima;



Pilastro europeo dei diritti sociali;



Situazione socioeconomica dello Stato membro interessato;



Risultati delle valutazioni pertinenti;



Conseguimento dei target intermedi.



L'**importo di flessibilità** è pari al **50% della dotazione FESR** per le annualità 2026-2027, ovvero **€ 73.734.429,00**.

Se lo Stato Membro conferma l'importo di flessibilità, **senza modifica del Programma**:

- lo Stato Membro **presenta i risultati del riesame intermedio** alla CE;
- la CE conferma e **adotta una decisione entro 3 mesi** oppure chiede di presentare un **Programma modificato**.

Se lo Stato Membro decide di **modificare il Programma**:

- lo Stato Membro **presenta i risultati del riesame intermedio e il Programma modificato** (in particolare riallocazione dell'importo di flessibilità e target finali);
- la CE adotta una **decisione che approva il Programma** (entro 4 mesi) o formula osservazioni.

Comitato di Sorveglianza PR FESR 2021-2027

6 dicembre 2024

 www.regione.toscana.it/pr-fesr-2021-2027

 fesrtoscana

 @FESRToscana

 PRFESRToscana

 autoritagestionecreo@regione.toscana.it

Autorità di Gestione del PR FESR
